

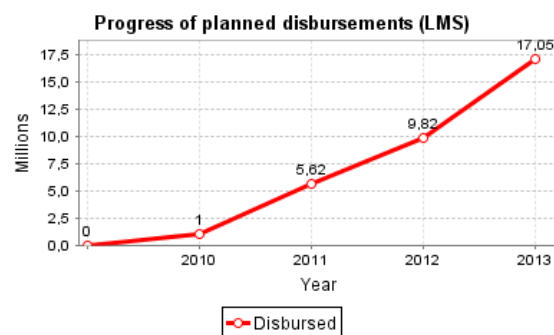



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION				
Loan Number(s):	2252/BL-BO	Current Approved Amount:	19.942.539,06	Original IDB:	20.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	16.052.173,96	Current IDB:	19.942.539,06
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	80,49	Pari-passu:	95,00
Related Operation(s):	BO-P1012, BO-T1114, RG-P1374	Balance:	3.890.365,10	Co-Financing/Country:	1.000.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	21.000.000,00
				Amortization Period (months):	282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 23-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-sep-2013

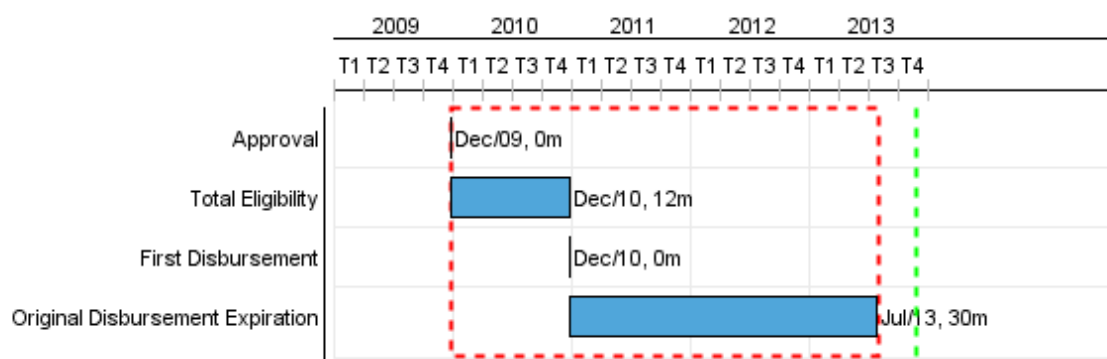

Accumulated Progress as of 2013

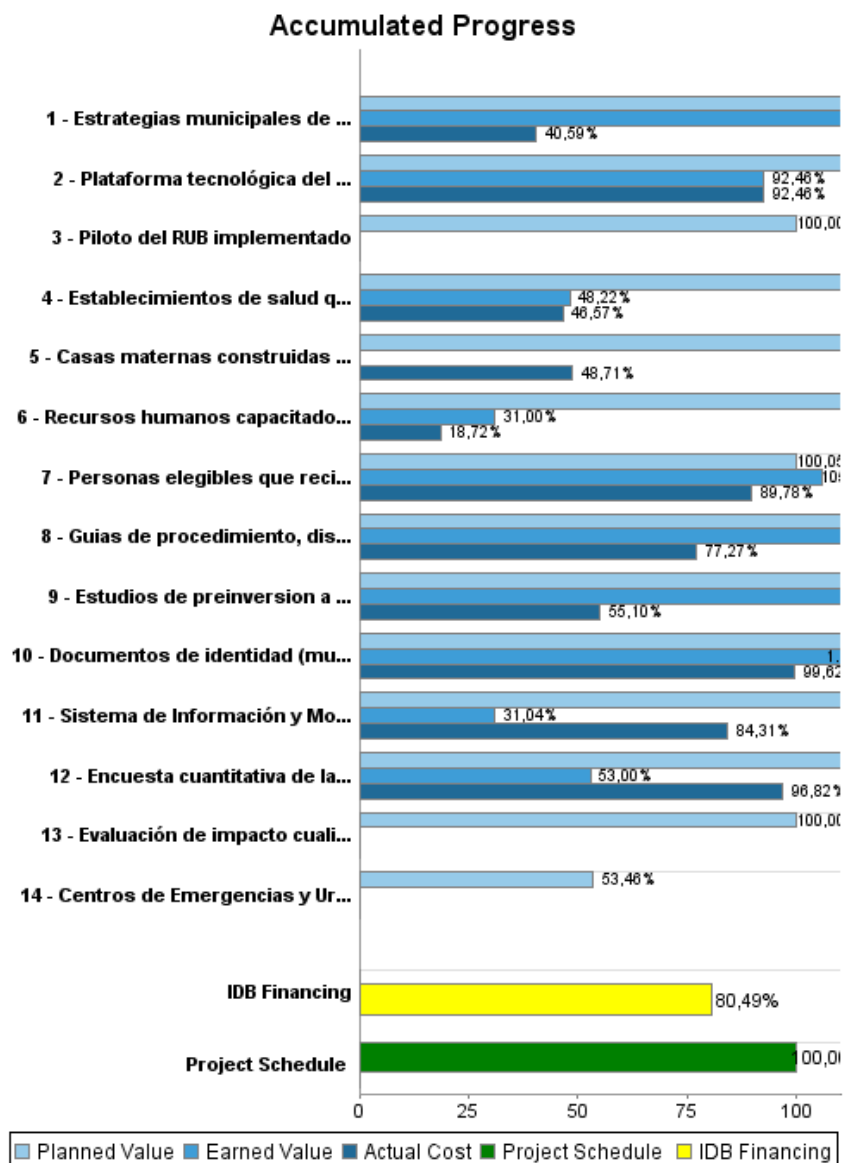

Outcomes

Outcome:	Utilizacion de servicios de salud materno-infantil aumentada en los municipios priorizados
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Partos atendidos por personal calificado entre mujeres beneficiarias del Bono en los municipios priorizados	Porcentaje	43,00	2010	P A	43,00	45,00 51,00	47,00 68,00	54,00	54,00
Niños con desnutrición aguda, moderada y/o severa entre los 3 y 23 meses de edad beneficiarios del Bono en los municipios priorizados.	Porcentaje	2,80	2009	P A	2,80	2,30 1,94	1,80 1,97	1,20	1,20
Niños con esquema vacunal completo a los 12 meses en los municipios priorizados	Porcentaje	84,00	2009	P A	84,00	86,00 85,00	88,00 77,00	90,00	90,00

Outcome:	Cobertura, calidad y pertinencia cultural de servicios de salud materno-infantil aumentada en los municipios priorizados
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados.	Personas	3.434,00	2010	P A	3.434,00	3.584,00 4.000,00	4.319,00 4.433,00	4.963,00	4.963,00
Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos proyectados en los municipios priorizados.	Porcentaje	43,00	2010	P A	43,00	45,00 47,00	47,00 52,00	54,00	54,00

Outcome:	Estructura social municipal en salud fortalecida en los municipios priorizados en cuanto a su capacidad de planificacion, administracion y seguimiento
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Municipios priorizados con Estrategia Municipal de Salud elaborada con participacion de Consejos Sociales Municipales.	Municipios		2010	P A		7,00 7,00	10,00 17,00	13,00	30,00

Outcome:	Gestión del Plan de Erradicacion de la Extrema Pobreza (PEEP) fortalecida en cuanto a su capacidad gerencial y coordinador
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Piloto del Registro Unico de Beneficiarios (RUB) intersectorial implementado	Piloto RUB		2010	P A				1,00	1,00
Programas del PEEP (Plan Vida) para los cuales el sistema de monitoreo esté levantando información cada 6 meses.	Programas		2010	P A					1,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Transferencias Monetarias en Nutrición y Salud Materno-Infantil									
Documentos de identidad (mujeres) o partida de nacimiento (ninos) entregados a beneficiarios elegibles en municipios priorizados	Personas	864,00	2.525,00		2.200,00	38.147,00	6.704,00		79.910,49
Personas elegibles que reciben transferencias segun establecido en el nuevo Manual en los municipios priorizados.	Personas		9.418,00		52.000,00	1.009.894,00	545.015,00		3.968.019,00
Administracion (fortalecimiento institucional)	N/A					262.579,00	119.781,00		1.082.427,29
Componente 2: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Integrales de Salud									
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterizacion de Ministerio de Salud y Deportes	Establecimientos	22,00	9,00		22,00	9.240.340,00	3.650.489,00		7.838.648,14
Casas maternas construidas y equipadas segun normativa	Casas	12,00			12,00	568.478,00	287.566,00		590.312,00
Centros de Emergencias y Urgencias fortalecidos segun norma en las Redes priorizadas	Centros	10,00			10,00	555.000,00			1.838.662,00
Recursos humanos capacitados para implementar la política de salud vigente	Personas	423,00			650,00	1.437.081,00	253.500,00		1.690.000,00
Fortalecimiento institucional de las Unidades Técnicas y costos administrativos	N/A					20.208,00	5.476,00		76.232,60
Administracion (Fortalecimiento Institucional - Contraparte)	N/A					68.917,00	12.813,00		105.000,00
Costos Administrativos FPS	N/A					523.398,00	154.739,00		639.902,00
Estudios de preinversion a disenio final de establecimientos de salud y casas maternas finalizados	Estudios	20,00	40,00		283,00	574.518,00	149.135,00		1.161.561,00
Componente 3: Desarrollo de Organizaciones Sociales y Comunitarias									
Guias de procedimiento, disenos y estudios para la adecuación intercultural y/o medicina tradicional en la atención elaborados y publicados.	Documentos	1,00	2,00		2,00	70.000,00	30.625,07		92.451,93
Estrategias municipales de salud elaboradas participativamente y aprobadas por Consejo Social Municipal de Salud	Documentos	6,00	18,00		30,00	241.383,00	23.079,00		383.533,52
Administracion (fortalecimiento institucional)	N/A					36.690,00	33.152,00		82.268,67

PROGRESS MONITORING REPORT

BO-L1032 - Multiphase Program in Support of the Plan to Eradicate Extreme Poverty (PEEP)-I
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 23/09/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 4: Fortalecimiento Institucional y Evaluación									
Sistema de Información y Monitoreo del PEEP-Plan Vida implementado	Sistema	1,00			1,00	85.421,00	65.833,00		123.578,19
Plataforma tecnológica del RUB diseñada.	Diseño RUB				1,00	127.177,00	110.336,00		223.453,79
Piloto del RUB implementado	Sistema	1,00			1,00	48.700,00			48.700,00
Encuesta cuantitativa de la evaluación de impacto del bono Juana Azuduy levantada.	Evaluación				1,00	24.378,00	16.199,00		222.560,80
Evaluación de impacto cualitativa y cuantitativa realizada	Evaluación	1,00			1,00	110.000,00			110.000,00
Administración (fortalecimiento institucional)	N/A					348.646,00	22.564,00		442.517,56
Auditoría									
Auditoría	N/A					123.907,00	45.889,00		142.800,06
TOTAL						15.514.862,00	5.532.895,07		20.942.539,04
