



Operation Number: **BO-L1032**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**  
Last Update: **6/20/2014**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**  
Division Chief validation date: **06/25/2014**  
Country Representative validation date: **06/25/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Multiphase Program in Support of the Plan to Eradicate Extreme Poverty (PEEP)-I	Loan Number:	2252/BL-BO,2252/BL-BO-1,2252/BL-BO-2,2252/BL-BO-3,2252/BL-BO-4
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROL LO,MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA,MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROL LO,MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROL LO		
Team Leader:	Johannsen,Julia	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BOLIVIA
Borrower:	REPUBLICA DE BOLIVIA		
		Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BO-L1032	\$20,000,000.00	\$19,942,539.06	\$1,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BO-L1032	\$19,942,539.06	\$19,942,539.06	100.00%	\$0.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

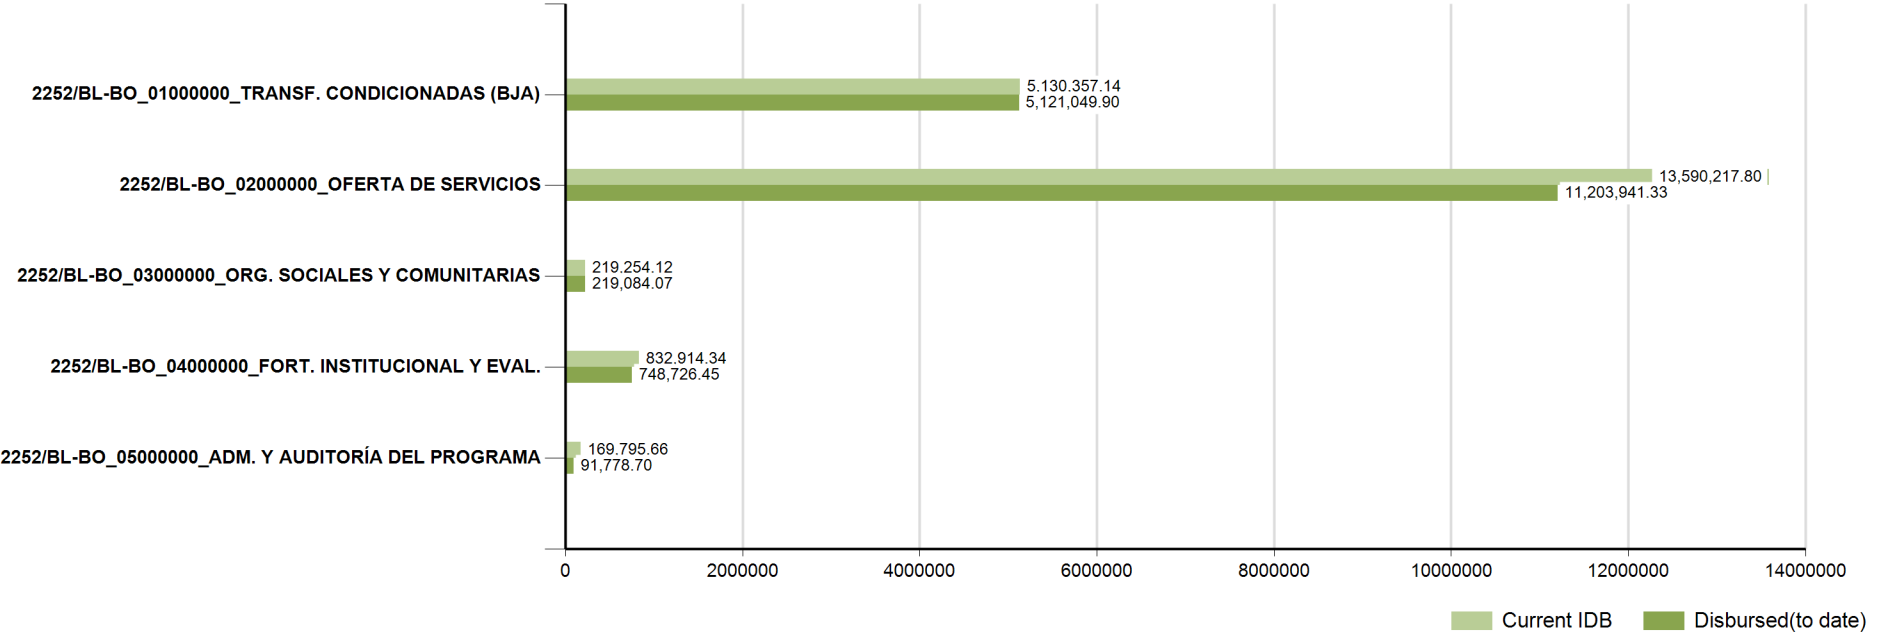

## Results Matrix

### Impacts

<b>Impact:</b>	1 Contribuir a mejorar las condiciones de salud, alimentarias y nutricionales de la población en extrema pobreza, principalmente madres y niños menores de 2 años del ámbito rural e indígena, a través de incentivos tanto a nivel de la demanda y oferta.
<b>Observation:</b>	La explicacion detallada del cambio de datos segun interpretacion del indicador y fuente de verificacion se encuentra en un acta firmada entre BID y ejecutor bajo idbdocs# 38827697.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	EOP
1.1 Prevalencia de desnutrición crónica (estimada a partir de la talla para la edad) para los niños/as indígenas de 3 a 23 meses de edad reducida en los municipios con alta vulnerabilidad alimentaria y pobreza.		porcentaje de niños	34.20	2008	Linea de base de la encuesta materno-infantil a ser levantada hasta fines de 2011, con datos disponibles al inicio de 2012.	Se revisara los datos de la linea de base y, por consecuente, las metas para el final del proyecto una vez contando con los datos primarios de la encuesta materno-infantil. Mientras tanto, los datos aqui reportados se basan en los promedios rurales de la	P P(a) A	28.00 25.00 23.20
1.2 Prevalencia de diarrea en niños indígenas de 6 a 23 meses de edad reducida en los municipios priorizados con alta pobreza.		porcentaje de niños	40.50	2008	Linea de base de la encuesta materno-infantil a ser levantada hasta fines de 2011, con datos disponibles al inicio de 2012.	Se revisara los datos de la linea de base y, por consecuente, las metas para el final del proyecto una vez contando con los datos primarios de la encuesta materno-infantil. Mientras tanto, los datos aqui reportados se basan en los promedios rurales de la	P P(a) A	35.00 33.00 31.10
1.3 Promedio de incidencia de pobreza extrema rural de indígenas reducida en los municipios con alta vulnerabilidad alimentaria y pobreza.		porcentaje de personas	51.50	2008	Encuesta Nacional de Hogares.	Los datos son representativos del área rural y para poblaciones indígenas, no para tipos especificos de municipios.	P P(a) A	45.00 43.00 40.50


 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

### Outcomes

Outcome:	1 Utilizacion de servicios de salud materno-infantil aumentada en los municipios priorizados
Observation:	Los datos ingresados como metas planificadas y alcanzadas para los tres indicadores no corresponden a la informacion correcta, dado que a traves de los años hubo un cambio de interpretacion del indicador y/o del ambito geografico relevante para el reporte y una actualizacion de datos con encuestas nacionales nuevas. Dado que el sistema no permite correcciones retrospectivas, los datos correctos se encuentran en un acta firmada entre BID y ejecutor bajo idbdocs# 38827697.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
							2010	2011	2012	2013	EOP	
1.1 Partos atendidos por personal calificado entre mujeres beneficiarias del Bono en los municipios priorizados		Porcentaje	60.00	2010	Linea de base de la encuesta materno-infantil a ser levantada hasta fines de 2011, con datos disponibles al inicio de 2012.	Se revisara los datos de la linea de base y, por consecuente, las metas para el final del proyecto una vez contando con los datos primarios de la encuesta materno-infantil. Mientras tanto, los datos aqui reportados se basan en las proyecciones del Sistema	P	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
	P(a)						60.00	65.00	70.00	75.00	75.00	
	A						59.80	65.30	75.90	77.30	77.30	
1.2 Niños con desnutrición aguda, moderada y/o severa entre los 3 y 23 meses de edad beneficiarios del Bono en los municipios priorizados.		Porcentaje	2.10	2010	Sistema de informacion del Bono Juana Azurduy.		P	2.10	1.80	1.50	1.00	1.00
	P(a)						2.10	1.80	1.50	1.00	1.00	
	A						2.10	1.90	0.90	0.90	0.90	
1.3 Niños con esquema vacunal completo a los 12 meses en los municipios priorizados		Porcentaje	64.00	2010	Registros del Sistema Nacional de Informacion en Salud (SNIS)		P	64.00	67.00	70.00	74.00	74.00
	P(a)						64.00	67.00	70.00	74.00	74.00	
	A						64.00	70.00	66.00	62.00	62.00	

Outcome:	2 Cobertura, calidad y pertinencia cultural de servicios de salud materno-infantil aumentada en los municipios priorizados
----------	--

Observation:	Los datos ingresados como metas planificadas y alcanzadas para los dos indicadores no corresponden a la informacion correcta, dado que a traves de los años hubo un cambio de interpretacion del indicador y/o del ambito geografico relevante para el reporte y una actualizacion de datos con encuestas nacionales nuevas. Dado que el sistema no permite correcciones retrospectivas, los datos correctos se encuentran en un acta firmada entre BID y ejecutor bajo idbdocs# 38827697.												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	EOP	
2.1 Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados.		 RF	Personas	1,995.00	2010	Registros del Sistema Nacional de informacion en Salud (SNIS).	Los datos aqui reportados se basan en los promedios segun el Sistema de Informacion Nacional de Salud (SNIS) de los municipios priorizados en Oruro y Potosi.	P	1,995.00	2,000.00	2,005.00	2,010.00	2,010.00
								P(a)	1,995.00	2,000.00	2,005.00	2,010.00	2,010.00
		A						1,995.00	1,765.00	1,662.00	1,634.00	1,634.00	
2.2 Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos proyectados en los municipios priorizados.			Porcentaje	54.60	2010	Registros del Sistema Nacional de informacion en Salud (SNIS).	Los datos aqui reportados se basan en los promedios rurales segun el Sistema de Informacion Nacional de Salud (SNIS) para los municipios priorizados en Potosi y Oruro.	P	55.00	56.00	58.00	60.00	60.00
								P(a)	55.00	56.00	58.00	60.00	60.00
		A						54.60	47.90	44.80	44.70	44.70	
Outcome:	3 Estructura social municipal en salud fortalecida en los municipios priorizados en cuanto a su capacidad de planificacion, administracion y seguimiento												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	EOP	
3.1 Municipios priorizados con Estrategia Municipal de Salud elaborada con participacion de Consejos Sociales Municipales.		Municipios	0.00	2010	* Estrategias Municipales de Salud * Informes de Mesas Municipales de Salud * Actas de pocesion de Consejos Sociales Municipales de Salud		P	0.00	7.00	10.00	13.00	30.00
							P(a)	0.00	7.00	10.00	13.00	30.00
	A							7.00	17.00	18.00	42.00	

Outcome:

4 Gestión del Plan de Erradicacion de la Extrema Pobreza (PEEP) fortalecida en cuanto a su capacidad gerencial y coordinador

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
4.1 Piloto del Registro Unico de Beneficiarios (RUB) intersectorial implementado		Piloto RUB	0.00	2010	Informes de avance Ministerio de Planificacio n del Desarrollo		P	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	A				1.00	1.00						
4.2 Programas del PEEP (Plan Vida) para los cuales el sistema de monitoreo esté levantando información cada 6 meses.		Programas	0.00	2010	Informes de avance del Ministerio de Planificacio n del Desarrollo.		P					1.00
							P(a)					
	A				1.00	1.00						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Transferencias Monetarias en Nutrición y Salud Materno-Infantil		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Documentos de identidad (mujeres) o partida de nacimiento (ninos) entregados a beneficiarios elegibles en municipios priorizados	Personas	P	864.00	2,200.00	P	38,147.00	111,047.00
		P(a)	864.00	3,861.00	P(a)	38,147.00	79,910.00
		A	2,525.00	3,861.00	A	7,010.00	79,910.00
Personas elegibles que reciben transferencias segun establecido en el nuevo Manual en los municipios priorizados.	Personas	P	0.00	59,840.00	P	1,009,894.00	4,027,224.00
		P(a)	0.00	69,258.00	P(a)	1,009,894.00	3,859,587.00
		A	9,418.00	69,258.00	A	842,257.00	3,859,587.00
Componente 2: Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Integrales de Salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterizacion de Ministerio de Salud y Deportes	Establecimientos	P	22.00	22.00	P	9,240,340.00	9,240,340.00
		P(a)	22.00	29.00	P(a)	9,240,340.00	8,224,861.00
		A	29.00	29.00	A	8,224,861.00	8,224,861.00
Casas maternas construidas y equipadas segun normativa	Casas	P	12.00	12.00	P	568,478.00	568,478.00
		P(a)	12.00	12.00	P(a)	568,478.00	593,055.00
		A	12.00	12.00	A	593,055.00	593,055.00
Centros de Emergencias y Urgencias fortalecidos segun norma en las Redes priorizadas	Centros	P	10.00	10.00	P	555,000.00	555,000.00
		P(a)	10.00	10.00	P(a)	555,000.00	1,356,714.00
		A	10.00	10.00	A	1,356,714.00	1,356,714.00
Recursos humanos capacitados para implementar la politica de salud vigente	Personas	P	423.00	650.00	P	1,437,081.00	1,500,000.00
		P(a)	423.00	1,745.00	P(a)	1,437,081.00	1,752,919.00
		A	1,518.00	1,745.00	A	1,690,000.00	1,752,919.00
Estudios de preinversion a diseno final de establecimientos de salud y casas maternas finalizados	Estudios	P	20.00	283.00	P	574,518.00	1,065,365.00
		P(a)	20.00	328.00	P(a)	574,518.00	1,050,054.00
		A	65.00	328.00	A	559,207.00	1,050,054.00
Componente 3: Desarrollo de Organizaciones Sociales y Comunitarias		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Guías de procedimiento, disenos y estudios para la adecuación intercultural y/o medicina tradicional en la atención elaborados y publicados.	Documentos	P	1.00	2.00	P	70,000.00	110,816.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	70,000.00	92,452.00
		A	2.00	3.00	A	51,636.00	92,452.00
Estrategias municipales de salud elaboradas participativamente y aprobadas por Consejo Social Municipal de Salud	Documentos	P	6.00	30.00	P	241,383.00	373,992.00
		P(a)	6.00	42.00	P(a)	241,383.00	274,290.00
		A	18.00	42.00	A	141,681.00	274,290.00
Componente 4: Fortalecimiento Institucional y Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Sistema de Información y Monitoreo del PEEP-Plan Vida implementado	Sistema	P	1.00	1.00	P	85,421.00	123,780.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	85,421.00	125,071.00
		A	1.00	1.00	A	86,712.00	125,071.00
Plataforma tecnológica del RUB diseñada.	Diseño RUB	P		1.00	P	127,177.00	223,454.00
		P(a)		1.00	P(a)	127,177.00	96,277.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	96,277.00
Encuesta cuantitativa de la evaluacion de impacto del bono Juana Azuduy levantada.	Evaluación	P	0.00	1.00	P	24,378.00	223,671.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	24,378.00	398,586.00
		A	0.00	1.00	A	199,293.00	398,586.00

Piloto del RUB implementado	Sistema	P	1.00	1.00	P	48,700.00	48,700.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	48,700.00	175,877.00
		A	1.00	1.00	A	175,877.00	175,877.00
Evaluación de impacto cualitativa y cuantitativa realizada	Evaluación	P	1.00	1.00	P	110,000.00	110,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	110,000.00	133,769.00
		A	1.00	1.00	A	133,769.00	133,769.00
Auditoria							

Other Cost		2013	Cost
Administracion (Fortalecimiento Institucional MSD, Comp I)	<b>P</b>	\$262,579.00	\$1,183,004.00
	<b>P(a)</b>	\$262,579.00	\$1,191,164.00
	<b>A</b>	\$270,739.00	\$1,191,164.00
Administracion (Fortalecimiento Institucional FPS, Comp II)	<b>P</b>		
	<b>P(a)</b>		\$68,973.00
	<b>A</b>	\$68,973.00	\$68,973.00
Costos Administrativos (FPS, Comp II)	<b>P</b>	\$523,398.00	\$639,902.00
	<b>P(a)</b>	\$523,398.00	\$559,331.00
	<b>A</b>	\$442,827.00	\$559,331.00
Administracion (Fortalecimiento Institucional MSD, Comp II)	<b>P</b>	\$20,208.00	\$79,692.00
	<b>P(a)</b>	\$20,208.00	\$75,879.00
	<b>A</b>	\$16,395.00	\$75,879.00
Administracion (Fortalecimiento Institucional MSD, Comp II - Contraparte)	<b>P</b>	\$68,917.00	\$105,000.00
	<b>P(a)</b>	\$68,917.00	\$76,714.00
	<b>A</b>	\$40,631.00	\$76,714.00
Administracion (Fortalecimiento Institucional MSD, Comp III)	<b>P</b>	\$36,690.00	\$80,102.00
	<b>P(a)</b>	\$36,690.00	\$82,099.00
	<b>A</b>	\$38,687.00	\$82,099.00
Administracion (Fortalecimiento Institucional UDAPE, Comp IV)	<b>P</b>	\$348,646.00	\$440,794.99
	<b>P(a)</b>	\$348,646.00	\$182,662.00
	<b>A</b>	\$90,513.01	\$182,662.00
Auditoria	<b>P</b>	\$123,907.00	\$169,796.00
	<b>P(a)</b>	\$123,907.00	\$139,775.00
	<b>A</b>	\$93,886.00	\$139,775.00
Total Cost		2013	Total Cost
	<b>P</b>	\$15,514,862.00	\$20,980,157.99
	<b>P(a)</b>	\$15,514,862.00	\$20,980,157.99
	<b>A</b>	\$15,124,723.01	\$20,590,019.00

## Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
