



Operation Number: **EC-L1059**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/9/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/23/2014**
Country Representative validation date: **06/30/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for a Coastal Artisanal Fishing Project	Loan Number:	2113/OC-EC,2114/BL-EC
Executing Agency (EA):	BANCO DEL ESTADO ,BANCO DEL ESTADO		
Team Leader:	Hintze,Luis Hernando	Sector/Subsector:	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR ,REPUBLICA DE ECUADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1059	\$50,000,000.00	\$13,627,650.48	\$23,000,000.00	\$0.00	\$73,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1059	\$13,627,650.48	\$13,627,650.48	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	


Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

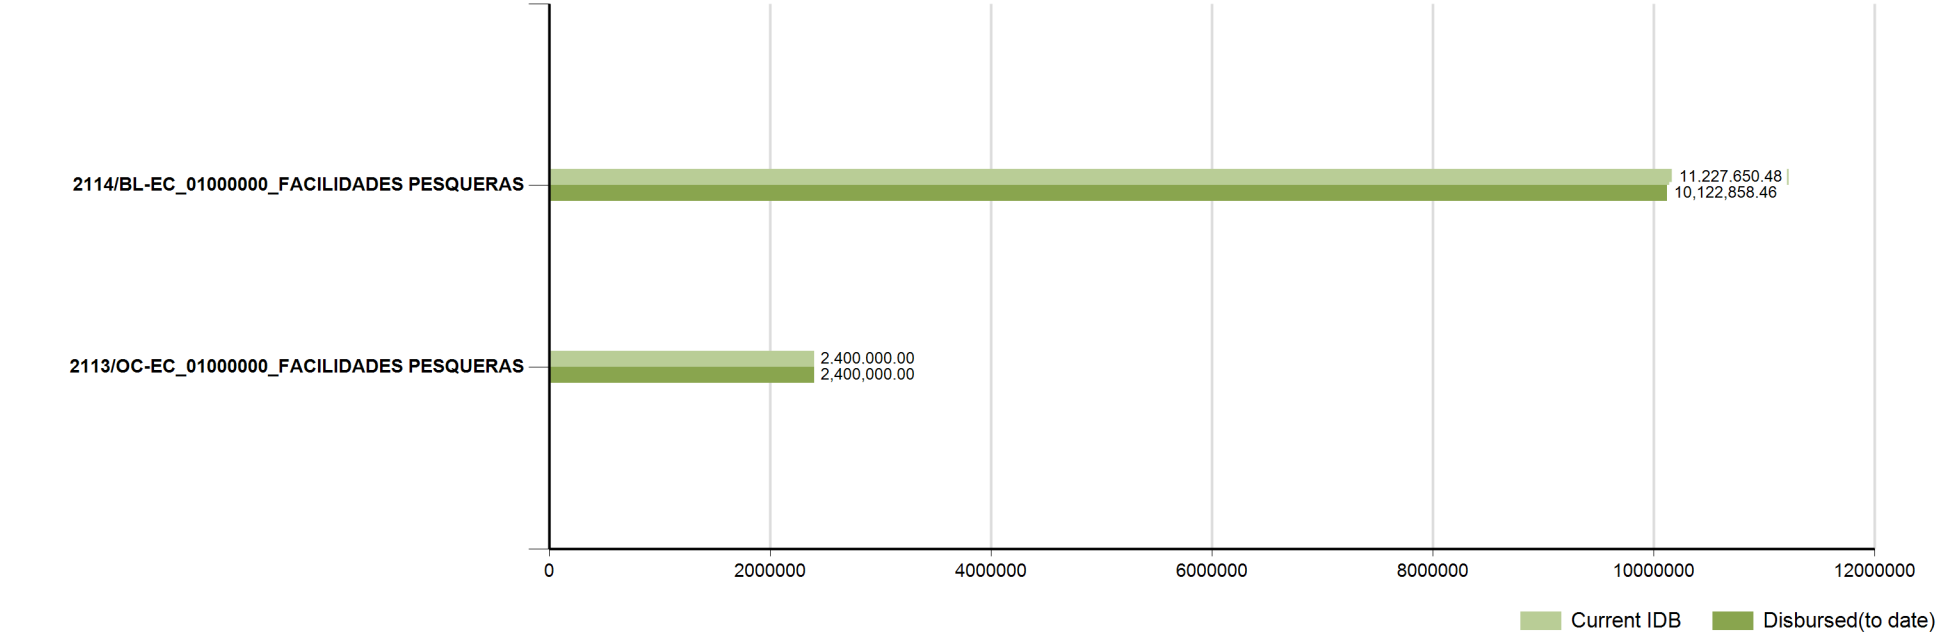

Expense Categories by Operation (cumulative values)

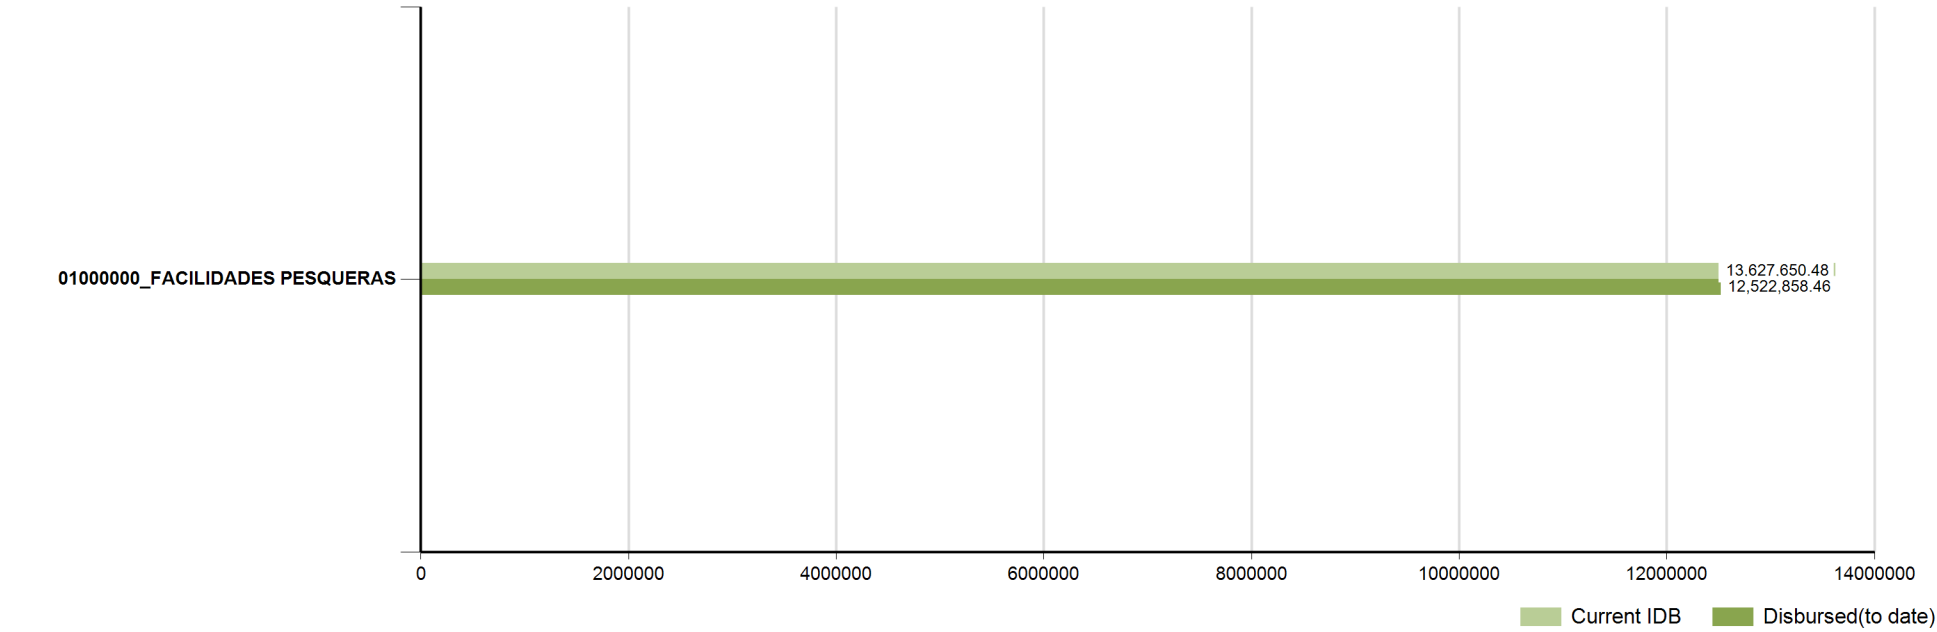

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Nivel de desarrollo económico de las comunidades pesqueras de la costa continental del Ecuador mejorado							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Ingresos promedios anuales en los núcleos familiares de pescadores de la costa continental del Ecuador incrementado		%	0.00	2009	Resultados del Censo Pesquero Nacional		P	
							P(a)	0.00
							A	

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Competitividad de la pesca artesanal de la costa continental del Ecuador (provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro), mejorada.									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
1.1 Volumen de capturas de la pesca artesanal del país que es desembarcada, procesada/envasada y puesta en camiones de transporte hacia los centros de consumo en condiciones sanitarias compatibles con normas internacionales sanitarias.			Ton	0.00	2009	Registros de cada facilidad pesquera y registros consolidados de la SRP.		P	10,000.00	0.00
								P(a)	10,000.00	0.00
								A	0.00	
1.2 Pescadores artesanales que adquieren insumos y servicios en las facilidades pesqueras con condiciones de seguridad "aceptables".			Pescadores	0.00	2009	Registros de cada facilidad pesquera y registros consolidados de la SRP.		P	8,000.00	0.00
								P(a)	8,000.00	0.00
								A	0.00	
Outcome:	2 Sostenibilidad de la pesca artesanal de la costa continental del Ecuador (provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro), mejorada.									
Observation:										

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
							P		
2.1 Facilidades construidas por el Proyecto que cubren sus costos de operación y mantenimiento con base en las tarifas pagadas por pescadores, comerciantes y proveedores de servicios que los utilizan.		Facilidades Pesqueras	0.00	2009	Registros de cada facilidad pesquera y registros consolidados de la SRP.		P	15.00	15.00
							P(a)	15.00	15.00
							A	0.00	
2.2 Área de la costa manejado bajo principios de sostenibilidad a través de esquemas de co-manejo o manejo especial para la protección del recurso pesquero.		Ha	75,000.00	2009	Registros de la Subsecretaría de Gestión Marino Costera del Ministerio del Ambiente y de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca		P	1,000,000.00	1,000,000.00
							P(a)	1,000,000.00	1,000,000.00
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1. Mejoramiento de los Facilidades Pesqueras Artesanales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Facilidades Pesqueras Artesanales Construidas	Facilidades	P	4.00	15.00	P	6,196,159.31	65,972,983.07
		P(a)		4.00	P(a)		20,428,552.24
		A	0.00	4.00	A		20,428,552.24
Modelos de gestión implementado en las Facilidades Pesqueras Artesanales	Modelos	P	4.00	14.00	P	0.00	137,908.00
		P(a)	15.00	0.00	P(a)	137,908.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Componente 2. Sistemas de Manejo de la Pesca Artesanal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Ordenamiento de la Pesca Artesanal: Esquema de zonificación de la actividad pesquera para toda la costa ecuatoriana cumplida.	Esquema de Zonificación	P	0.00	1.00	P		1,033,777.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	682,981.00	349,777.00
		A	0.00	0.00	A		349,777.00
Ordenamiento de la pesca artesanal: Planes Piloto de Co-manejo desarrollados e implementados	Planes	P	2.00	6.00	P	0.00	163,400.00
		P(a)	7.00	0.00	P(a)	0.00	314,321.15
		A	0.00	0.00	A		314,321.15
Monitoreo y control: Sistema de monitoreo de pesquerías artesanales diseñado e implementado	Sistema	P	0.00	1.00	P		856,892.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	179,461.00	677,166.05
		A	1.00	1.00	A		677,166.05
Investigación aplicada: Plan de investigación en Pesca Artesanal Costera aprobado por SRP	Plan	P	0.00	1.00	P		262,866.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	44,052.00	219,175.50
		A	1.00	1.00	A		219,175.50
Desarrollo microempresarial: Microempresarios reciben asistencia técnica para la diversificación de las actividades productivas a través del proyecto	Microempresarios	P		70.00	P		1,610,300.00
		P(a)	0.00	110.00	P(a)	59,486.00	1,550,650.87
		A		110.00	A		1,550,650.87
Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones: Caletas que cuentan con monitoreo sistemático de la captura de tiburones	Caletas	P	0.00	12.00	P		681,878.00
		P(a)	1.00	11.00	P(a)	76,860.00	604,244.98
		A		11.00	A		604,244.98
Administración del Programa							
Seguimiento, Evaluación y Auditorías							

Other Cost		2013	Cost
Administración del Programa	P	\$171,357.00	\$2,134,996.00
	P(a)	\$263,357.00	\$1,871,671.55
	A		\$1,871,671.55
Seguimiento, Evaluación y Auditorías	P	\$64,000.00	\$145,000.00
	P(a)	\$117,000.00	\$27,800.00
	A		\$27,800.00
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$6,431,516.31	\$73,000,000.07
	P(a)	\$1,561,105.00	\$27,604,464.34
	A		\$26,043,359.34

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
