



Operation Number: **AR-L1008**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/5/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/04/2014**
Division Chief validation date: **07/07/2014**
Country Representative validation date: **07/08/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Institutional Strengthening Program for the National Senate	Loan Number:	1603/OC-AR
Executing Agency (EA):	Honorable Senado de la Nación - Presiden cia		
Team Leader:	Reyes,Javier Ramiro	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1008	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1008	\$4,800,000.00	\$4,769,356.96	99.36%	\$30,643.04


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

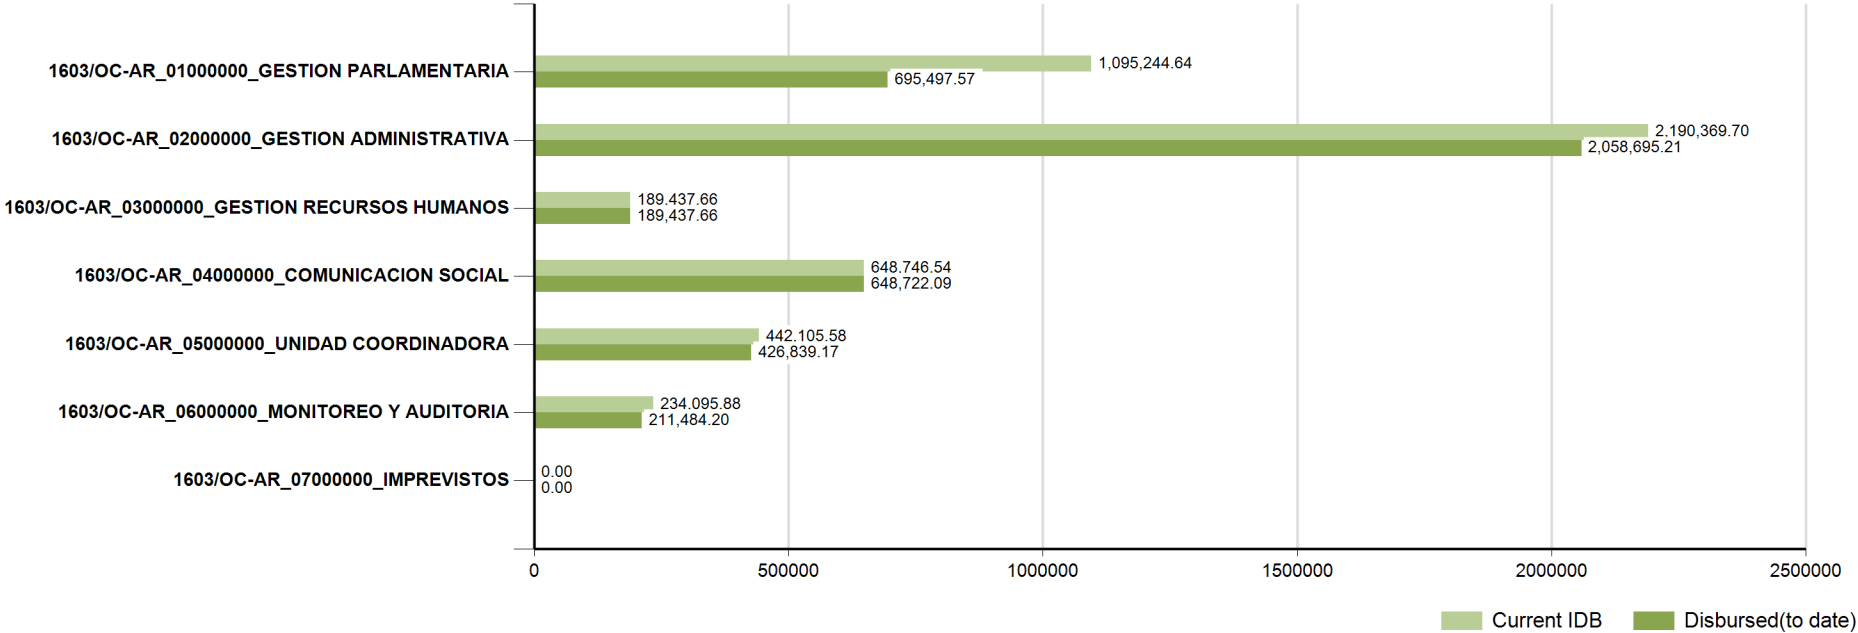

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 El HSN mejora su credibilidad como institución fundamental del Estado							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Mejora en el nivel de percepción favorable del HSN por parte de la población		porcentaje	13.00	2004	Encuestas de Latinobarometro		P	31.00
							P(a)	31.00
							A	40.70

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Honorable Senado de la Nación fortalecido con su función legislativa mejorada												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2007		2008	2010	2011	EOP
1.1 proyectos legislativos con acceso público al registro actualizado de trámites		proyectos disponibles en la WEB y disponibles en la OAC	0.00	2005	portal HSN			P	100.00				100.00
	P(a)							100.00				100.00	
			A	100.00					100.00				
1.2 servicios de apoyo técnico y especializado a la labor parlamentaria realizada en las Comisiones conformado por un cuerpo de asesores permanentes integrado por 10 especialistas.		Especialistas	0.00	2005	Documentación del proceso de selección y contratación del Cuerpo de Asesores por parte del HSN			P			5.00		5.00
	P(a)							0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	
			A				5.00	0.00					
Outcome:	2 Honorable Senado de la Nación fortalecido con su gestion administrativa-financiera mejorada												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2007		2008	2010	2011	EOP
2.1 Certificación de calidad ISO-9001		Unidades	0.00	2005	Certificación de calidad por parte del IRAM			P					8.00
	P(a)										8.00	8.00	
			A	2.00	2.00	4.00	8.00	50.00					
Outcome:	3 Comunicación del HSN con la ciudadanía mejorada												
Observation:													

Outco	3 Comunicación del HSN con la ciudadanía mejorada
--------------	---

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2007		2008	2010		2011	EOP
3.1 municipios conectados con Senado TV		municipios	300.00	2004	Verificación del acceso al canal por parte de los municipios		P		400.00				500.00
	P(a)							400.00		100.00	500.00		
	A		400.00				100.00	500.00					
3.2 grado de satisfaccion de los usuarios de los servicios de información de la Oficina de Atención al Ciudadano		%	0.00	2004	Encuestas de satisfacción de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)		P		75.00				90.00
	P(a)							75.00			90.00		
	A		75.00					0.00					

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Comunicación social y gestión del cambio		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Nuevo portal HSN operando	portal	P		1.00	P		26,580.00
		P(a)		1.00	P(a)		47,120.00
		A		1.00	A		47,120.00
Sistema de voto electronico para el recinto	sistema	P		1.00	P		5,405.40
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	1,253,000.00	1,237,229.40
		A	1.00	1.00	A	1,231,824.00	1,237,229.40
Canal Senado TV operando con señal pública y con producción de contenidos	canal	P		1.00	P		179,339.49
		P(a)		1.00	P(a)		497,959.49
		A		1.00	A		497,959.49
Oficina de atención al ciudadano operando en HSN y coordinada con HCDN	oficina	P		1.00	P		302,334.00
		P(a)		1.00	P(a)	19,000.00	135,700.00
		A		1.00	A	560.00	135,700.00
Unidades de gestion con procesos de calidad certificados	unidades certificadas	P		8.00	P		49,140.00
		P(a)		50.00	P(a)		173,580.00
		A	38.00	50.00	A		173,580.00
Gestión administrativa y financiera del Senado		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Sistema Integrado de Gestion Administrativa y Financiera Parlamentaria (SIGAFP) implementado	sistema	P		0.00	P		1,015,031.12
		P(a)		1.00	P(a)	204,000.00	458,065.12
		A		1.00	A		458,065.12
Sistema de Seguimiento de Expedientes (COMDOC) implementado	sistema	P		1.00	P		207,012.42
		P(a)		1.00	P(a)		54,812.42
		A		1.00	A		54,812.42
Digesto elaborado y disponible en internet	digesto	P		0.00	P		129,016.95
		P(a)		1.00	P(a)		60,521.95
		A		1.00	A		60,521.95
Direccion General de Auditoria fortalecida	dirección	P		0.00	P		147,830.66
		P(a)		1.00	P(a)		65,668.66
		A		1.00	A		65,668.66
Estructura informatica modernizada (hardware, comunicación y software)	equipos	P		476.00	P		895,949.00
		P(a)	121.00	640.00	P(a)	581,000.00	2,137,355.00
		A	121.00	640.00	A	407,000.00	2,137,355.00
Sistema de gestión edilicia mejorado	sistema	P		0.00	P		768,131.02
		P(a)		1.00	P(a)		215,520.02
		A		1.00	A		215,520.02
Gestión Parlamentaria y proceso de formación de la ley		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Propuestas nuevas estructuras (Secretaria Parlamentaria y Comisiones permanentes) y manuales elaborados e implementadas	propuestas	P		0.00	P		840,845.60
		P(a)		1.00	P(a)	38,000.00	364,529.60
		A		1.00	A	20,450.00	364,529.60
Capacitacion recursos humanos	personas capacitadas	P		0.00	P		540,132.89
		P(a)		1.00	P(a)		164,182.89
		A		1.00	A		164,182.89
Sistema de seguimiento tramite legislativo mejorado	sistema	P		1.00	P		78,451.00
		P(a)		1.00	P(a)		78,451.00
		A		1.00	A		78,451.00

Cuerpo Permanente de Asesores constituido	asesores	P		5.00	P		579,601.88
		P(a)		0.00	P(a)		5,601.88
		A		0.00	A		5,601.88
Servicios de asesorías técnicas especializadas	opiniones especializadas	P		5.00	P		372,857.32
		P(a)		0.00	P(a)		10,082.32
		A		0.00	A		10,082.32
Gestión, formación y optimización de recursos humanos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Sistema de administración de recursos humanos (SARHA) implementado	sistema	P		0.00	P		861,194.95
		P(a)		1.00	P(a)		210,764.95
		A		1.00	A		210,764.95
Gastos de Administración							

Other Cost			2013	Cost
Gastos de Administración y Otros		P		\$1,487,750.00
		P(a)	\$150,000.00	\$1,370,821.00
		A	\$90,921.00	\$1,370,821.00
Total Cost			2013	Total Cost
		P		\$8,486,603.70
		P(a)	\$2,245,000.00	\$7,782,210.70
		A	\$1,750,755.00	\$7,287,965.70

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
