



Operation Number: **UR-L1030**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/20/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/22/2014**
Division Chief validation date: **11/04/2014**
Country Representative validation date: **11/06/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Technology Development Program II	Loan Number:	2004/OC-UR
Executing Agency (EA):	Agencia Nacional de Investigación e Innovación		
Team Leader:	Angelelli,Pablo Javier	Sector/Subsector:	R&D AND INNOVATION FUNDING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	URUGUAY
Borrower:	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
UR-L1030	\$34,000,000.00	\$34,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
UR-L1030	\$34,000,000.00	\$27,539,366.20	81.00%	\$6,460,633.80


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

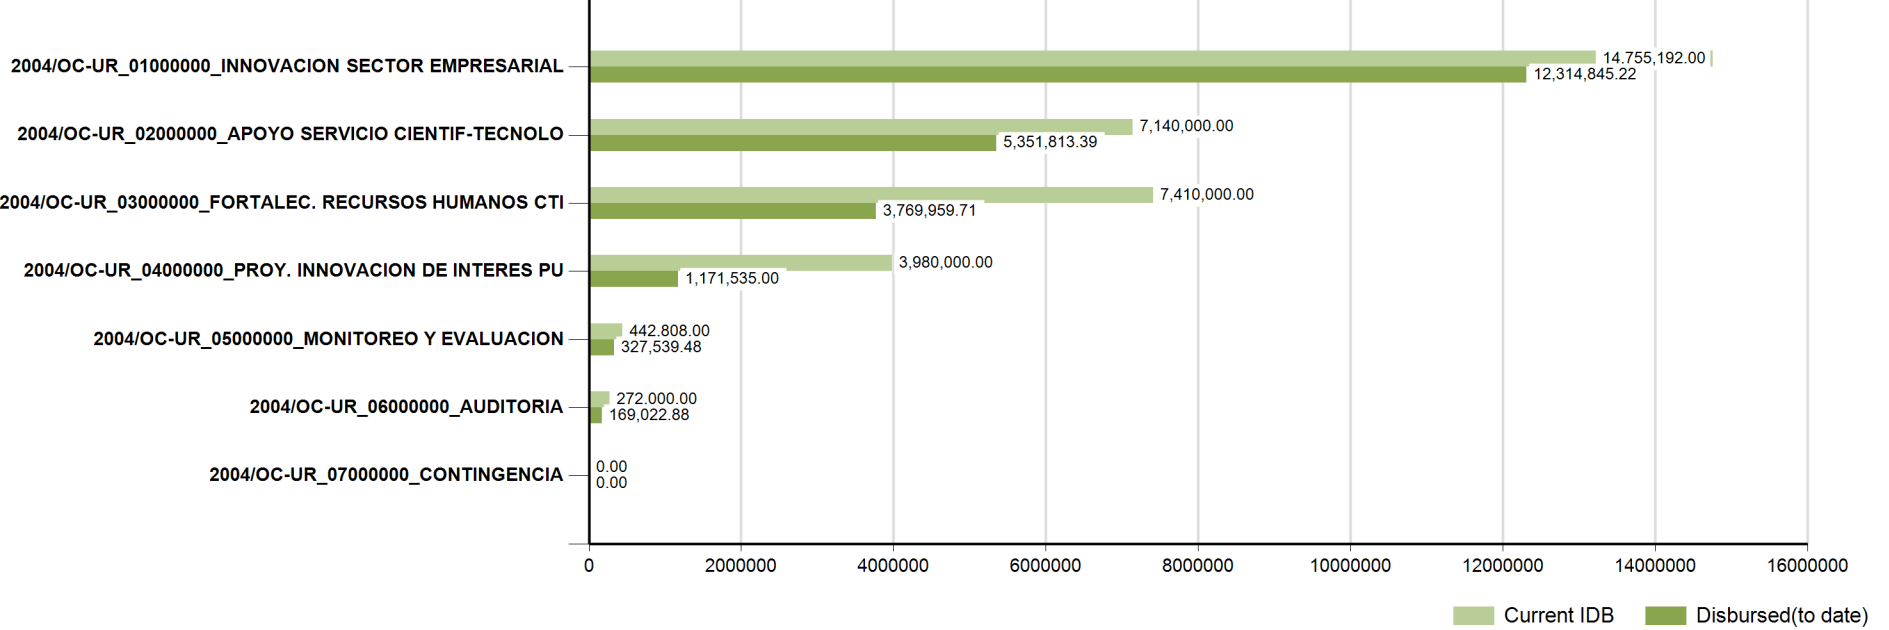

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Sistema Nacional de Innovación fortalecido.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Inversión en I+D con respecto al PBI.		Porcentaje	0.64	2008	ANII		P	1.00
							P(a)	1.00
							A	
1.2 Empresas que realizan actividades de innovación .		Porcentaje	28.00	2006	Encuesta Nacional de Innovación (Sector Manufacturas)	Con respecto al total de empresas uruguayas según encuesta nacional de innovación.	P	40.00
							P(a)	40.00
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 La tasa de éxito en los esfuerzos de innovación realizados por las empresas beneficiarias se ve incrementada.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
1.1 Proyectos exitosos respecto al total de proyectos ejecutados.		Porcentaje	45.00	2008	Base de datos de informe de cierre de proyectos, ANII.		P		50.00
							P(a)	50.00	50.00
							A	84.00	
Outcome:	2 El éxito en los procesos de formación de investigadores y científicos se ve incrementado.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
2.1 Becarios graduados que lograron publicaciones en revistas internacionales indexadas.		Porcentaje	40.00	2008	Base de datos de currículums del Uruguay, ANII.		P		60.00
							P(a)	50.00	60.00
							A	25.00	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Promoción de la Innovación en el Sector Empresarial	Physical Progress	Financial Progress

Outputs		Unit of Measure		2014	EOP	2014		EOP
Proyectos de innovación presentados por PyMES apoyados (Amplia cobertura+alto impacto+prototipos).	Empresas	P			196.00	P		708,457.00
		P(a)		0.00	179.00	P(a)		708,457.00
		A		17.00	196.00	A		708,457.00
Generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos		Physical Progress				Financial Progress		
Outputs		Unit of Measure		2014	EOP	2014		EOP
Proyectos de generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos para PyMEs apoyados.	Proyectos	P		0.00	19.00	P		961,783.00
		P(a)		1.00	24.00	P(a)		961,783.00
		A		6.00	29.00	A		961,783.00
Fortalecimiento de los recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación (CTI)		Physical Progress				Financial Progress		
Outputs		Unit of Measure		2014	EOP	2014		EOP
Investigadores apoyados a través de becas para continuar estudios de posgrado en el exterior y para movilidad.	Investigadores	P			125.00	P		
		P(a)			174.00	P(a)		
		A		4.00	178.00	A		
Apoyo a la innovación de alto interés público		Physical Progress				Financial Progress		
Outputs		Unit of Measure		2014	EOP	2014		EOP
Proyectos de innovación de alto interés público apoyados	Proyectos	P		0.00	12.00	P		0.00
		P(a)		0.00	25.00	P(a)		0.00
		A		26.00	51.00	A		0.00
Monitoreo y evaluación, auditoría e imprevistos								

Other Cost		2014	Cost
Monitoreo y evaluación	P	\$130,000.00	\$621,021.00
	P(a)	\$130,000.00	\$221,021.00
	A		\$91,021.00
Auditoría y evaluación de desempeño	P	\$80,000.00	\$307,887.00
	P(a)	\$80,000.00	\$127,887.00
	A		\$47,887.00
Imprevistos	P	\$710,000.00	\$715,467.00
	P(a)	\$710,000.00	\$715,467.00
	A		\$5,467.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$920,000.00	\$3,314,615.00
	P(a)	\$920,000.00	\$2,734,615.00
	A		\$1,814,615.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	La tasa de éxito en los esfuerzos de innovación realizados por las empresas beneficiarias se ve incrementada.	Modify Outcome	Actualización de indicadores de acuerdo al segundo informe semestral de 2013. Documento de referencia: Anexo 1_ Matriz de Resultados 30_12_2013 - Entrega BID	5/19/2014	5/5/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
