



Operation Number: **NI-L1056**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/6/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/17/2014**
Division Chief validation date: **06/24/2014**
Country Representative validation date: **07/11/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Comprehensive Child Care Program (PAININ, Phase IV)	Loan Number:	2468/BL-NI
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE LA FAMILIA		
Team Leader:	Helleranta,Meri	Sector/Subsector:	PRIMARY EDUCATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	NICARAGUA
Borrower:	REPUBLICA DE NICARAGUA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
NI-L1056	\$12,500,000.00	\$12,500,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$12,800,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
NI-L1056	\$12,500,000.00	\$12,500,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

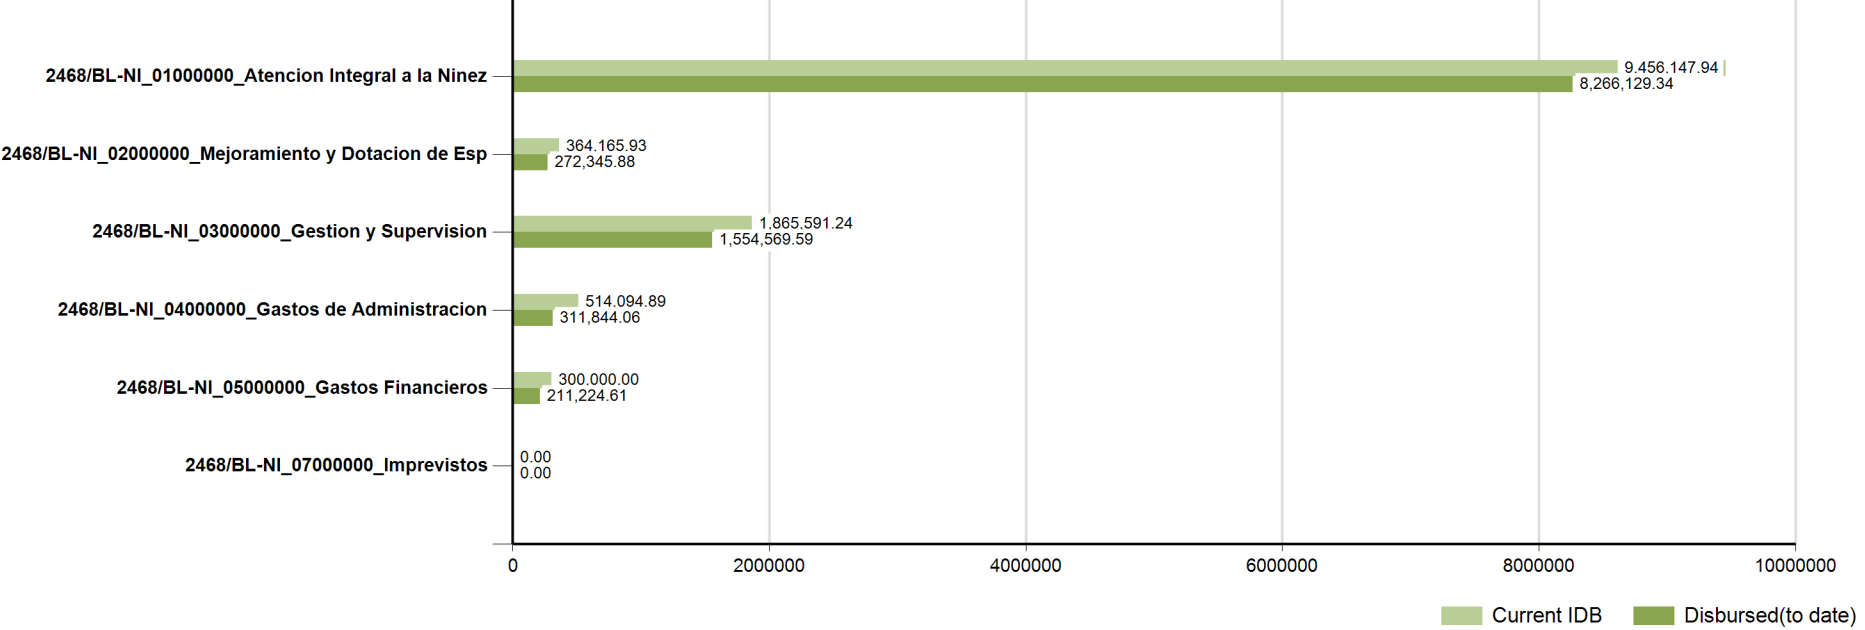

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Contribuir al desarrollo integral (psicosocial, cognitivo y físico) de los niños menores de seis años en condiciones de pobreza extrema del área rural de Nicaragua.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
1.1 % de niños menores de seis años beneficiarios del programa con anemia.		%	21.80	2010	La línea de base es de la evaluación actual del PAININ III.		P	11.00	11.00
							P(a)	11.00	11.00
							A		
1.2 Puntaje en escala general cognitiva		puntos en escala	84.30	2010	La línea de base es de la evaluación actual del PAININ III.	Los resultados se mediaran al final de la Etapa V del programa prevista para 2014.	P		87.57
							P(a)		87.57
							A		
1.3 % de niños beneficiarios del programa que ingresan al primer grado a los seis años (edad reglamentaria).		%	35.00	2009	Evaluación de impacto.		P		45.00
							P(a)		45.00
							A		

 RF - RF Indicator


 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Asegurar el mantenimiento de la cobertura actual del Programa y mejorar la calidad de la oferta de servicios de atención integral que reciben los niños beneficiarios.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	EOP
1.1 niños y niñas menores de seis años recibiendo estimulación temprana o preescolar.	 RF	Estudiantes	40,000.00	2010	Sistema de Monitoreo y Seguimiento (SMS) (registros del programa).		P	65,000.00	80,000.00	80,000.00
							P(a)	65,000.00	80,000.00	80,000.00
							A	38,717.00	64,942.00	64,942.00
1.2 niños beneficiarios del programa recibiendo alimentación complementaria.		niños	40,000.00	2010	SMS (registros del programa).		P	65,000.00	80,000.00	80,000.00
							P(a)	65,000.00	80,000.00	80,000.00
							A	72,607.00	81,220.00	81,220.00
1.3 niños beneficiarios del programa recibiendo micronutrientes.		niños	16,600.00	2010	SMS (registros del programa).		P	65,000.00	80,000.00	84,000.00
							P(a)	65,000.00	80,000.00	84,000.00
							A		15,200.00	15,200.00

1.4 niños beneficiarios menores de seis años sin registro de nacimiento.		niños	12,817.00	2011	SMS (registros del programa).		P	10,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00
							P(a)	10,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00
							A	9,325.00		3,609.00	3,609.00
1.5 niños beneficiarios con controles de Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo (VPCD).		niños	40,000.00	2010	SMS (registros del programa).		P	65,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
							P(a)	65,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
							A	27,358.00	64,942.00		64,942.00
1.6 # de mujeres embarazadas y lactantes de comunidades beneficiarias reciben servicios de atención integral.		# mujeres embarazadas	11,801.00	2011	SMS (registros del programa).		P	4,000.00			12,000.00
							P(a)	4,000.00			12,000.00
							A	2,120.00			2,120.00

Outcome:

2 Condiciones de los locales de atencion mejorados

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	EOP
2.1 % locales de atención que cuentan con piso de tierra.		%	40.00	2011	Sistema de información del programa		P			20.00
							P(a)			20.00
							A		75.00	75.00

Outcome:

3 Gestion del programa fortalecido

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	EOP
3.1 SMS con información confiable y oportuna para la planeación, monitoreo y evaluación del programa.		# Sistema	0.00	2011	Informes semestrales del programa y auditoría operativa.		P			1.00
							P(a)			1.00
							A		1.00	1.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Atención integral a la niñez		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Ninos de 0 a 6 anos y a sus familias atendidos con servicios integrales	niños	P	80,000.00	234,964.00	P	802,000.00	8,928,000.00
		P(a)	0.00	141,877.00	P(a)	0.00	6,808,042.00
		A		141,877.00	A		6,808,042.00
Número de niños sin registro civil, que reciben acompañamiento para su inscripción.	# de niños	P		13,325.00	P		30,000.00
		P(a)	4,500.00	16,755.00	P(a)	6,000.00	19,829.00
		A	3,609.00	16,755.00	A	0.00	19,829.00
Niños menores de tres años atendidos integralmente a través de la modalidad de atención en casa.	Personas	P			P		
		P(a)	46,700.00	96,101.00	P(a)	2,300,000.00	1,821,360.00
		A	49,401.00	49,401.00	A	1,581,360.00	1,581,360.00
Componente 2: Mejoramiento y dotación de espacios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Locales rehabilitados	locales	P		400.00	P		1,200,000.00
		P(a)	10.00	101.00	P(a)	26,337.00	272,345.00
		A	10.00	101.00	A	21,561.00	272,345.00
Locales equipados	locales	P		400.00	P		500,000.00
		P(a)	232.00	0.00	P(a)	150,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 3. Gestión y supervisión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Números de Comités Municipales para la Primera Infancia funcionando	# municipios	P		132.00	P		57,172.00
		P(a)	66.00	198.00	P(a)	1,800.00	58,559.00
		A	66.00	198.00	A	1,387.00	58,559.00
Número de usuarios conectados al SMS rediseñado	# de usuarios	P		30.00	P		85,000.00
		P(a)	15.00	45.00	P(a)	97,600.00	69,027.00
		A	15.00	45.00	A	61,871.00	69,027.00
Número de Técnicos integrales de seguimiento, y de apoyo administrativo a las Delegaciones activos	# de técnicos	P	58.00	174.00	P	157,000.00	1,256,000.00
		P(a)	52.00	168.00	P(a)	308,359.00	1,014,512.00
		A	52.00	168.00	A	185,014.00	1,014,512.00
Informes de auditoria operativa entregados	Informes	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2013	Cost
Actualización y mantenimiento de plataforma operativa del SMS.	P	\$20,000.00	\$60,000.00
	P(a)	\$20,000.00	\$0.00
	A		\$0.00
Auditoría operativa anual aprobada por el Banco	P	\$40,000.00	\$40,000.00
	P(a)	\$40,000.00	\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Auditoría financiera por delegación aprobada por el Banco.	P		\$30,000.00
	P(a)		\$18,922.00
	A		\$18,922.00
Administracion y gastos financieros	P	\$150,000.00	\$308,000.00
	P(a)	\$150,000.00	\$526,192.00
	A	\$288,249.00	\$526,192.00

Imprevistos	P		
	P(a)		\$0.00
	A		
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$1,169,000.00	\$12,524,172.00
	P(a)	\$3,100,096.00	\$10,608,788.00
	A	\$2,139,442.00	\$10,368,788.00

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output		Imprevistos	Delete Component	NUNCIADO ELIMINADO PORQUE NO CONTENIA INFORMACION.	6/5/2014	6/5/2014
Output		Administracion y gastos financieros	Delete Component	ENUNCIADO ELIMINADO PORQUE NO CONTENIA INFORMACION.	6/5/2014	6/5/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
