



Operation Number: **NI0155**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**  
Last Update: **6/6/2014**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/16/2014**  
Division Chief validation date: **06/25/2014**  
Country Representative validation date: **07/08/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Urban Welfare Program for Children in Extreme Poverty - Phase I	Loan Number:	2264/BL-NI
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE LA FAMILIA		
Team Leader:	Helleranta,Meri	Sector/Subsector:	IS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	NICARAGUA
Borrower:	REPUBLICA DE NICARAGUA	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
NI0155	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
NI0155	\$15,000,000.00	\$8,708,039.25	58.05%	\$6,291,960.75


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

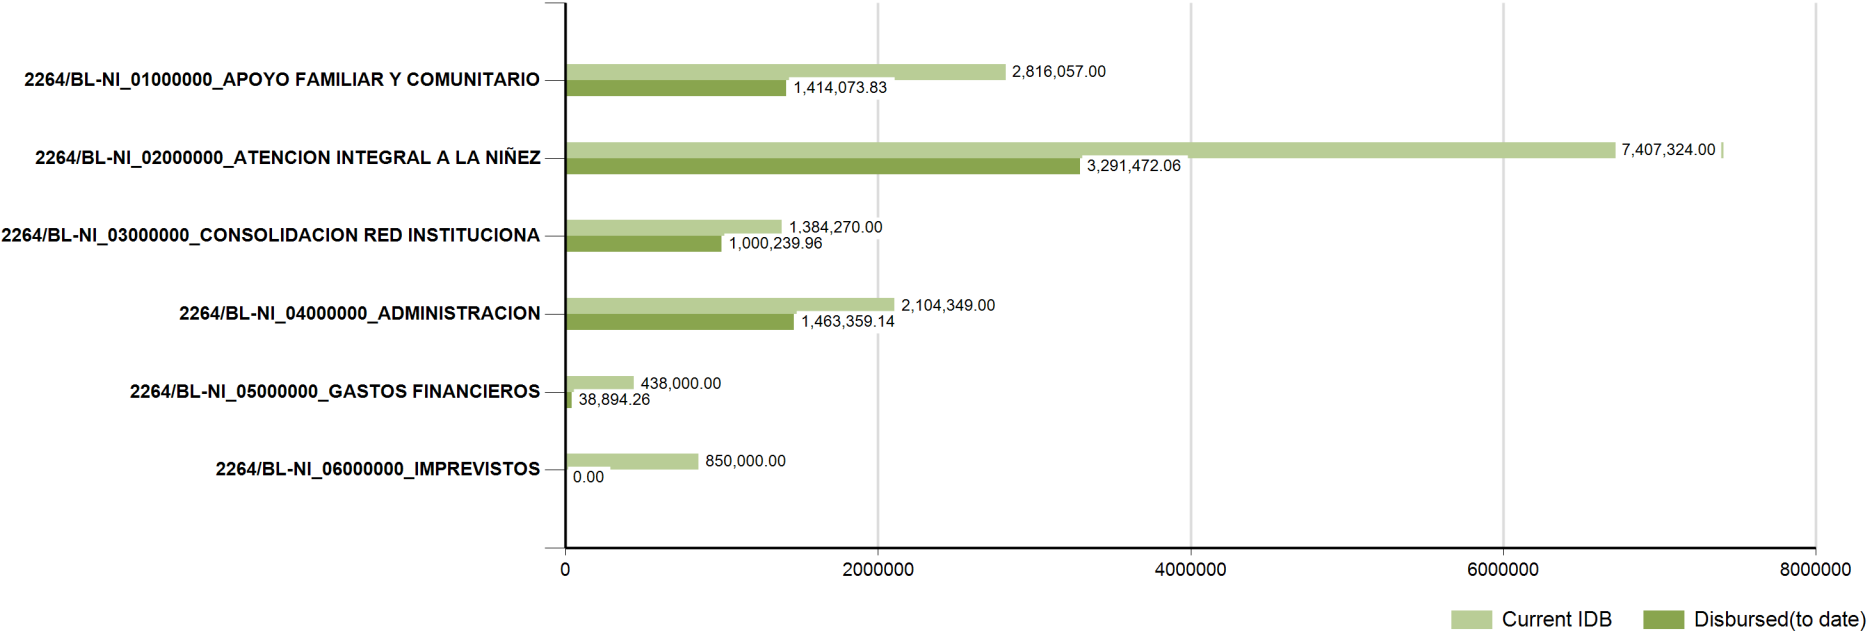


Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Desarrollo integral de la niñez que vive en extrema pobreza en áreas urbanas mejorado.											
Observation:	El programa cuenta con una evaluación de impacto con instrumentos cuantitativos y cualitativos y un diseño experimental que permitirá establecer la doble diferencia entre las áreas beneficiadas y otras de control (la selección de áreas para ser de tratami											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2015	EOP	
1.1 Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica en los barrios beneficiados.		%	12.60	2013	Evaluación de impacto (dos encuestas/mediciones: 2013 y 2015)		P	14.00	10.00	9.00		9.00
							P(a)	14.00	10.00	9.00	12.00	12.00
							A			12.60		
1.2 Porcentaje de Niños con retrasos en el desarrollo del lenguaje en los barrios beneficiarios.		%	12.80	2013	Evaluación de impacto (dos encuestas/mediciones: 2013 y 2015)	Resultados del prueba CLAP	P	40.00	60.00	65.00		65.00
							P(a)	40.00	60.00	65.00	11.00	11.00
							A			12.80		
1.3 Tasa de asistencia en escuela de primaria en los barrios beneficiados por el Programa aumentada (niños de 5 a 10 años viviendo en los hogares beneficiarios).		%	55.00	2011	Evaluación de impacto (dos encuestas/mediciones: 2013 y 2015)	Resultados del prueba CLAP	P	55.00	62.00	70.00		70.00
							P(a)	55.00	62.00	70.00	92.00	92.00
							A			90.50		
1.3 Porcentaje de niños con retrasos en el desarrollo motor en los barrios beneficiarios.		%	10.60	2013	Evaluación de impacto (dos encuestas/mediciones: 2013 y 2015)	Resultados del prueba CLAP	P					
							P(a)				9.00	9.00
							A			10.60		

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Capacidades fortalecidas en familias y comunidades beneficiadas para promover el desarrollo integral de la niñez.											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	EOP		
1.1 Desempeño de las madres beneficiados en prueba estandarizada de conocimientos y actitudes sobre crianza y demanda de servicios sociales para la niñez y familia.		Escala KIDI e	0.51	2013	EEvaluación de impacto (dos encuestas/mediciones : 2013 y 2015)	Escala KIDI	P	50.00	75.00	85.00		85.00
							P(a)	50.00	75.00	85.00		0.55
							A			0.51		
1.2 Niños menores de seis años con registro civil en las áreas beneficiadas.		Porcentaje	89.20	2013	Evaluación de impacto (dos encuestas/mediciones : 2013 y 2015)		P	70.00	78.00	80.00		80.00
							P(a)	70.00	78.00	80.00		80.00
							A		78.00	89.20		94.00

Outcome:	2 Acceso (y uso) y a los servicios de atención integral a la niñez de calidad mejorados en barrios focalizados.										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011		2012	2013	EOP
2.1 Cobertura de atención integral a menores de cinco años en barrios focalizados.		%	35.00	2013	Evaluación de impacto (dos encuestas/ mediciones : 2013 y 2015)	Asistencia CICO y/o modalidad comunitaria	P	15.00	40.00	50.00	50.00
							P(a)	15.00	40.00	50.00	40.00
	A							30.00	35.00		
Outcome:	3 Gestion del Sistema de Bienestar Social para la niñez fortalecida.										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011		2012	2013	EOP
3.1 Niño/as de los barrios priorizados menores de cinco años con esquema de vacunas completo para su edad.		%	65.00	2011	Evaluación de impacto (dos encuestas/ mediciones : 2013 y 2015)		P	65.00	70.00	75.00	75.00
							P(a)	65.00	70.00	75.00	70.00
	A							70.00	67.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

I. Apoyo Familiar y Comunitario para el Desarrollo Integral de la Niñez		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Asambleas Comunitarias de presentación o auditoría social del Programa llevadas a cabo	Asambleas	P	90.00	390.00	P	32,000.00	238,000.00
		P(a)	180.00	782.00	P(a)	142,600.00	199,103.00
		A	274.00	562.00	A	58,472.00	149,742.00
Recursos humanos para el acompañamiento familiar capacitados.	Personas	P	44.00	284.00	P	50,000.00	438,000.00
		P(a)	95.00	496.00	P(a)	142,000.00	243,701.00
		A	142.00	496.00	A	46,440.00	209,430.00
Actas de incorporación a la intervención suscritas entre la familia y su técnica de acompañamiento familiar	Planes de superación	P	9,000.00	24,000.00	P	300,000.00	1,140,000.00
		P(a)	6,800.00	19,485.00	P(a)	990,000.00	2,220,526.00
		A	7,259.00	17,511.00	A	890,254.00	1,654,185.00
Recursos Humanos Capacitados para impartir los Talleres de competencias parentales.	Educadoras populares	P	80.00	220.00	P	8,000.00	129,000.00
		P(a)	215.00	970.00	P(a)	78,000.00	65,844.00
		A	374.00	894.00	A	29,940.00	66,102.00
Miembros adultos de las familias participando en talleres de competencias parentales ( nuevos ingresos).	Personas	P		15,000.00	P	140,000.00	625,000.00
		P(a)	10,000.00	30,161.00	P(a)	12,300.00	114,632.00
		A	11,257.00	24,494.00	A	44,750.00	49,663.00
Familias beneficiadas con el acompañamiento en el trámite de inscripción de su/s hijo/a/s menores de seis años en el registro civil.	Personas	P	250.00	1,750.00	P	3,000.00	19,000.00
		P(a)	350.00	1,160.00	P(a)	10,450.00	16,832.00
		A	361.00	966.00	A	6,002.00	13,781.00
II. Acceso a Servicios Comunitarios de Atención Integral a la Niñez y sus Familias		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
CICO en los barrios focalizados aperturados.	CICO	P		30.00	P	200,000.00	8,250,000.00
		P(a)	12.00	50.00	P(a)	2,600,000.00	7,247,518.00
		A	16.00	25.00	A	2,233,814.00	3,541,596.00
Educadoras para las dos modalidades capacitadas (nuevos ingresos).	Educadoras	P	180.00	720.00	P	45,000.00	180,000.00
		P(a)	550.00	1,439.00	P(a)	290,000.00	585,903.00
		A	537.00	1,292.00	A	189,020.00	351,587.00
Expedientes de niño/as atendido/as en la modalidad institucional actualizados.	Personas	P	4,300.00	11,400.00	P	602,000.00	1,596,000.00
		P(a)	2,700.00	7,432.00	P(a)	490,000.00	649,964.00
		A	2,320.00	3,549.00	A	212,644.00	312,757.00
Expedientes de niño/as atendido/as en la modalidad itinerante actualizados.	Personas	P	4,300.00	11,400.00	P	409,000.00	1,084,000.00
		P(a)	5,000.00	10,552.00	P(a)	100,000.00	198,902.00
		A	5,579.00	8,787.00	A	89,428.00	113,955.00
III. Consolidación de la Red Institucional para la Atención Integral a la Niñez		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Usuarios conectados al Sistema de Monitoreo y Seguimiento en el nivel municipal, departamental y central.	Usuarios	P	30.00	80.00	P	18,000.00	298,000.00
		P(a)	42.00	324.00	P(a)	129,000.00	308,670.00
		A	139.00	303.00	A	80,251.00	251,599.00
Eventos locales y nacionales de divulgación del Programa y sus resultados realizados.	Eventos	P	2.00	8.00	P	30,000.00	80,000.00
		P(a)	30.00	83.00	P(a)	78,000.00	65,840.00
		A	45.00	50.00	A	45,000.00	45,733.00
Actores de la red institucional (miembros de los Comités de barrio, municipales, comité interinstitucional) capacitados en el curriculum básico del Programa.	Personas	P	100.00	350.00	P	40,000.00	200,000.00
		P(a)	700.00	2,855.00	P(a)	31,000.00	645,509.00
		A	1,718.00	2,540.00	A	64,762.00	590,163.00

Informes mensuales de supervisión por las delegaciones a nivel departamental y municipal disponibles.	Informes	P	66.00	330.00	P	60,000.00	280,000.00
		P(a)	67.00	267.00	P(a)	112,300.00	359,718.00
		A	99.00	215.00	A	118,247.00	256,577.00
Administración							
Costos financieros							
Imprevistos							

Other Cost		2013	Cost
Informes de avance y planificación del programa según el Reglamento Operativo entregados oportunamente.	P	\$120,000.00	\$600,000.00
	P(a)	\$840,000.00	\$2,038,444.00
	A	\$695,405.00	\$1,741,760.00
FIV e intereses	P	\$300,000.00	\$438,000.00
	P(a)	\$0.00	\$38,894.00
	A	\$38,894.00	\$38,894.00
Suplir necesidades imprevistas hacia la segunda parte del Programa	P	\$850,000.00	\$850,000.00
	P(a)	\$0.00	\$0.00
	A		\$0.00
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$3,207,000.00	\$16,445,000.00
	P(a)	\$6,045,650.00	\$10,712,999.00
	A	\$4,843,323.00	\$9,387,524.00

### Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
