



Operation Number: **DR-L1044**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/31/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Division Chief**

Chief of Operations validation date: **11/06/2014**
Division Chief validation date: **11/07/2014**
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for the Social Protection Program - Second Phase	Loan Number:	2426/OC-DR
Executing Agency (EA):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA		
Team Leader:	Parodi,Sandro	Sector/Subsector:	IS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1044	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1044	\$100,000,000.00	\$92,577,575.88	92.58%	\$7,422,424.12


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

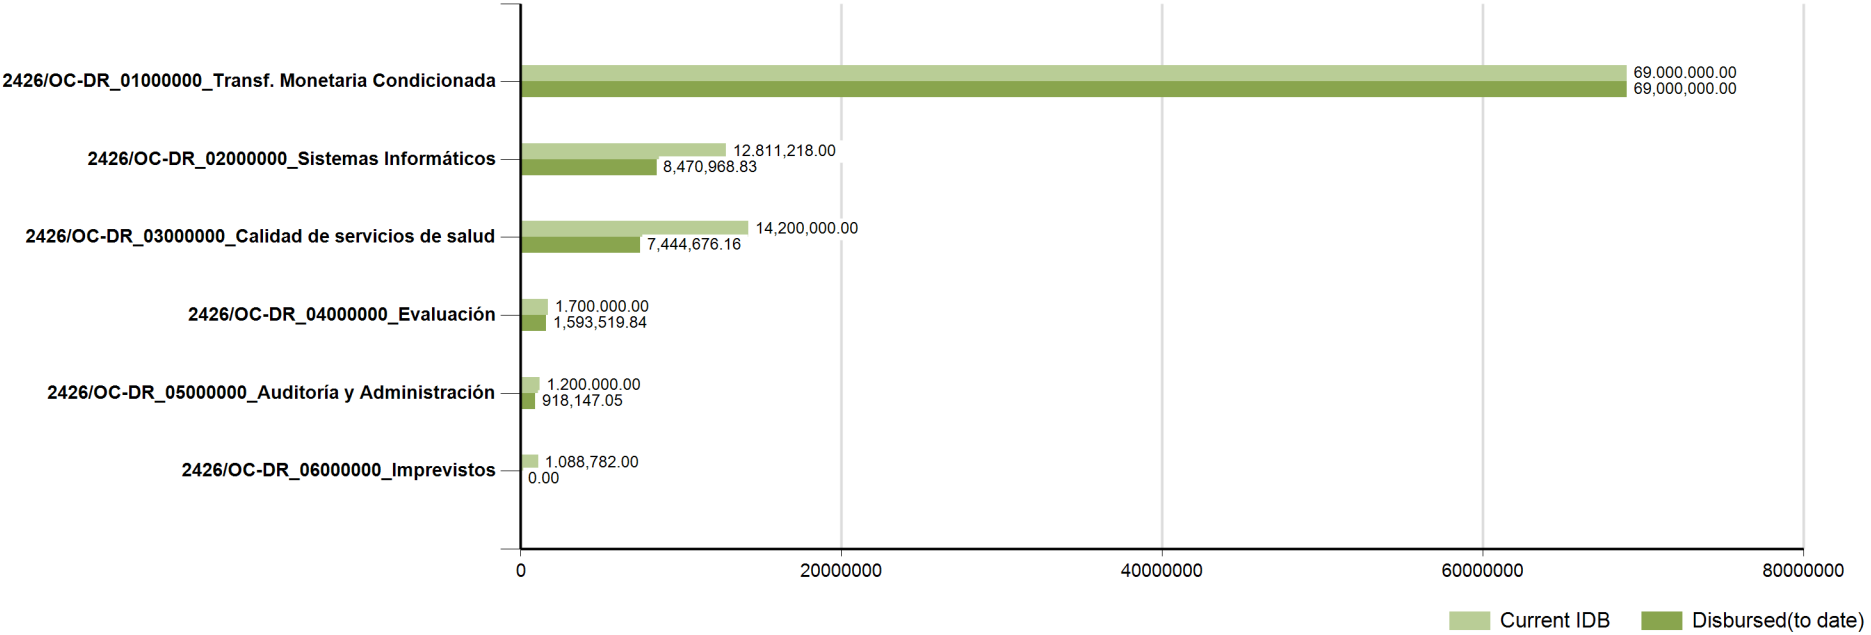

Results Matrix

Impacts


Impact:		1 Niños y niñas beneficiarios de Solidaridad con menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez								
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2013	EOP	
1.1 Prevalencia de desnutrición crónica de niños(as) de 0-2 años en hogares beneficiarios de Solidaridad disminuida		Porcentaje	10.60	2010	Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011	El Plan de metas refleja la reduccion en puntos porcentuales que se espera lograr en disminuir la prevalencia de desnutrición crónica de niños(as) de 0 -2 años en hogares beneficiarios de Solidaridad. La meta establecida es de una reduccion de 1 punto perc	P	-0.50		7.30
							P(a)	-0.50	-0.50	9.60
							A			
1.2 Estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad incrementada		Centímetro	99.30	2010	Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011	El Plan de metas refleja el aumento en puntos porcentuales que se espera lograr en aumentar la estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad. La meta establecida es de un incremento de 1 punto pe	P	0.50		101.36
							P(a)	0.50	0.50	100.30
							A			



1.3 Niños(as) de entre 18 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunacion completa		Porcentaje	26.10	2010	Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011	El Plan de metas refleja el aumento en puntos porcentuales que se espera lograr en aumentar el Numero de niños(as) de entre 18 y 23 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunacion completa. La meta esperada es de un incremento en 9	P	4.73		38.80
							P(a)	4.73	4.73	35.56
							A			
1.4 Niños(as) de entre 14 y 16 años en hogares Solidaridad que terminaron al menos 6 grados de educación básica		Porcentaje	18.39	2010	Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011	El plan de metas refleja el aumento en puntos porcentuales que se espera lograr en aumentar Niños(as) de entre 14 y 16 años en hogares Solidaridad que terminaron al menos 6 grados de educación básica	P	0.91		20.22
							P(a)	0.91	0.92	20.22
							A			



 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity


Outcomes


Outcome:	1 Los hogares beneficiarios del programa Solidaridad incrementan su demanda por los servicios de nutrición, salud y educación.
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011			EOP
							P			
1.1 Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de niños menores de 5 años que fueron llevados al centro de salud para sus controles (exámenes médicos para que lo midan, pesen y vacunen).		porcentaje	-7.40	2010	Linea de Base: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011	El indicador no incluye visitas al centro de salud por casos de morbilidad. Se cambió la definición del indicador de "Doble diferencia" a "Diferencia" con la finalidad de medir resultados y no impactos. La meta establecida es una reducción de 4.06 puntos	P	-2.03		0.00
							P(a)	-5.07		-2.74
							A	-0.27		-0.27
1.2 Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de mujeres embarazadas que tuvieron al menos un monitoreo prenatal durante el primer trimestre de embarazo.	 RF	Porcentaje	0.48	2010	Linea de Base: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011	La meta establecida es un aumento de 1.6 puntos porcentuales.	P	0.80		10.00
							P(a)	1.28		2.08
							A			0.00

1.3 Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios el porcentaje de niños entre 12 y 60 meses que cuentan con el esquema de vacunación completo para la edad.	 RF	Porcentaje	0.27	2010	Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011	La meta establecida es de un aumento de 2.3 puntos porcentuales.	P	1.91	4.00
							P(a)	5.43	10.60
	A						4.78	0.00	
1.4 Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de niños y jóvenes de entre 6 y 18 años de edad que se inscribieron y culminaron el año escolar	 RF	Porcentaje	-1.28	2010	Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011		P	2.53	10.00
							P(a)	0.11	1.50
	A						0.08	0.00	
Outcome:	2 Se incrementa la calidad de los servicios de salud y nutrición cuya demanda es promovida por Solidaridad.								
Observation:	Se espera que estos convenios sean gestionados a partir de 2012 por un Ente Gestos de los servicios de salud, descentralizado del Ministerio de Salud Pública. Durante 2010 serán gestionados por la Dirección General de Redes de dicho Ministerio.								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011			EOP
2.1 Número de Regiones de Salud (son 9 en todo el país) que operan bajo Convenios de Gestión que incluyen metas de calidad y cuyos parametros de costos son estimados con información generada directamente por los centros de salud.	 RF	Porcentaje	0.00	2010	Convenios de gestión con las regionales de salud.	Se espera que estos convenios sean gestionados a partir de 2012 por un Ente Gestos de los servicios de salud, descentralizado del Ministerio de Salud Pública. Durante 2010 serán gestionados por la Dirección General de Redes de dicho Ministerio.	P			9.00
							P(a)			9.00
							A			0.00
2.2 Centros de salud que cumplen con las normas de habitación y que atienden a beneficiarios de Solidaridad aumentado.	 RF	Porcentaje	10.00	2010	Reporte de la Direccion de Habitacion del Ministerio de Salud		P	20.00		50.00
							P(a)	20.00		50.00
							A	21.80		0.00

2.3 Personal de salud del Primer Nivel que recibieron entrenamiento financiado por el proyecto y que atiende a beneficiarios de Solidaridad que conocen al menos un 60% de los contenidos de las guías y protocolos de atención materno-infantil	 RF				Reporte de la firma contratada para dar la capacitación.	El Plan de metas refleja el aumento en puntos porcentuales que se espera lograr en aumentar el número del personal de salud del Primer Nivel que recibieron entrenamiento financiado por el proyecto y que atiende a beneficiarios de Solidaridad que conocen a	P	12.00	50.00
							P(a)	12.00	50.00
							A	13.20	0.00
	Porcentaje	8.00	2009						

2.4 Número de personas que reciben atención en Centros de Atención Primaria (CAPS) habilitados.	<div>  <div>RF</div> </div>					El Ministerio de Salud de la República Dominicana utiliza como referencia la estimación de que cada Centro de Atención Primaria atiende a 2,500 personas. La línea de base y las metas se calculan usando ese supuesto.	P		
							P(a)		682,500.00
							A		0.00
		Personas	382,500.00	2011					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Transferencias monetarias condicionadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Personas que reciben transferencias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutricion, salud y educación con recursos del componente.	Personas	P		408,344.00	P		69,000,000.00
		P(a)		981,070.00	P(a)		69,000,000.00
		A		981,070.00	A		69,000,000.00
Sistemas informáticos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistema de Gestión de los Servicios de Salud fortalecido	Sistema	P		1.00	P		7,559,500.00
		P(a)		2.00	P(a)		4,162,000.00
		A		2.00	A		4,162,000.00
Sistema de Verificacion Eletronica de Condionalidades interconectado con el Sistema de Gestión de los Servicios de Salud	Sistema	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		691,000.00
		A		1.00	A		691,000.00
Sistema Informatico de Proteccion Social fortalecido	Sistema	P		1.00	P		3,994,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		3,553,000.00
		A		1.00	A		3,553,000.00
Calidad de los servicios de salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Centros públicos de tercer nivel de atención de servicios de salud habilitados	Centros de salud	P		0.00	P		0.00
		P(a)	15.00	15.00	P(a)	4,000,000.00	4,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Médicos y enfermeras del primer nivel de atención de salud capacitados en las Guías y Protocolos de Salud para el dicho nivel a través del Sistema Modular de Capacitación a Distancia.	Médicos y enfermeras	P		2,700.00	P		2,826,000.00
		P(a)		355.00	P(a)		367,500.00
		A		355.00	A		367,500.00
Centros públicos de salud de primer nivel de atencion equipados (incluido en la lista de insumos mínimos necesarios para lograr la habilitación del Ministerio de Salud Pública).	Centros de salud	P		230.00	P		9,650,000.00
		P(a)	40.00	297.00	P(a)	8,470,200.00	8,879,500.00
		A	0.00	257.00	A	474,492.00	883,792.00
Desarrollo organizacional y operativo de un Ente Gestor, descentralizado del Ministerio de Salud Publica terminado	Ente Gestor	P		1.00	P		1,170,500.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema de Gestión Clínica Ampliado	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		7,687,000.00
		A		1.00	A		7,687,000.00
Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Informes técnicos de evaluación de impacto de corto plazo de las innovaciones de Solidaridad validados en un proceso de revisión de pares.	Estudios	P		7.00	P		900,000.00
		P(a)		7.00	P(a)		1,135,000.00
		A		7.00	A		1,135,000.00

Informe de evaluación del cumplimiento de estándares técnicos de las inversiones informáticas del programa validado por las instituciones beneficiarias (entidades del Programa de Protección Social, Ministerios de Salud Pública y Educación).	Informes técnicos	P		0.00	P		45,000.00
		P(a)			P(a)		
		A			A		
Informe técnico de evaluación de la aplicación de las Guías y Protocolos de salud por parte de médicos y enfermeras del primer nivel de atención (viñetas), validado en un proceso de revisión de pares.	Informes técnicos	P		1.00	P		305,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Informe de evaluación del cumplimiento del Reglamento Operativo del Ente Gestor de los Servicios de Salud validado por la Dirección General de Redes del Ministerio de Salud Pública.	Informes técnicos	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Informe técnico de la evaluación experimental para analizar el impacto de los esquemas piloto de transferencia educativa realizado	Informe tecnico	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		30,000.00
		A		1.00	A		30,000.00
Auditoría y Administración							
Imprevistos							

Other Cost		2014	Cost
Auditoría Financiera	P		\$75,000.00
	P(a)		\$0.00
	A		\$0.00
Gastos de administracion	P		\$925,000.00
	P(a)		\$295,000.00
	A		\$295,000.00
Auditoria recurrente para la verificacion del cumplimiento de corresponsabilidades	P		\$300,000.00
	P(a)		\$200,000.00
	A		\$200,000.00
Gastos con imprevistos	P		\$3,000,000.00
	P(a)		\$0.00
	A		\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$100,000,000.00
	P(a)	\$12,470,200.00	\$100,000,000.00
	A	\$474,492.00	\$88,004,292.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Habilitación infraestructura fisica de centros de primer nivel	Create Milestone	Previo al equipamiento, la infraestructura fisica de los centros de salud debe ser habilitada de lo contrario no lograrían la certificación.	6/6/2014	4/1/2014
Output	Centros públicos de tercer nivel de atención de servicios de salud habilitados	Create Output	Dado que la ley sobre la creación del ente gestor no se ha podido aprobar, el organismo ejecutor (gabinete de coordinacion de politica social) solicitó al Banco durante el ejercicio de programacion del 2014 que los recursos se destinen a la habilitacion de centros de tercer nivel a los que acceden mayoritariamente los beneficiarios de Prosoli. Esta solicitud esta previamente consensuada con el Ministerio de Salud, el cual considera que es una inversion de alta prioridad.	6/2/2014	5/1/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
