



Operation Number: **DR-L1046**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **11/11/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Division Chief**

Chief of Operations validation date: **11/13/2014**
Division Chief validation date: **11/13/2014**
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program to Support Competitiveness Policy II	Loan Number:	2432/OC-DR,2433/OC-DR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ,Consejo Nacional de Competitividad		
Team Leader:	Novoa,Raul Horacio	Sector/Subsector:	PS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA ,REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1046	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$124,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1046	\$120,000,000.00	\$112,925,828.05	94.10%	\$7,074,171.95


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

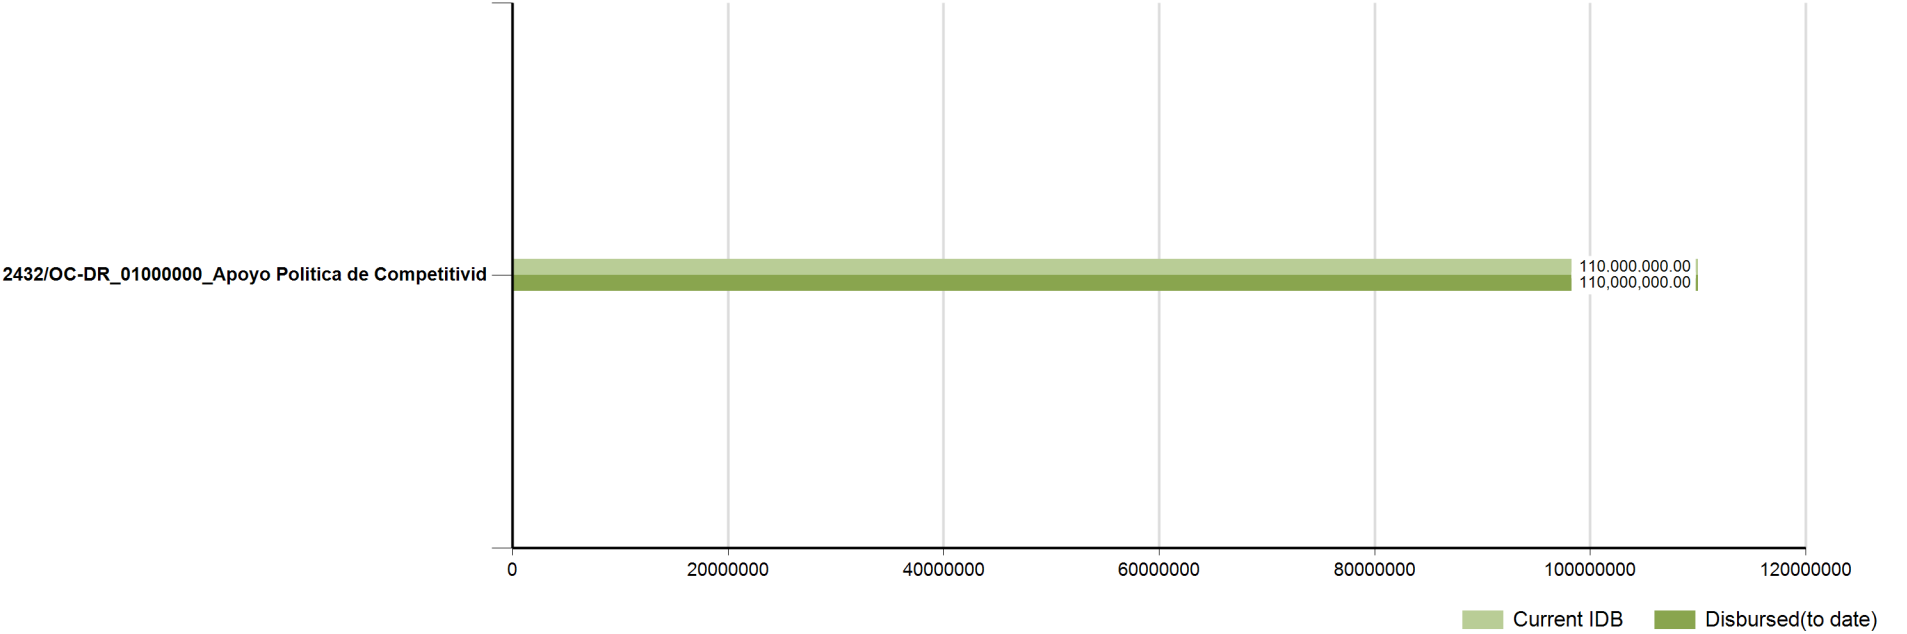

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Sostenibilidad Macroeconómica - Crecimiento con estabilidad de Precios Alcanzada											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	EOP	
1.1 Crecimiento Promedio PIB		%	3.50	2009	Informes Estadísticos. Revisión Metas FMI	La meta de crecimiento promedio del PIB se determinó en función del período 2000-2007 (5,6%) más 100 puntos básicos. La meta se establece al fin del programa (2014)	P	100.00				6.60
	P(a)										6.60	
	A						0.00					
1.2 Evolución Inflación Promedio		%	9.70	2008	Informes estadísticos. Revisión Metas FMI	La meta FDP se estableció tomando en consideración la inflación promedio del período 2000-2007 (15,1% anual) y restándolo 700 puntos básicos.	P					8.10
	P(a)										8.10	
	A											
Outcome:	2 Gestión Fiscal Planeación y Administración Pública mejoradas											
Observation:												

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
2.1 Relación Gastos Tributarios /PIB			%	5.90	2009	Informes estadísticos. Revisión Metas FMI	Se tomó como horizonte cercano de evaluación de la meta a alcanzar al año 20103	P	100.00				4.00
								P(a)				4.00	
		A						0.00					
2.2 Relación Empleados Públicos de Carrera / Empleados Públicos			%	24.00	2009	Informes Estadísticos Instituciones y Ministerios relacionados con al función pública	Horizonte para la evaluación de la meta prevista a alcanzar : 2015	P				50.00	
								P(a)				50.00	
		A											
Outcome:	3 Competitividad Institucional y Facilidad Comercial fomentadas y desarrolladas												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
3.1 Posición relativa en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial			Posición	95.00	2009	Informes Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	En el período 2009/2010 la posición de RD era de 95 sobre un total de 133 países relevados. Se estableció como meta un incremento del 5% en dicha posición. Manteniendo fija la base de 133, la posición definida es la que permite traducir, en posiciones, el	P	100.00				88.00
								P(a)				88.00	
		A						0.00					

3.2 Inversión Extranjera Directa		Flujo promedio en millones de USD	3.70	2010	Informes estadísticos. Revisión Metas FMI	Se estableció un crecimiento estimado del 12,8% como resultado de la comparación del flujo promedio entre los años 2008 y 2010 y el correspondiente al año 2007 (3,8 mm). Horizonte de evaluación: Fin programada	P					4.17
							P(a)					4.17
							A					

Outcome:

4 Innovación, Desarrollo Tecnológico y Control de Calidad fomentados, desarrollados y promocionados

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	EOP
4.1 Actividad Total Emprendedora Dominicana		%	16.80	2007	Global Entrepreneurship Monitor	Horizonte de evaluación más cercano de la Meta FDP: 2012	P	100.00			21.80
							P(a)				21.80
							A	0.00			

4.2 Índice Preparación Tecnológica (NRI)		Posición	75.00	2008	Foro Económico Mundial	Se asumió la misma base de países (127) para determinar la posición relativa que muestra una diferencia del 5% entre ambas relaciones. Horizonte de evaluación más cercano de la Meta FDP: 2012	P					71.00
	P(a)										71.00	
	A											
Outcome:	5 Clima de Negocios mejorado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
							P					
5.1 Recovery Rate de Activos		Centavos por Dólar	8.90	2010	Doing Business	Horizonte más cercano de evaluación de Meta FDP: 2012	P	100.00				50.00
	P(a)										50.00	
	A						0.00					
5.2 Empresas creadas a través del Portal Crea Tu Empresa		Cantidad	28.00	2008	Informes de Ejecución CNC	Se está en proceso de determinación de la meta a alcanzar. Horizonte más cercano de evaluación de Meta FDP: 2012	P					28.00
	P(a)										28.00	
	A											
5.3 Índice Doing Business		Posición	86.00	2010	Doing Business del Banco Mundial		P					71.00
	P(a)										71.00	
	A											

5.4 Tiempo para el registro de una empresa mejorado		Días	19.00	2010	Doing Business (Banco Mundial)	Horizonte de tiempo más cercano para la evaluación de la Meta FDP: 2012	P					7.00
							P(a)					7.00
							A					
5.5 Tiempo para cerrar una empresa mejorado		Años	3.50	2010	Doing Business (Banco Mundial)		P					1.00
							P(a)					1.00
							A					
Outcome:	6 Base de clusters ampliada											
Observation:	El componente basa su desarrollo en dos áreas de intervención: (i) la ampliación y fortalecimiento de la base de clusters existentes y; (ii) La coordinación institucional (público - privada) para el desarrollo de clusters											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
6.1 Clusters existentes desarrollan negocios y proyectos en conjunto (a través de sus empresas pertenecientes)		Cantidad Clusters	0.00	2010	Informes del Proyecto (FONDEC) y CNC	Se parte de un universo de 20 clusters existentes. Eventualmente esta cifra puede variar durante el desarrollo del programa	P		0.00	2.00	9.00	12.00
							P(a)		0.00	2.00	6.00	12.00
							A		0.00	3.00	4.00	

6.2 Instituciones relacionadas con la generación de PDPs han sido adecuadament e preparadas para evaluación (definida la línea de base, herramientas de medición y horizonte de medición)						La hipótesis de intervención es lograr potenciar las medidas de política a ser tomadas en función de una evaluación más objetiva en términos del impacto de las acciones tomadas por estas instituciones y el costo de las mismas (para determinar una relación	P					100.00
							P(a)					100.00
							A					
		Porcentaje de instituciones preparadas	0.00	2010	Informes del Proyecto / CNC							

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	EOP
7.1 Instituciones relacionadas con la generación de PDPs han sido adecuadamente preparadas para evaluación (definida la línea de base, herramientas de medición y horizonte de medición)						La hipótesis de intervención es lograr potenciar las medidas de política a ser tomadas en función de una evaluación más objetiva en términos del impacto de las acciones tomadas por estas instituciones y el costo de las mismas (para determinar una relación	P				100.00
							P(a)				100.00
							A				
		Porcentaje instituciones preparadas	0.00	2010	Informes de Proyecto / CNC						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Ampliación Base para el Desarrollo de Clusters		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Proyectos Aprobados de Asistencia Técnica Financiera para la consolidación de clusters existentes y en funcionamiento	Cantidad	P	5.00	20.00	P	843,709.00	5,021,162.00
		P(a)	5.00	15.00	P(a)	909,257.00	4,146,895.18
		A	7.00	14.00	A	849,487.54	1,937,125.72
Proyectos Aprobados de Asistencia Técnica Financiera para incorporar clusters para desarrollar la complejidad (sofisticación) de las actividades productivas orientadas a mercados nacionales e internacionales	Cantidad	P	3.00	14.00	P	1,116,050.00	4,464,200.00
		P(a)	5.00	10.00	P(a)	1,046,554.00	3,340,374.40
		A	5.00	7.00	A	180,577.18	255,397.58
Proyectos Aprobados para Asistencia Técnica Financiera para el desarrollo de planes piloto de incorporación de tecnología e innovación para el incremento del valor agregado del cluster	Cantidad	P		6.00	P	334,815.00	1,674,075.00
		P(a)	3.00	5.00	P(a)	241,554.80	1,056,554.80
		A		0.00	A		0.00
Metodología para medición beneficios por participación en clusters desarrollada	Metodología desarrollada	P		1.00	P		94,725.00
		P(a)		0.00	P(a)	94,725.00	104,680.20
		A		0.00	A		9,955.20
Metodología para la identificación de nuevos clusters orientados al desarrollo de la complejidad de las habilidades productivas dominicanas desarrollada y aplicada	Metodología desarrollada y aplicada	P		1.00	P		117,375.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Coordinación Institucional para el Desarrollo de Clusters		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Instrumentación metodológica para evaluación de impacto de la actuación de instituciones PDPS realizada	Evaluación de impacto realizada	P	1.00	1.00	P	54,375.00	108,750.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	54,375.00	54,375.00
		A		0.00	A		0.00
Capacitación y Uso SIGA realizado	Consultoría realizada	P		1.00	P		11,251.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Código de Ética DGCP desarrollado	Consultoría realizada	P		1.00	P		15,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Proyecto Reglamentación Ley Reestructuración Mercantil preparado	Consultoría realizada	P		1.00	P		20,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Talleres (Workshops) , jornadas y eventos de sensibilización y difusión	Eventos realizados	P	25.00	142.00	P	94,840.00	379,000.00
		P(a)	27.00	54.00	P(a)	141,000.00	299,675.51
		A	20.00	46.00	A	74,736.12	92,411.63
Sostenibilidad Macroeconómica		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Marco de Política macroeconómica congruente con los objetivos del prestamo.	Política	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Gestión Fiscal, Planeación y Administración Pública		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP

Unidad del Ministerio de Hacienda creada para revisar todos los aspectos relacionados con la política fiscal	Unidad Creada	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Metodología para preparación presupuestos plurianuales para el sector público no financiero	Metodología Creada y Presentada	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Metodología, estándares e instrucciones técnicas del MH para la preparación del presupuesto consolidado para el Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas e Instituciones con Autonomía Financiera e Instituciones de la Seguridad Social desarrollada y	Metodología desarrollada y aprobada	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Uso excedentes presupuestarios requieren solicitud autorización al Congreso Nacional vigente	Norma uso excedentes presupuetarios vigente	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Gastos devengados en contabilidad presupuestaria reconocidos	Gastos devengados reconocidos en presupuesto	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Gastos tributarios reconocidos y metodología para identificación del costo de los subsidios impositivos desarrollada	Metodología desarrollada	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Plan Estratégico de Mediano Plazo para el manejo de la deuda pública del Prestatario presentado y aprobado por el Consejo de Deuda	Plan Estratégico presentado y aprobado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Reglas de operación internas de la Dirección General de Crédito Público preparadas y en funcionamiento	Dirección General de Crédito Público creada y operando	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Plan Estratégico Institucional para la Contraloría General de la República que asegure calidad y uniformidad en el uso, manejo, recaudo e inversión de los recursos públicos.	Plan Estratégico presentado y aprobado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 -2030 preparada en consulta y concertación con la sociedad civil	Estrategia consultada y concertada	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Unidades de Planificación establecidas en al menos 4 Ministerios	Unidades Establecidas	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Acuerdos para la implantación del sistema de gestión por resultados entre el MH, el MEPLYD y el MAP con los ministerios de Educación, Salud, Agricultura y Trabajo.	Acuerdos firmados	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Normas y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) aprobadas por el MEPLYD y difundidas.	Normas y Procedimientos Aprobados	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Entidades descentralizadas se incorporan al SNIP con información detallada sobre los proyectos	Informe sobre ejecución detallada de inversión de entidades descentralizadas	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Informe sobre capacitación del SNIP a las entidades públicas	Informe Progreso Capacitación SNIP	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00

Términos de Referencia para la realización de un manual de evaluación de impacto de las inversiones públicas incluyendo líneas de base, sistemas de monitoreo y seguimiento de la información presentados	ToRs presentados	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Informe de estadísticas básicas consolidadas sobre el estado de implantación del Sistema de Administración y Servicios del Personal (SASP).	Informe Presentado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Herramienta para evaluación de los procesos de administración institucional aplicada en las instituciones públicas	Marco Común de Evaluación FODA aplicado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Competitividad Institucional y Facilitación Comercial		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardia funcionando	Comisión funcionando	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Cumplimiento condiciones matriz de políticas (2do Tramo PBL Programático)	% Cumplimiento	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Utilización del Documento Único de Aduana para declaración de importaciones en línea incrementado	Documento Utilizado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Asignación presupuestaria del equivalente a USD 3.1 millones al Consejo Nacional de Competitividad (CNC)	Asignación realizada	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Borrador del Reglamento de la Ley 42-08 (Ley de Defensa de la Competencia) validado; Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia presentada recursos asignados al Consejo	Borrador y lista presentados; partida asignada	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) operando	PROCONSUMIDO R operando	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Control de Calidad		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Consejo para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico operando	Consejo operando	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Cumplimiento condiciones matriz de políticas (2do Tramo PBL Programático)	% Cumplimiento	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología difundido	Plan Estratégico difundido	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Reglamento Técnico Administrativo del Fondo Nacional de Innovación, Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT) aprobado	Reglamento aprobado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00

Red Dominicana de Incubadoras de Negocios y Emprendimientos operando	Red operando	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Diagnóstico de las necesidades para el nuevo curriculum de ingeniería que contemple estándares internacionales de acreditación y certificación presentado	Diagnóstico presentado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Centros de Capacitación en Informática cuentan con acceso a Internet (al menos en un 50%)	Centros cuentan con acceso a Internet	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Plan Bianual Proyectos de Desarrollo para expansión acceso de los Centros de Capacitación en Informática a internet y Plan para el Desarrollo de un Sistema de Mejora de la Atención de los Centros de Capacitación al usuario, preentados y aprobados	Planes presentados y aprobados	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Proyecto de Ley para establecer el Sistema Nacional de Calidad presentado al Congreso	Proyecto de Ley presentado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Mejora del Clima de Negocios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Diseño de un observatorio MPyMEs (como portal electrónico) para monitoreo de las estrategias del sector y difusión de información estadística realizado	Diseño realizado y presentado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Cumplimiento condiciones matriz de políticas (2do Tramo PBL Programático)	% Cumplimiento	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Diseño del Anteproyecto de Ley que crea el Sistema de Garantías Recíprocas para las MiPyMEs enviado para revisión de la Superintendica de Valores, de la Superintendencia de Bancos , del Banco Nacional de la Vivienda y del Consejo de Promoción y Apoyo a la	Anteproyecto enviado	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Actualización del portal electrónico Crea tu Empresa para permitir su adecuación con la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada	Actualización realizada	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Avances de la implementación del proceso de transformaciones societarias definido en el Ley 479-08) realizados y 3 talleres nacionales para difusión realizados	Avances y talleres realizados	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Gestión y Supervisión							
Imprevistos							
Condiciones del Tramo del PBL desembolsadas							
Other Cost					2014		Cost
Administración FONDEC				P			
				P(a)	\$180,000.00		\$452,582.00
				A			\$272,582.00

Gestión, Auditoría y Supervisión del componente de inversión	P	\$203,115.00	\$203,115.00
	P(a)	\$261,649.00	\$822,164.00
	A	\$9,194.09	\$480,986.09
Imprevistos	P	\$67,000.00	\$67,000.00
	P(a)	\$22,537.00	\$22,537.00
	A		\$0.00
Evaluacion y monitoreo	P		
	P(a)	\$50,000.00	\$50,000.00
	A		\$0.00
Condiciones del Tramo del PBL desembolsadas	P		\$110,000,000.00
	P(a)		\$110,000,000.00
	A		\$110,000,000.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$2,713,904.00	\$122,175,653.00
	P(a)	\$3,001,651.80	\$118,462,181.22
	A	\$1,113,994.93	\$113,048,458.22

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
