



Operation Number: **AR-L1007**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/12/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/22/2015**
Division Chief validation date: **10/23/2015**
Country Representative validation date: **11/10/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Social Investment Program in Buenos Aires Province	Loan Number:	1700/OC-AR
Executing Agency (EA):	Ministerio de Economía Provincia de Buenos Aires		
Team Leader:	Sanchez,Mario Alberto	Sector/Subsector:	EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1007	\$230,000,000.00	\$230,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$330,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1007	\$230,000,000.00	\$229,802,623.99	99.91%	\$197,376.01


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

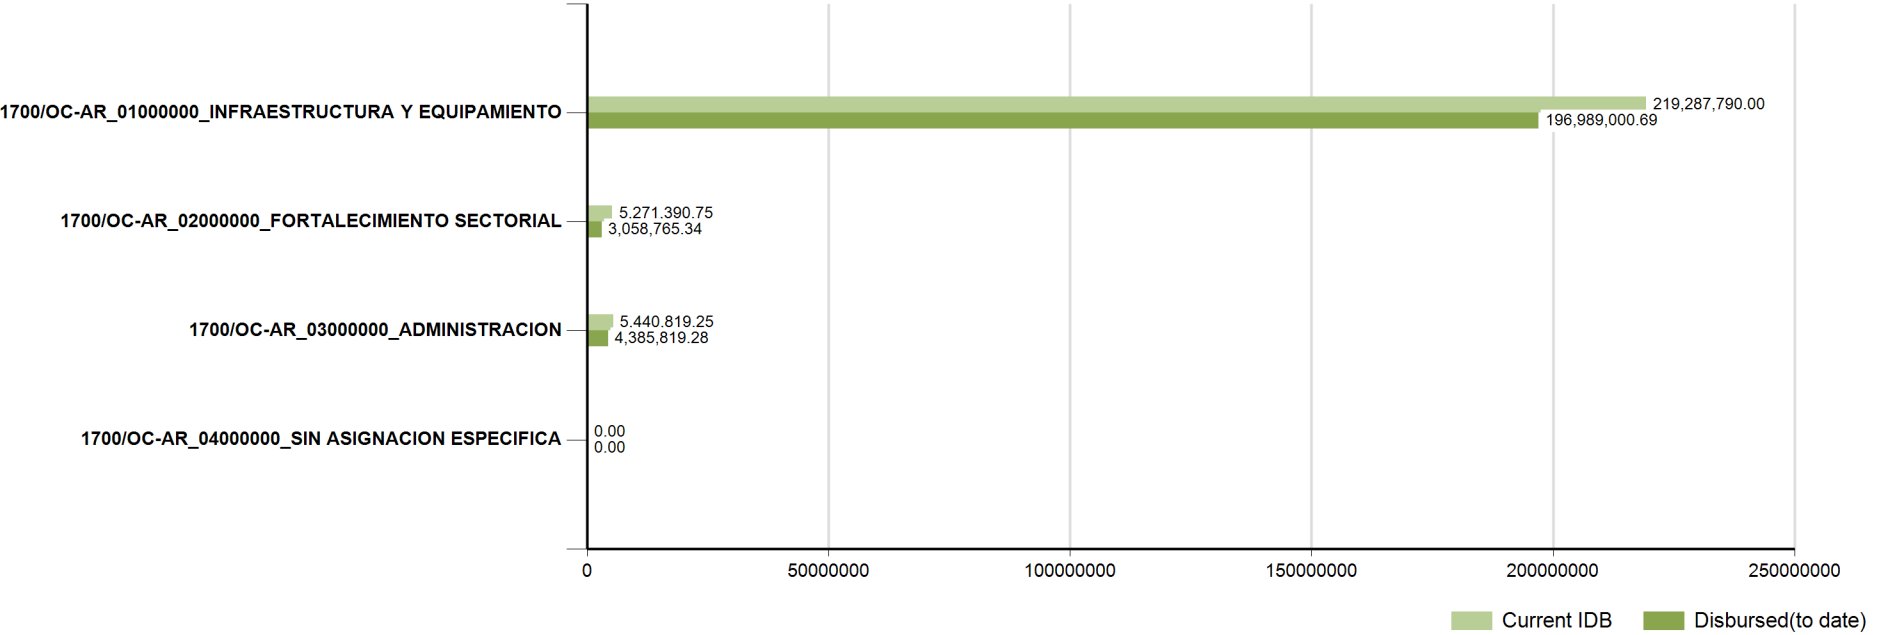

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mortalidad infantil en la Provincia de Buenos Aires reducida								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		EOP
1.1 Mortalidad de menores de 1 año en la Provincia de Buenos Aires		Muertes por mil nacidos vivos	12.40	2009	Dirección de Estadística del Ministerio de Salud		P	10.20	10.20
							P(a)	10.20	10.20
							A		

 RF - RF Indicator


 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator


 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Niveles de cobertura y calidad de los servicios de educación de la Provincia de Buenos Aires mejorados									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2014	EOP
1.1 Escuelas primarias priorizadas por el Programa cuyos profesores de 4o, 5o y 6o grado de primaria utilizan computadoras como herramienta pedagógica.		escuelas	0.00	2011	Evaluación a través de observación de aula en muestra representativa a nivel provincial.		P		1,663.00	1,663.00
							P(a)		1,663.00	1,663.00
							A			
1.2 Niños de 3 a 5 años que asisten al nivel inicial en los distritos priorizados por el Programa	 RF	Estudiantes	182,783.00	2004	Registros administrativos de la Dirección General de Educación		P	196,703.00		196,703.00
							P(a)	196,703.00		196,703.00
							A	384,931.00		
Outcome:	2 Niveles de cobertura y calidad de los servicios de desarrollo social incrementados.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2014	EOP
2.1 Población de 0 a 14 años con necesidades básicas insatisfechas en distritos priorizados cubiertos por las Unidades de Desarrollo Infantil		Porcentaje	11.53	2010	Estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social.		P		12.51	12.51
							P(a)		12.51	12.51
							A			

2.2 Niños (0 a 18) para los que se tienen que adoptar medidas de abrigo en la Provincia, como consecuencia de la vulneración de sus derechos.		Porcentaje	1.50	2010	Registros del Ministerio de Desarrollo Social.		P		0.50	0.50
	P(a)							0.50	0.50	
	A									
Outcome:	3 Niveles de cobertura y calidad de los servicios de salud de la provinica incrementados									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2014	EOP
3.1 Captación oportuna de embarazadas (antes de las 14 semanas de gestación) en la provincia.		Porcentaje	43.00	2010	Sistema Informático Perinatal (SIPA)		P		60.00	60.00
	P(a)							60.00	60.00	
	A									
3.2 Embarazadas residentes de la provincia con ciclo completo de control prenatal		Porcentaje	56.00	2010	Registros del programa materno-infantil.		P		60.00	68.00
	P(a)							60.00	68.00	
	A									
3.3 Número de consultas en Centros de Atención Primaria de la salud.		Consultas	361,500.00	2007	Registro de Atenciones en Centros de Atención Primaria de la Salud.		P		520,000.00	520,000.00
	P(a)							520,000.00	520,000.00	
	A									
3.4 Derivaciones perinatales oportunas en la Provincia.		Porcentaje	40.00	2011	Sistema Informático Perinatal.		P		70.00	70.00
	P(a)							70.00	70.00	
	A									

3.5 Personas que consultan un Centro de Atención Primaria de la Salud de la Provincia de Buenos Aires construido por el programa.	 RF				Sistema de Información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.	Este indicador se estima por razones de diseminación de resultados corporativos, a partir del indicador de consultas en centros de atención primaria de la salud.	P	0.00	130,000.00	130,000.00
							P(a)	0.00	130,000.00	130,000.00
							A	224,245.00		
		Personas	90,375.00	2012						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Infraestructura física y equipamientos en educación, salud y desarrollo social		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Jardines de infantes construidos, cumpliendo con estándares de calidad	Jardines de infantes	P		90.00	P		45,490,392.00
		P(a)	13.00	88.00	P(a)	5,186,000.00	44,124,392.00
		A	6.00	81.00	A	1,683,000.00	40,621,392.00
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) construidos (cumpliendo con estándares de calidad) y equipados	Centros de Atención Primaria de la Salud	P		31.00	P		13,392,874.00
		P(a)	3.00	27.00	P(a)	1,056,000.00	12,034,874.00
		A	3.00	27.00	A	807,000.00	11,785,874.00
Centros de salud rehabilitados cumpliendo estándares de construcción	Centros de Atención Primaria de la Salud	P		219.00	P		11,375,333.00
		P(a)		111.00	P(a)	5,687,000.00	11,395,333.00
		A		111.00	A	349,000.00	6,057,333.00
Hospitales que cuentan con equipo básico para la atención	Hospitales	P		188.00	P		29,141,996.00
		P(a)		188.00	P(a)	8,652,000.00	30,652,996.00
		A		188.00	A	3,345,000.00	25,345,996.00
Hospital materno infantil construido (cumpliendo con estándares) y equipado	Hospital	P		1.00	P		30,358,575.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,929,000.00	30,754,575.00
		A		1.00	A	502,000.00	29,327,575.00
Hospitales rehabilitados cumpliendo con estándares	Hospitales	P		10.00	P		25,098,401.00
		P(a)	4.00	11.00	P(a)	2,940,000.00	23,389,401.00
		A	3.00	10.00	A	1,846,000.00	22,295,401.00
CAPS sin intervención edilicia que cuentan con equipo básico para la atención materno-infantil	Centros de Atención Primaria de la Salud	P		135.00	P		5,357,000.00
		P(a)		135.00	P(a)		5,357,000.00
		A		135.00	A		5,357,000.00
Unidades de Atención Infantil (UDIs) construidas cumpliendo con estándares y equipadas	Unidades de Atención Infantil	P		27.00	P		15,791,038.00
		P(a)	4.00	23.00	P(a)	1,365,000.00	12,129,038.00
		A	1.00	20.00	A	1,002,000.00	11,766,038.00
UDIs previamente construidas equipadas	Unidades de Atención Infantil	P		44.00	P		1,000,000.00
		P(a)	44.00	44.00	P(a)	1,533,000.00	1,533,000.00
		A	44.00	44.00	A	0.00	0.00
Proyectos de integración deportiva.	Proyectos	P		6.00	P		1,962,000.00
		P(a)	5.00	6.00	P(a)	1,838,000.00	2,140,000.00
		A	2.00	3.00	A	1,292,000.00	1,594,000.00
Viviendas asistidas	Viviendas	P		6,000.00	P		12,000,000.00
		P(a)	200.00	4,900.00	P(a)	831,000.00	12,474,000.00
		A	200.00	4,900.00	A	486,000.00	12,129,000.00
Fortalecimiento de la gestión en la provision de servicios de educación, salud y desarrollo social		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Sistema Único de Información Sanitaria en operación (opera al menos un sistema de referencia y contrareferencia, con base en una base única de pacientes).	Sistema de información	P		1.00	P		2,112,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,978,000.00
		A		1.00	A		1,978,000.00
Regiones Sanitarias con equipos de salud con competencias desarrolladas en cuanto a procesos de gestión de servicios de salud materno-infantil.	Regiones sanitarias	P		4.00	P		1,771,000.00
		P(a)		4.00	P(a)	536,000.00	1,679,000.00
		A		4.00	A	248,000.00	1,391,000.00
Establecimientos educativos de nivel primario con aulas móviles en funcionamiento (incluye Centros de Investigación Educativa).	Laboratorios de informática	P		1,663.00	P		42,800,000.00
		P(a)	1,663.00	1,663.00	P(a)	4,070,000.00	41,812,000.00
		A	1,130.00	1,130.00	A	1,773,000.00	39,515,000.00

Efectores del Ministerio de Desarrollo Social Capacitados	Efectores	P		0.00	P		0.00
		P(a)	16,200.00	16,200.00	P(a)	385,000.00	385,000.00
		A	0.00	0.00	A	122,000.00	122,000.00
Sistema de Informacion, Seguimiento y Evaluación de programas del Ministerio de Desarrollo Social en funcionamiento (tiene la capacidad de cruzar (al menos) bases de beneficiarios de programas financiados por la Provincia).	Sistema de información	P		1.00	P		4,463,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	240,000.00	259,000.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	19,000.00
Encuesta de Hogares y Empleo realizada	Encuesta	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	650,000.00	650,000.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Informe de Evaluación del Plan Más Vida finalizada (presentada en un taller de diseminación)	Informe de evaluación	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Diseño del Proyecto Ejecutivo para la construcción Edificio Estadística	Proyecto Ejecutivo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	115,000.00	115,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración, evaluación y gastos financieros							

Other Cost		2015	Cost
Evaluación y Monitoreo	P		\$500,000.00
	P(a)	\$0.00	\$367,000.00
	A	\$5,000.00	\$372,000.00
Fortalecimiento de la Unidad de Ejecución de Proyectos Provinciales de la Provincia de Buenos Aires	P		\$4,332,000.00
	P(a)	\$918,000.00	\$5,256,796.00
	A	\$357,000.00	\$4,695,796.00
Comisión e intereses	P		\$8,199,001.00
	P(a)		\$8,199,001.00
	A		\$8,199,001.00
Prestaciones alimentarias del Plan Más Vida (contrapartida local)	P		\$79,212,594.00
	P(a)		\$79,211,594.00
	A		\$79,211,594.00
Imprevistos	P		\$7,350,000.00
	P(a)	\$2,426,000.00	\$3,650,000.00
	A	\$0.00	\$1,224,000.00
Material didáctico para Unidades de Desarrollo Infantil	P		\$0.00
	P(a)	\$453,000.00	\$453,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P		\$341,707,204.00
	P(a)	\$40,810,000.00	\$330,000,000.00
	A	\$13,817,000.00	\$303,007,000.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
