



Operation Number: **ES0074**  
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**  
Last Update: **6/25/2014**  
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **06/30/2014**  
Division Chief validation date: **06/30/2014**  
Country Representative validation date: **07/01/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Descontaminación de Areas Críticas	Loan Number:	1209/OC-ES,3/TA-ES
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Team Leader:	Estrada Regalado,Nelson Mauricio	Sector/Subsector:	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Cerrado (Todos los préstamos están cerrados)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR ,REPUBLICA DE EL SALVADOR		Convergence related Operation(s):

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES0074	\$37,482,000.00	\$29,561,718.65	-\$6,692,000.00	\$15,400,000.00	\$38,490,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES0074	\$29,561,718.65	\$29,561,718.65	100.00%	\$0.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

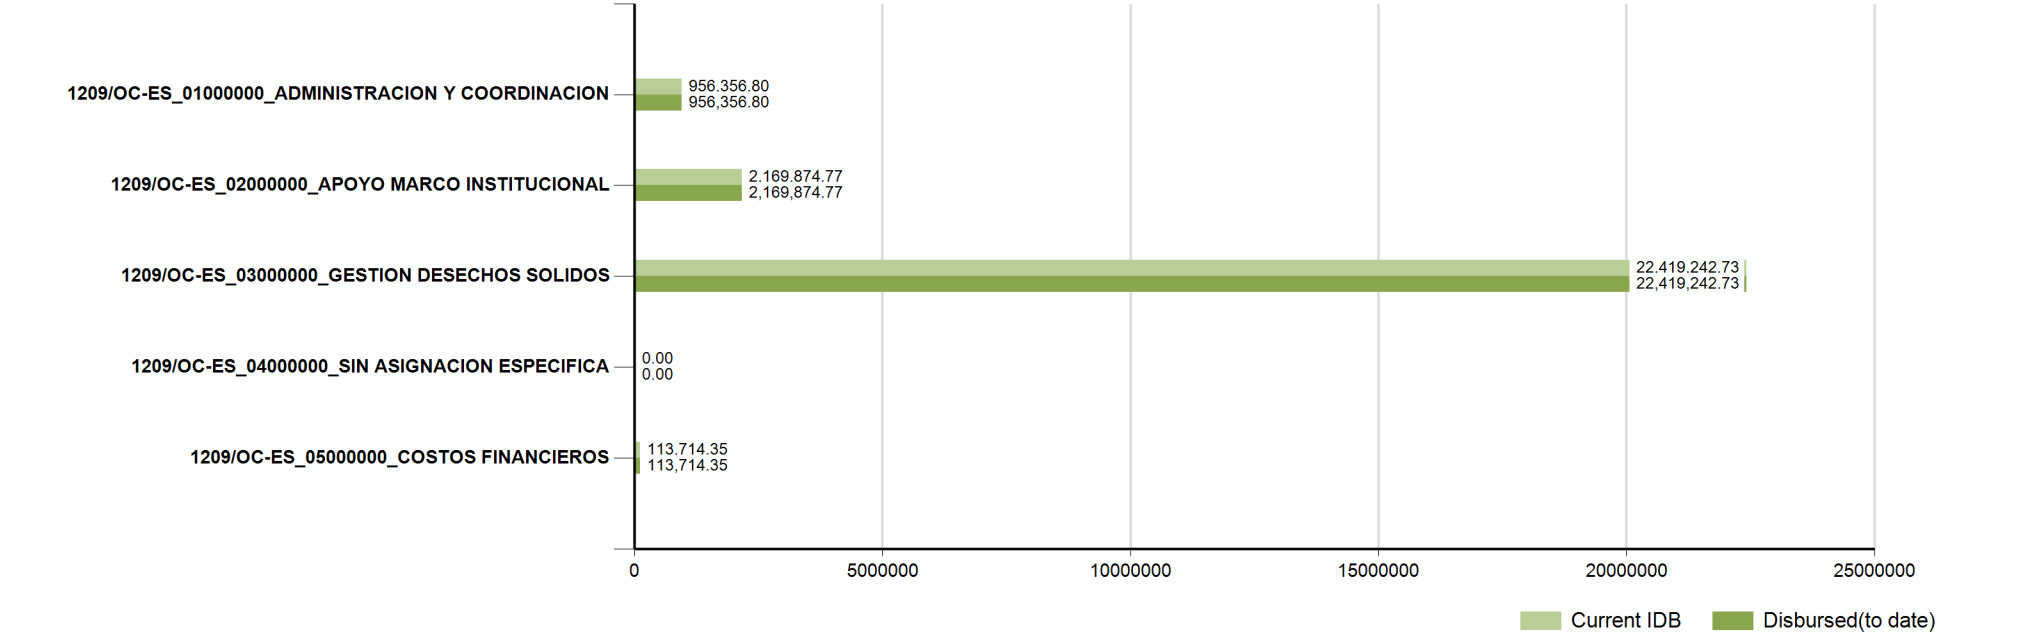

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Marco Regulatorio ambiental fortalecido al final del proyecto.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	EOP
1.1 Los índices de calidad ambiental en los sectores críticos agua, aire, Desechos Peligrosos y Desechos Sólidos Municipales, establecidos y mejorados en un 20% al final de la ejecución del Proyecto en relación con la línea base levantada al inicio del mism		%	0.00	2001	Informes anuales del Ministerio de Medio ambiente - Anuario "Medio Ambiente en cifras"	La línea base es cero. % se refiere a la mejora porcentual en los indicadores seleccionados con relación a la línea base levantada en Diciembre de 2001	P			
							P(a)	20.00	20.00	20.00
							A	5.00	0.00	
Outcome:	2 Gestión Integral de Desechos Sólidos municipales mejorada									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	EOP
2.1 Cobertura de recolección y disposición final adecuada de desechos de los municipios beneficiados con el proyecto		%	0.00	2001	Publicacion de indicadores ambientales MARN / Encuesta anual de Hogares de propósitos múltiples - Censos / Informes semestrales de avance	línea base es cero.	P			
							P(a)	80.00	80.00	80.00
							A	80.00	80.00	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

I. Apoyo al Marco Regulatorio Ambiental		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Marco Regulatorio para la Calidad del Aire elaborado	Marco regulatorio	P		P	
		P(a)	1.00	P(a)	768,000.00
		A	1.00	A	768,000.00
Marco regulatorio calidad del agua elaborado	Marco regulatorio	P		P	
		P(a)	1.00	P(a)	897,601.00
		A	1.00	A	897,601.00
Marco regulatorio desechos sólidos peligrosos y municipales elaborado	Marco regulatorio	P		P	
		P(a)	1.00	P(a)	442,456.00
		A	1.00	A	442,456.00
II. Apoyo a la Gestión de Desechos Sólidos Municipales		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Asistencia Técnica Municipal, Educación y Fortalecimiento Institucional, desarrollada e implementada	consultorias	P		P	
		P(a)	19.00	P(a)	1,119,729.00
		A	19.00	A	1,119,729.00
Proyectos de disposición final de desechos sólidos municipales construidos o mejorados	Proyectos	P		P	
		P(a)	6.00	P(a)	4,184,335.00
		A	6.00	A	4,184,335.00
Protectos Piloto de compostaje ejecutados	Proyectos	P		P	
		P(a)	22.00	P(a)	952,097.00
		A	22.00	A	952,097.00
Botaderos con Cierre Técnico implementado al final del programa	Botaderos	P		P	
		P(a)	18.00	P(a)	1,882,202.00
		A	18.00	A	1,882,202.00
Obras de emergencia ejecutadas	Proyectos	P		P	
		P(a)	2.00	P(a)	13,828,000.00
		A	2.00	A	13,828,000.00
Administración y Coordinación					
Costos Financieros					
Other Cost					
Administración y Coordinación				P	
				P(a)	\$956,356.00
				A	\$956,356.00
Auditorias externas, gastos de capitalización, inspección y vigilancia e intereses				P	
				P(a)	\$3,999,564.00
				A	\$3,999,564.00
Total Cost				Total Cost	
				P	
				P(a)	\$29,030,340.00
				A	\$29,030,340.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
