



Operation Number: **BR-L1068**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **4/2/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/16/2015**
Division Chief validation date: **05/05/2015**
Country Representative validation date: **05/09/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa Miltifase de Apoyo Desarrollo Legislativo en Brasil	Loan Number:	1864/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA ESPECIAL DO INTERLEGIS SENADO FEDERAL		
Team Leader:	Capriolo,Dino	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Cerrado (Todos los préstamos están cerrados)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1068	\$16,100,000.00	\$6,390,304.24	\$16,100,000.00	\$0.00	\$32,200,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1068	\$6,390,304.24	\$5,330,057.99	83.41%	\$1,060,246.25


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

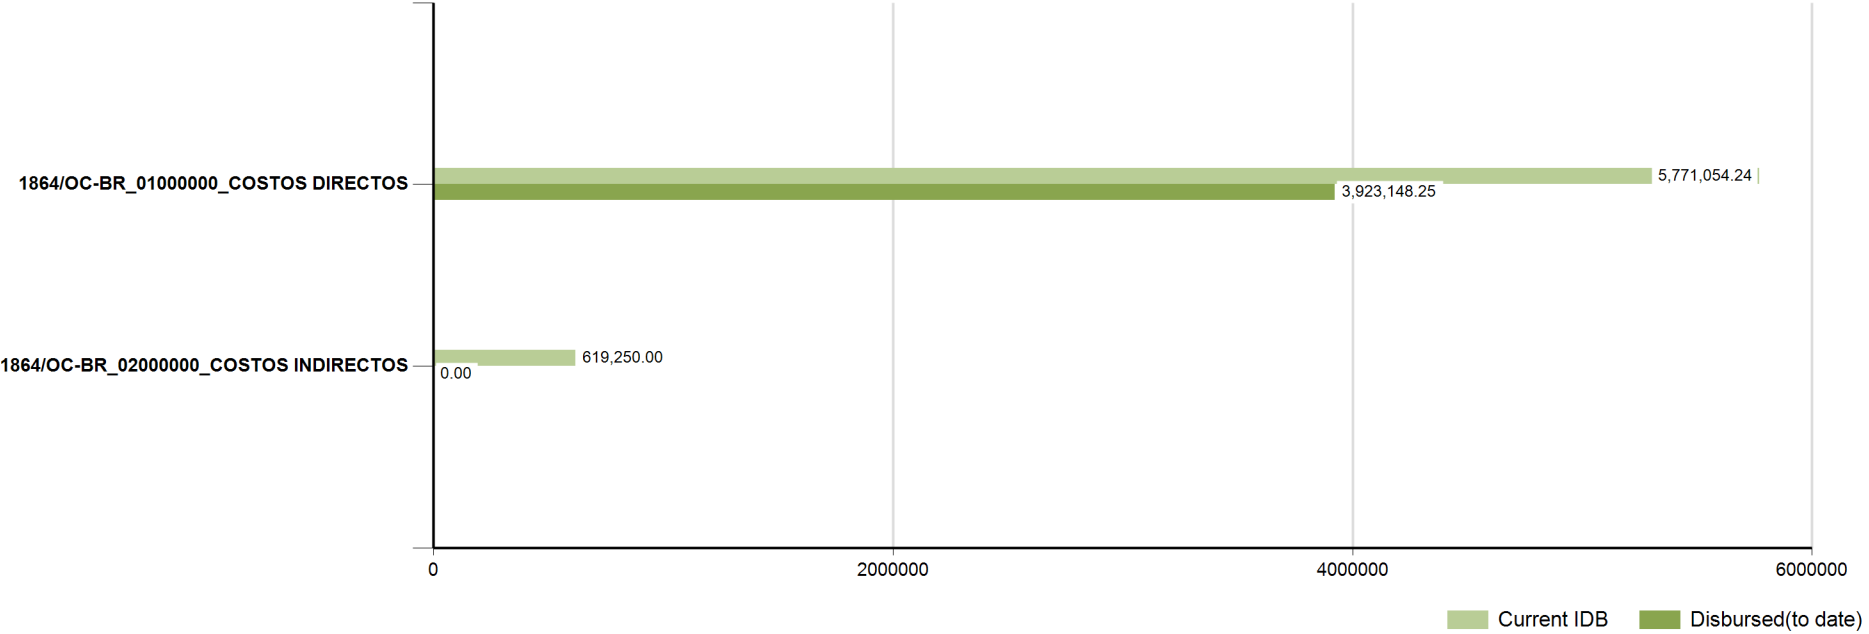

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Percepción ciudadana de la labor legislativa mejorada.							
Observation:	Segun estudio de Datafolha de 2006 la aprobación del Congreso Nacional descendió a un 42%, donde la población precibe a la labor del Congreso como malo o muy malo.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Tasa porcentual de la percepción ciudadana favorable sobre la labor legislativa		porcetaje	42.00	2006	Encuestas de medidito de percepción ciudadana sobre el desempeño del Legislativo (para 2006, Instituto de Investigación Datafolha mayo 2006).		P	60.00
							P(a)	60.00
							A	0.00

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Función Legislativa del Estado Brasileno (en sus instancias Federal, Estatal y Municipal), mejorada.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	EOP	
1.1 Intercâmbio regular de experiências entre as Casas Legislativas em quatro áreas temáticas.		comunidade virtual	0.00	2006	Registro de las Casas Legislativas en el Catastro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ)	Indicador incluido en la Matriz de Marco Logico	P		20.00	70.00	100.00	100.00	
							P(a)	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00
							A	2.00			2.00	0.00	
1.2 Casas Legislativas operam com o SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)		casa legislativa	315.00	2006	Informes Semestrais de Progresso.		P		100.00	100.00	50.00	615.00	
							P(a)		100.00	100.00	50.00	112.00	350.00
							A		147.00		91.00	0.00	
1.3 Usuários dos serviços de informação do portal INTERLEGIS incrementado.		acessos ao portal (mensal)	200,000.00	2007	Número de visitas ao portal (mensal)		P		60.00	70.00	80.00	80.00	
							P(a)		200,000.00	210,000.00	220,000.00	242,000.00	850,000.00
							A		200,000.00		751,617.00	0.00	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1. Consolidación de la Red Nacional INTERLEGIS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Casas Municipais conectadas à Rede Nacional do INTERLEGIS.	Casas Municipales	P		1,000.00	P		3,584,976.40
		P(a)	833.00	1,318.01	P(a)	265.00	2,903,840.79
		A	838.00	1,318.01	A	979,649.78	2,903,840.79
Productos de información legislativa asociado a seis Marcos Jurídicos (2 por año) e investigación (4 investigaciones, 2 por año) desarrollados.	Productos	P		20.00	P		166,870.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Sistema de apoyo a la función fiscalizadora, administrativa y legislativa implantado.	Sistemas	P		2.00	P		3,288,000.00
		P(a)	2.00	10.01	P(a)	802.00	722,226.34
		A	2.00	10.01	A	0.00	722,226.34
Manuales de procedimiento a partir de buenas prácticas en materia legislativa y bases de datos desarrollados.	Manuales	P		5.00	P		855,128.88
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Comunidades virtuales de práctica legislativa implantadas.	Comunidades Virtuales	P		4.00	P		720,000.00
		P(a)	0.00	4.01	P(a)	0.00	360,000.01
		A	0.00	4.01	A	0.00	360,000.01
Técnicos de las Casas Legislativas que integran la actual Red INTERLEGIS capacitados.	Técnicos	P		20,000.00	P		3,944,912.00
		P(a)	0.00	45,791.00	P(a)	0.00	420,522.00
		A	0.00	45,791.00	A	0.00	420,522.00
Censo Legislativo brasileño actualizado.	Censo	P		1.00	P		1,404,778.81
		P(a)	1.00	1.01	P(a)	125.00	0.01
		A	1.00	1.01	A	0.00	0.01
2. Modernización de las Casas Legislativas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Metodología de trabajo de INTERLEGIS adotada en las Casas Legislativas Municipales.	Casas Legislativas	P		352.00	P		11,133,481.77
		P(a)	114.00	385.00	P(a)	600.00	4,214,085.44
		A	147.00	385.00	A	655,866.23	4,214,085.44
600 parlamentarios y 3.000 funcionarios del Congreso hacen uso de las soluciones desarrolladas en Gestión del Conocimiento, participan de la Red de Práctica e Inteligencia, participan de las soluciones desarrolladas en materia de transparencia y part	Parlamentarios y funcionarios	P		3,600.00	P		3,900,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Asesoría técnica parlamentaria y de las secretarías técnicas de las comisiones legislativas apoyadas/fortalecidas y Altos Estudios Legislativos desarrollados.	Estudios	P		8.00	P		481,274.40
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
3. Fortalecimiento Institucional de INTERLEGIS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Escritório de Projeto implantado, incluindo o sitema de monitoramento e acompanhamento.	Escritorio	P		2.00	P		1,414,817.88
		P(a)	1.00	2.01	P(a)	88.00	1,817.89
		A	1.00	2.01	A	0.00	1,817.89
Estructura gerencial del Programa, con una alta especialización técnica, independencia, capacidad de seguimiento y evaluación, modernizada/estruturada - Escritorio de Proyectos implantado.	Escritorio	P		1.00	P		174,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00

Usuarios de los servicios de información del Portal INTERLEGIS acrescido en 10%.	Usuários	P		3,410.00	P		180,000.00
		P(a)		0.01	P(a)		0.01
		A		0.01	A		0.01
Personal integrante de INTERLEGIS capacitados.	Personas	P		100.00	P		344,512.85
		P(a)		30.01	P(a)	0.00	20,389.99
		A	0.00	30.01	A	0.00	20,389.99
Infraestructura Tecnologica del Programa Interlegis actualizada	Equipamentos	P		24.00	P		1,200,000.00
		P(a)	4.00	15.00	P(a)	2,750,000.00	421,948.00
		A	4.00	15.00	A	0.00	421,948.00
4. Fortalecimiento de la Red de Parlamentarios y Cooperación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Eventos nacionales, seminarios locales y regionales para la integración de las Casas Legislativas realizados.	Eventos	P		20.00	P		254,313.64
		P(a)	3.00	38.01	P(a)	73.00	61,452.15
		A	4.00	38.01	A	7,042.82	61,452.15
Proyectos de apoyo a la Red de Parlamentarios diseñados e implantados.	Proyectos	P		10.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Parlamentarios del Congreso Nacional y entidades parlamentarias participan del networking.	Parlamentarios	P		167.00	P		294,688.00
		P(a)		0.01	P(a)		0.01
		A		0.01	A		0.01
Actividades para promover la cooperación técnica internacional entre Parlamentos realizadas.	Reuniones	P		2.00	P		125,895.00
		P(a)		0.01	P(a)		0.01
		A		0.01	A		0.01
5. Otros							

Other Cost		2014	Cost
Administración	P		\$1,399,859.00
	P(a)	\$0.00	\$116,179.26
	A	\$24,791.65	\$116,179.26
Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$34,867,508.63
	P(a)	\$2,751,953.00	\$10,327,064.43
	A	\$1,667,350.48	\$9,242,461.91

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto	Eventos nacionales, seminarios locales y regionales para la integración de las Casas Legislativas realizados.	Modify Financial P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta financeira.	3/26/2015	4/2/2015
Producto	Metodología de trabajo de INTERLEGIS adotada en las Casas Legislativas Municipales.	Modify Financial P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta financeira.	3/26/2015	4/2/2015
Producto	Casas Municipais conectadas à Rede Nacional do INTERLEGIS.	Modify Financial P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta financeira.	3/26/2015	4/2/2015
Producto	Infraestrutura Tecnologica del Programa Interlegis actualizada	Modify Financial P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta financeira.	3/26/2015	4/2/2015
Producto	Escritório de Projeto implantado, incluindo o sistema de monitoramento e acompanhamento.	Modify Financial P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta financeira.	3/26/2015	4/2/2015

Producto	Censo Legislativo brasileño actualizado.	Modify Financial P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta financeira.	3/26/2015	4/2/2015
Producto	Sistema de apoyo a la función fiscalizadora, administrativa y legislativa implantado.	Modify Financial P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta financeira.	3/26/2015	4/2/2015
Producto	Eventos nacionales, seminarios locales y regionales para la integración de las Casas Legislativas realizados.	Modify Physical P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta física.	3/26/2015	4/2/2015
Producto	Metodología de trabajo de INTERLEGIS adotada en las Casas Legislativas Municipales.	Modify Physical P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta física.	3/26/2015	4/2/2015
Producto	Casas Municipais conectadas à Rede Nacional do INTERLEGIS.	Modify Physical P(a) value	Apenas reportado o progresso da meta física.	3/26/2015	4/2/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
