



Operation Number: **PR0146**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/26/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/28/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **11/11/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthening the Judiciary System	Loan Number:	1723/OC-PR,1723/OC-PR-DE
Executing Agency (EA):	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ,CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		
Team Leader:	Theinhardt,Jean Eric	Sector/Subsector:	MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PARAGUAY
Borrower:	REPUBLICA DE PARAGUAY ,REPUBLICA DE PARAGUAY		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PR0146	\$6,305,000.00	\$6,305,000.00	\$2,513,000.00	\$0.00	\$8,818,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PR0146	\$6,305,000.00	\$1,939,447.28	30.76%	\$4,365,552.72


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

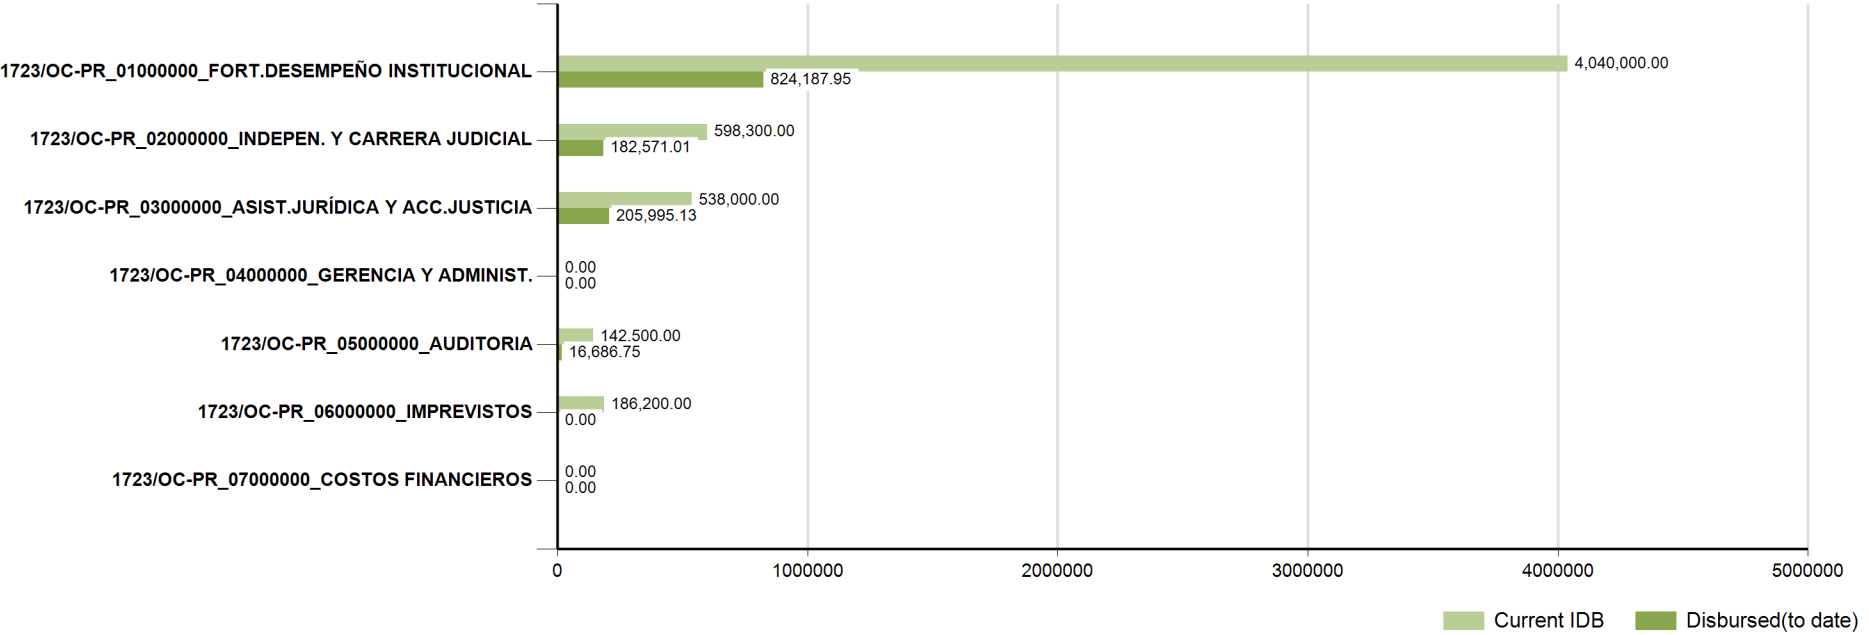

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Sistema de Justicia más confiable e independiente.						
Observation:	Las instituciones del sistema de justicia que cuentan con el apoyo del programa son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de la Defensa Pública.						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP
1.1 Nivel de percepción sobre la confianza de la ciudadanía paraguaya hacia el sistema de justicia.		Indice de percepción de confianza.	20.00	2004	Informe Anual Organización Latino Barómetro.		P30.00
							P(a)30.00
							A

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2012	2013	2014	2015	EOP	
1.1 Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelación y Salas de la Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestión Jurisdiccional.		Porcentaje de Juzgados	42.00	2008	Sistema de Gestión Jurisdiccional - SGJ.		P		50.00		60.00		70.00
							P(a)		50.00		60.00		70.00
							A		22.00				
1.2 Duración media de tiempos procesales en órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional en el fuero Civil de Asunción.		Años	3.80	2008	Estudio comparativo o duración media tiempos procesos jurisdiccionales, elaborado por la Corte Suprema de Justicia.		P		2.60	2.00		1.60	
							P(a)		2.60	2.00		1.60	
							A		2.50	2.00			

1.3 Stock de causas pendientes en despachos de órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional.		Causas	29,982.00	2009	Informes estadísticos vinculados y generados a partir del análisis de los datos del Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia.		P			23,985.00			23,985.00
							P(a)			23,985.00			23,985.00
							A			21,341.00			

Outcome:

2 Gestión del Sistema de Justicia mejorada.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2012	2013	2014	2015	EOP
2.1 Sistema de selección de ministros, jueces, fiscales y defensores públicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la Magistratura.		Sistema	0.00	2008	Informe de evaluación intermedia del programa.		P		1.00				1.00
	P(a)							1.00				1.00	
	A							1.00					
2.2 Nuevo modelo de gestión académica instalado para la capacitación de los postulantes de la Escuela Judicial (EJ).		Modelo de gestión.	0.00	2008	Informe de evaluación intermedia del programa.		P		1.00				1.00
	P(a)							1.00				1.00	
	A												
2.2 Causas concluidas a traves de la creacion, implementacion , de mecanismos alternativos de conclusión del proceso penal.		Causas	218.00	2013	Evaluación final del programa		P						
	P(a)										348.00	348.00	
	A												

Outcome:

3 Acceso a la justicia mejorados.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2012	2013	2014	2015	EOP
3.1 Defensores públicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestión de la Defensa Pública - SGDP.		Defensores	0.00	2008	Informe sobre funcionamiento del Sistema de Gestión de la Defensa Pública.		P			20.00		54.00
							P(a)			20.00	20.00	54.00
							A					
3.2 Defensores Públicos capacitados utilizan el Sistema de Gestión de la Defensa Pública SGDP.		Defensores	0.00	2008	Informe del Ministerio de la Defensa Pública.		P			20.00	34.00	54.00
							P(a)			20.00	20.00	54.00
							A					
3.3 Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos implementados (técnicas de conciliación y mediación - facilitadores judiciales).		Juzgados	25.00	2008	Informe final del programa elaborado por la Corte Suprema de Justicia.		P					190.00
							P(a)			50.00	140.00	190.00
							A					
3.4 Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexión técnica para el enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.		Centros P.	0.00	2008	Informe sobre interconexiones técnicas del Sistema de Gestión y Control Penitenciario.		P					3.00
							P(a)				3.00	3.00
							A					
3.5 Mecanismos para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, diseñados e implementados (100 Reglas de Brasilia)		Mecanismos	3.00	2013	Evaluación final del programa		P					
							P(a)				2.00	2.00
							A					
3.6 Personas en condición de vulnerabilidad acceden a la justicia a través de mecanismos establecidos		Personas	120.00	2013	Evaluación final del programa		P					
							P(a)				500.00	500.00
							A					

3.6 Unidad de Mediacion creada, estructurada y fortalecida operando em circunscripciones		Unidades de Mediacion	10.00	2013	Evaluación Final Independiente		P						
							P(a)					3.00	3.00
							A						

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento del Desempeño Institucional.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Propuesta de racionalizacion de ingresos judiciales implementada	Propuesta	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	110,104.00	355,757.00
		A	0.00	0.00	A	62,962.18	308,615.18
Diseño de Propuesta Metodologica de Sistematizacion de procesos de trabajo del Servicio de Asistencia Social.	Diseño	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	9,000.00	24,000.00
		A		0.00	A		0.00
Diseño de Propuesta Metodologica de Sistematizacion de procesos para Asesoría de Prueba.	Diseño	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	18,000.00	30,000.00
		A		0.00	A		0.00
Procedimientos de mecanismos alternativos de conclusion del proceso penal, elaborados.	procedimientos de trabajo	P		0.00	P		0.00
		P(a)		2.00	P(a)	24,000.00	30,000.00
		A		0.00	A		0.00
Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, Remate Judiciales (1 por circunscripción) operando	Unidades de Servicios	P		0.00	P		0.00
		P(a)	15.00	15.00	P(a)	90,000.00	90,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Plataforma Web para el Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia desarrollada.	Plataforma Web	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	470,869.00	855,961.00
		A		0.00	A	0.00	175,892.00
Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia implantado en Secretarías de Juzgados adicionales.	Sistemas	P		250.00	P	87,000.00	1,379,130.00
		P(a)	60.00	235.00	P(a)	48,300.00	1,503,080.00
		A	23.00	143.00	A	0.00	1,426,130.00
Módulos web del Sistema de Gestión Jurisdiccional actualizados.	Módulos	P		2.00	P		99,840.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	15,840.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	15,840.00
Marcos normativos impulsados.	Proyectos de Leyes	P		5.00	P		124,290.00
		P(a)	2.00	5.00	P(a)	19,114.00	119,891.00
		A	0.00	3.00	A	1,077.00	101,854.00
Inventario de procesos judiciales simplificables elaborados.	Inventario	P		1.00	P		1,873,950.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	36,950.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	36,950.00
Unidad de Análisis de Estrategia (UAE) en operación.	Unidad	P		1.00	P		313,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	6,000.00	54,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Refuerzo de la independencia y apoyo a la Carrera Judicial.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Marcos normativos impulsados.	Marcos	P		1.00	P		150,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	57,000.00
		A		0.00	A		57,000.00
Sistema integral de capacitación para los agentes del sistema de justicia establecido y funcionando.	Sistema	P		0.00	P		200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	148,000.00	231,158.00
		A		0.00	A	17,000.00	58,158.00
Procesos de selección de ternas a cargo del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia fortalecidos.	Procesos	P		33.00	P		178,800.00
		P(a)	0.00	33.00	P(a)	0.00	21,800.00
		A		33.00	A	8,000.00	29,800.00

Plan Estratégico de Capacitación de la Escuela Judicial con perspectiva transversal de género diseñado y consistente con el sistema integral de capacitación operando.	Plan	P		2.00	P		287,320.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	67,320.00
		A		2.00	A		67,320.00
Reglamento de Selección de agentes del sistema de justicia (contemplando criterios técnicos, competitivos, de idoneidad, transparencia y de igualdad de género) aprobado por el CM.	Reglamento	P		1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	17,000.00
		A		1.00	A		17,000.00
Plan de Fortalecimiento Institucional desarrollado CM.	Plan	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	20,500.00	34,838.00
		A		1.00	A		14,338.00
Plan de Capacitacion y Capacitaciones del Modelo Educacion Virtual-Presencial Implementado. CM	Numero Capacitaciones	P		40.00	P		0.00
		P(a)	5.00	5.00	P(a)	5,000.00	17,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Plataforma Web para el Sistema Integral de Capacitación y Modelo Educativo Virtual - Presencial desarrollada. CM	Plataforma Web	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	50,000.00	86,900.00
		A		0.00	A	36,241.00	36,241.00
Sistema de información y gestión informatizada para el Consejo Magistratura desarrollada (DataCenter) CM	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	30,000.00	158,000.00
		A		0.00	A		0.00
INACTIVAR PRODUCTO - Carrera judicial fortalecida.	Carrera	P		1.00	P		70,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Mejora en la asistencia jurídica y en el acceso a la Justicia.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Modelo de políticas comunicacional de la CSJ elaborada e implementada	Modelo	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	64,500.00	129,000.00
		A		0.00	A		0.00
Modelo del sistema de Gestion de Despachos de Jueces de Paz y Facilitadores implementado	Modelo	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	36,000.00	174,000.00
		A		0.00	A		0.00
Propuesta de Procedimientos de Trabajo que incorporen la implementación de mecanismos de Justicia Restaurativa en el Sistema Penal de la Adolescencia presentado a la CSJ	Propuesta	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	21,000.00	36,000.00
		A		0.00	A		0.00
Plan de Acción de políticas públicas del sistema de administración de justicia desde la perspectiva de género, disenado	Plan	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	21,000.00	24,000.00
		A		0.00	A		0.00
Operadores capacitados en la perspectiva de igualdad de genero y condiciones socio-economicas.	Operadores	P		0.00	P		0.00
		P(a)		300.00	P(a)	21,000.00	36,000.00
		A		0.00	A		0.00
Metodologia para acceso efectivo a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad disenados e implementados/ Diseño técnico del Observatorio de Justicia Penal Juvenil sobre la vigencia de las garantías penales y procesales, elaborado y difundido	Diseños	P		0.00	P		0.00
		P(a)		2.00	P(a)	21,000.00	24,000.00
		A		0.00	A		0.00
Procesos de reclusos penitenciarios han sido depurados.	Procesos	P		260.00	P		57,000.00
		P(a)		40.00	P(a)		0.00
		A		40.00	A		0.00

Internos penitenciarios en los dos Centros Piloto en los que se instala el sistema (Buen Pastor y Tacumbú) tienen acceso a información sobre sus casos.	Internos	P		1,200.00	P		0.00
		P(a)		650.00	P(a)	4,000.00	42,888.00
		A		300.00	A	18,000.00	56,888.00
Jueces de Paz capacitados en las reformas legislativas Vigentes.	Jueces	P		260.00	P		0.00
		P(a)		180.00	P(a)	24,000.00	24,000.00
		A		90.00	A		0.00
Marco regulatorio de las nuevas competencias de los Jueces de Paz que impulse el uso más frecuente de medios alternativos de resolución de disputas aprobados.	Marco	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	12,000.00	12,000.00
		A		0.50	A		0.00
Plan Integral de Capacitación del Defensor que contemple la perspectiva transversal de género, aprobado.	Plan	P		1.50	P		0.00
		P(a)		0.50	P(a)		0.00
		A		0.50	A		0.00
Oficina de Servicios Comunes de Defensa Pública en funcionamiento con el Sistema de Gestión de la Defensa Pública implantado.	Oficina	P		2.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) elaborado y aprobado en 2011	Plan	P		1.00	P		956,500.00
		P(a)		1.00	P(a)		207,500.00
		A		1.00	A		207,500.00
Gerencia del Proyecto.							

Other Cost		2015	Cost
Administración, auditoría e imprevistos.	P		\$1,155,980.00
	P(a)	\$307,788.00	\$1,339,983.00
	A	\$72,617.00	\$1,009,255.00
Costos financieros (intereses y comisiones).	P		\$433,600.00
	P(a)	\$0.00	\$135,445.00
	A	\$58,667.00	\$194,112.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$87,000.00	\$7,279,410.00
	P(a)	\$1,581,175.00	\$4,684,700.18
	A	\$274,564.18	\$3,812,893.18

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
