



Operation Profile			
Basic Data			
Operation name:	Fiscal Consolidation Program for Guatemala	Loan Number:	2764/OC-GU; 2765/BL-GU
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		
Team Leader:	Lora Rocha,Oscar	Sector/Subsector:	DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Operation Type:	LON - Loan Operation	Overall Stage:	INACTIVE (Closed (All the loans are closed).)
Lending Instrument:	HYB - Hybrid Operation	Country:	Guatemala
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA	Convergence related Operation(s):	
Operation Objective:			

Events Data	
Supervision	
Signature	11-Dec-13
Ratification	
Legal effectiveness	11-Dec-13
Total Eligibility	09-Jun-14
Partial Eligibility	29-May-14
First Disbursement	02-Jun-14
Original Disbursement Expiration	11-Dec-16
Current Disbursement Expiration	11-Dec-17
Preparation	
On pipeline	18-Aug-10
Start date	24-Jan-11
ERM	26-May-11
PP Approved	
POD Approved	
DLP Approved by OPC	06-Oct-11
Negotiation	
Operation Approved	29-Aug-12


Total Cost and Source				
	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country
GU-L1064	\$237,200,000.00	\$237,200,000.00	\$0.00	\$0.00
				Total operation cost - Original Estimate
				\$237,200,000.00

Development Effectiveness Matrix		
	GU-L1064	
Economic Analysis		
Undefined	Yes	
Cost benefit analysis		
Cost effectiveness analysis		
General economic analysis (Economic rate of return)		
Evaluation		
Undefined	Yes	
Random assignment		
Non-experimental method		
Ex-post cost benefit analysis		
Ex-post cost effectiveness analysis		
Before/after or With/without comparison		
Reformulation Information		
	Main Operation	Oper. GU-L1064
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO	NO
Date of approval:		

Available Funds (US\$)				
	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
Aggregated	\$237200000.00	234320000.00	98.79%	\$2880000.00
	\$0.00	\$0.00		\$0.00
GU-L1064	\$237,200,000.00	\$234,320,000.00	\$0.99	\$2,880,000.00

Environmental and Social Safeguards	
	Main Operation
Impacts Category:	
Risk:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

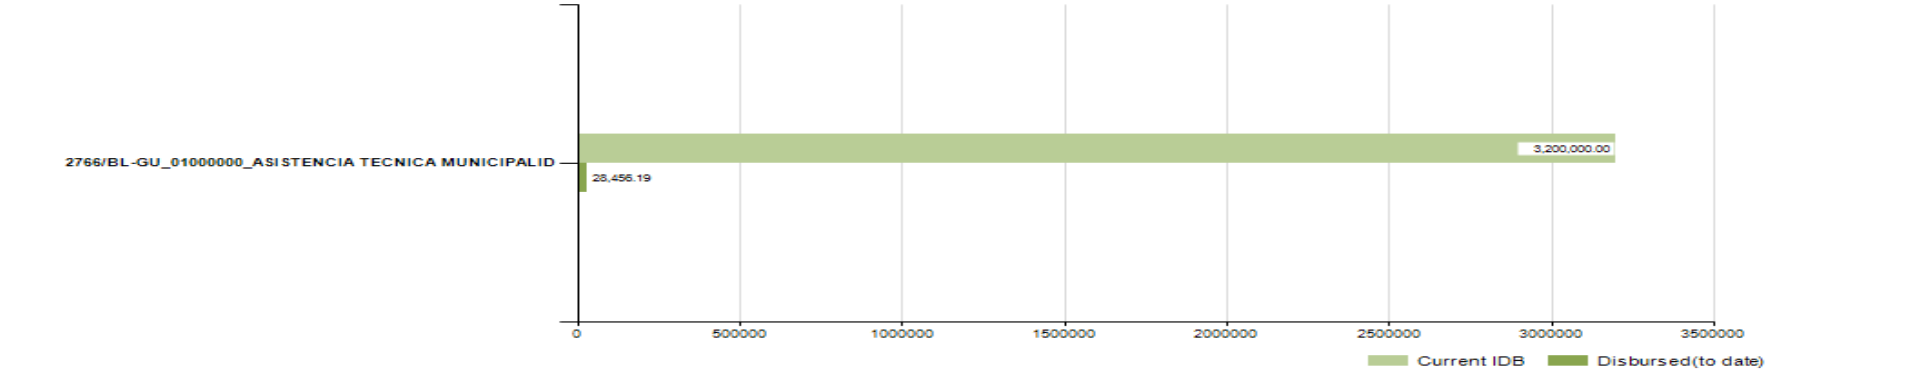

Result Matrix

Impacts	
Impact:	1 Aumentar la capacidad de invertir en temas de infraestructura y lucha contra la pobreza
Observation:	
Impact:	2 Aumentar sostenibilidad fiscal municipal para aumentar la cantidad y calidad de la inversion publica municipal
Observation:	

RF - Contribution

SI - Sector Indicator

RF - Alignment

CI - Country Indicator

RF - Strategic Alignment

PG - Pro-Gender

RF - Strategic Alignment during Execution

PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Resultado fiscal del gobierno central es -2,1% del PIB
Observation:	
Outcome:	2 Aumento de la recaudacion anualizada de al menos 0,3% del PIB
Observation:	
Outcome:	3 Aumento de la recaudacion total con las reformas totalmente implementadas del 1,3% del PIB
Observation:	
Outcome:	4 Baja en el indicador de Deuda Total Municipal sobre Ingresos Propios para 2012 hasta 85%
Observation:	
Outcome:	5 Reasignacion de rubros presupuestarios hacia materiales y suministros en el Programa de Fomento de la Salud y Medicina Preventiva: Servicios personales 21% del Total del Programa; Servicios No Personales 19% del Total del Progr; Materiales y Suministros 5
Observation:	

RF - Contribution

SI - Sector Indicator

RF - Alignment

CI - Country Indicator

RF - Strategic Alignment

PG - Pro-Gender

RF - Strategic Alignment during Execution

PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Reformas Tributarias y Medidas Anti evasion		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP		2015	EOP	
Entrada en vigencia de la Ley de Actualizacion Tributaria y su acuerdo gubernativo correspondiente	Decreto 10-2012	P	2.00		P	0.00	
		P(a)	0.00		P(a)	0.00	
		A	2.00		A	0.00	
1 Departamento de Tribuacion Internacional (UTI) en el Vice-Ministerio de Ingresos	Departamento de Tribuacion Internacional	P	2.00		P	0.00	
		P(a)	0.00		P(a)	0.00	
		A	2.00		A	0.00	
12 convenios firmados	Convenios de intercambio de informacion fiscal o equivalente	P	27.00		P	0.00	
		P(a)	0.00		P(a)	0.00	
		A	27.00		A	0.00	
Entrada en vigencia de Ley para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudacion y al contrabando	Ley	P	1.00		P	0.00	
		P(a)	0.00		P(a)	0.00	
		A	1.00		A	0.00	
1 Reglamento publicado y puesto en vigencia	Reglamentacion de la Ley de actualizacion tributaria	P	1.00		P	0.00	
		P(a)	0.00		P(a)	0.00	
		A	1.00		A	0.00	
Regulacion de las finanzas municipales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015	EOP		2015	EOP	

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.

Direccion creada e implementada	Direccion de Asistencia a la Administracion Financiera municipal (DAAFIM) en el MINFIN	P		2.00	P		21,425.00	
		P(a)		0.00	P(a)		0.00	
		A		2.00	A		21,425.00	
1 Normativa elaborada e implementada apoyada por el Manual de procedimientos	Normativa y manual	P		2.00	P		12,000.00	
		P(a)		0.00	P(a)		0.00	
		A		2.00	A		12,000.00	
1 normativa y manuales de procedimientos implementados	Normas y manuales de procedimientos de las areas de credito y cartera de la direccion administrativa y financiera del INFOM	P		1.00	P		80,000.00	
		P(a)		1.00	P(a)		0.00	
		A		1.00	A		80,000.00	
1 Manual implementado	Metodologia para cuantificar el stock de la deuda municipal	P		1.00	P		47,500.00	
		P(a)		0.00	P(a)		0.00	
		A		1.00	A		47,500.00	
Programacin fiscal de mediano plazo y gestion por resultados		Physical Progress			Financial Progress			
Outputs		Unit of Measure		2015	EOP	2015	EOP	
1 Informe PEFA actualizado	Actualizacion del informe PEFA	P		1.00		P		0.00
		P(a)		1.00		P(a)		0.00
		A		1.00		A		0.00
Marco de politica fiscal de mediano plazo, que incluya datos y lineamientos de deuda nacional y municipal, publicado en la pagina web del MINFIN como parte de la preparacion de la ley de presupuesto para el año 2014	Marco de politica fiscal de mediano plazo (3 anyos) elaborado	P		0.00		P		0.00
		P(a)		1.00		P(a)		0.00
		A		0.00		A		0.00
Fortalecimiento de las funciones de regulacion, coordinacion y planificacion del MINFIN		Physical Progress			Financial Progress			
Outputs		Unit of Measure		2015	EOP	2015	EOP	
Técnicos de la DAAFIM capacitados en el desarrollo de indicadores de solvencia financiera municipal	Técnicos capacitados	P		9.00		P		2,500.00
		P(a)	9.00	9.00		P(a)		0.00
		A		0.00		A		2,500.00
Técnicos de la unidad de crédito y gestión de cartera del INFOM capacitados en análisis costo-beneficio de inversiones	Técnicos capacitados	P		30.00		P		2,500.00
		P(a)	30.00	30.00		P(a)		0.00
		A		0.00		A		2,500.00
Cuadros de Mando integral Implementados	Sistema Informatico	P		0.00		P		0.00
		P(a)		1.00		P(a)		251,300.00
		A		0.00		A	\$2,280.09	2,280.09
Portal de consultas de la información financiera municipal disponible para el INFOM	Portal	P		0.00		P		0.00
		P(a)		1.00		P(a)		89,850.00
		A		0.00		A	\$0.00	0.00
DAAFIM con equipo informático en funcionamiento	Lote	P		0.00		P		0.00
		P(a)		1.00		P(a)		183,000.00
		A		0.00		A		0.00
Eventos de capacitación personal DAAFIM	Numero de Eventos	P		0.00		P		0.00
		P(a)		6.00		P(a)		50,000.00
		A	1.00	1.00		A	\$28,343.66	28,343.66
Funcionarios Graduados en la Maestría de Finanzas Municipales	Numero de Funcionarios	P		0.00		P		0.00
		P(a)		30.00		P(a)		276,000.00
		A		0.00		A	\$5,949.95	5,949.95
Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur		Physical Progress			Financial Progress			
Outputs		Unit of Measure		2015	EOP	2015	EOP	
Técnicos municipales capacitados en fortalecimiento fiscal, financiero y tarifario por la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFIM)	Técnicos municipales	P	0.00	15.00		P		0.00
		P(a)	15.00	15.00		P(a)		0.00
		A		0.00		A		0.00
Elaboración de Estudios de Preinversión	Estudios	P		0.00		P		0.00
		P(a)		3.00		P(a)		802,400.00

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.

		A		0.00	A	\$2,287.32	2,287.32
MGCS con equipo informático en funcionamiento	Lote	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		276,200.00
		A		0.00	A	\$1,143.03	1,143.03
Funcionarios graduados en la Maestría de Finanzas Municipales	Numero de Funcionarios	P		0.00	P		0.00
		P(a)		14.00	P(a)		100,000.00
		A		0.00	A		0.00
Fortalecimiento de la Capacidad Técnica del INFOM		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Propuesta de nuevo rol del INFOM elaborado	Propuesta	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		709,000.00
		A		0.00	A	\$27,780.23	27,780.23
INFOM con equipo informático en funcionamiento	Lote	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		215,000.00
		A		0.00	A		0.00
Funcionarios Graduados en la Maestría de Finanzas Municipales	Numero de Funcionarios	P		0.00	P		0.00
		P(a)		16.00	P(a)		70,000.00
		A		0.00	A		0.00

Other Cost			2015	Cost
Unidad de Coordinación del Programa		P		
		P(a)		177,250.00
		A	\$33,453.00	\$33,453.00

Total Cost			2015	Total Cost
		P		\$165,925.00
		P(a)		\$3,200,000.00
		A	\$101,237.28	\$267,162.28

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Técnicos municipales capacitados en fortalecimiento fiscal, financiero y tarifario por la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFIM)	Inactivate Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015.	10-Apr-16	5/7/2015
Output	Técnicos de la unidad de crédito y gestión de cartera del INFOM capacitados en análisis costo-beneficio de inversiones	Inactivate Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue inactivado por no figurar dentro de la nueva MR acordada.	10-Apr-16	5/7/2015

Output	Técnicos de la DAAFIM capacitados en el desarrollo de indicadores de solvencia financiera municipal	Inactivate Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue inactivado por no figurar dentro de la nueva MR acordada.	10-Apr-16	5/7/2015
Output	Fortalecimiento de la Capacidad Técnica del INFOM	Create Component	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Funcionarios Graduados en la Maestría de Finanzas Municipales	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	INFOM con equipo informático en funcionamiento	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.

Output	Propuesta de nuevo rol del INFOM elaborado	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Funcionarios graduados en la Maestría de Finanzas Municipales	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	MGCS con equipo informático en funcionamiento	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Elaboración de Estudios de Preinversión	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.

Output	Funcionarios Graduados en la Maestría de Finanzas Municipales	Modify Unit of Measure	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur	Modify Component Name	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Funcionarios Graduados en la Maestría de Finanzas Municipales	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Eventos de capacitación personal DAAFIM	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.

Output	DAAFIM con equipo informático en funcionamiento	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Portal de consultas de la información financiera municipal disponible para el INFOM	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Cuadros de Mando integral Implementados	Create Output	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015
Output	Fortalecimiento de las funciones de regulacion, coordinacion y planificacion del MINFIN	Modify Component Name	En mayo de 2015 fue acordada una nueva MR entre el Banco y el Ejecutor (ver referencia en el informe semestral de progreso-IBDOCS 39820853). Por tratarse de una operación híbrida, la presente operación ha sido recientemente creada en Convergencia para reportar los avances en la ejecución del componente de cooperación técnica reembolsable del Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala (GU-L1064). Por esta razón, el equipo de proyecto introduce los nuevos productos en este ciclo del PMR, no pudiendo por tanto reportar la planificación 2015. En este caso, el producto fue incluido al ser parte de la nueva MR acordada.	30-Mar-16	5/7/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
