



Operation Number: **BO-L1067**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/20/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/24/2014**
Country Representative validation date: **06/25/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi	Loan Number:	2614/BL-BO,2614/BL-BO-1,2614/BL-BO-2
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA,MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA,FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL		
Team Leader:	Buscarons Cuesta,Luis	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BOLIVIA
Borrower:	REPUBLICA DE BOLIVIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BO-L1067	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$7,270,000.00	\$0.00	\$42,270,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BO-L1067	\$35,000,000.00	\$1,013,556.85	2.90%	\$33,986,443.15


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

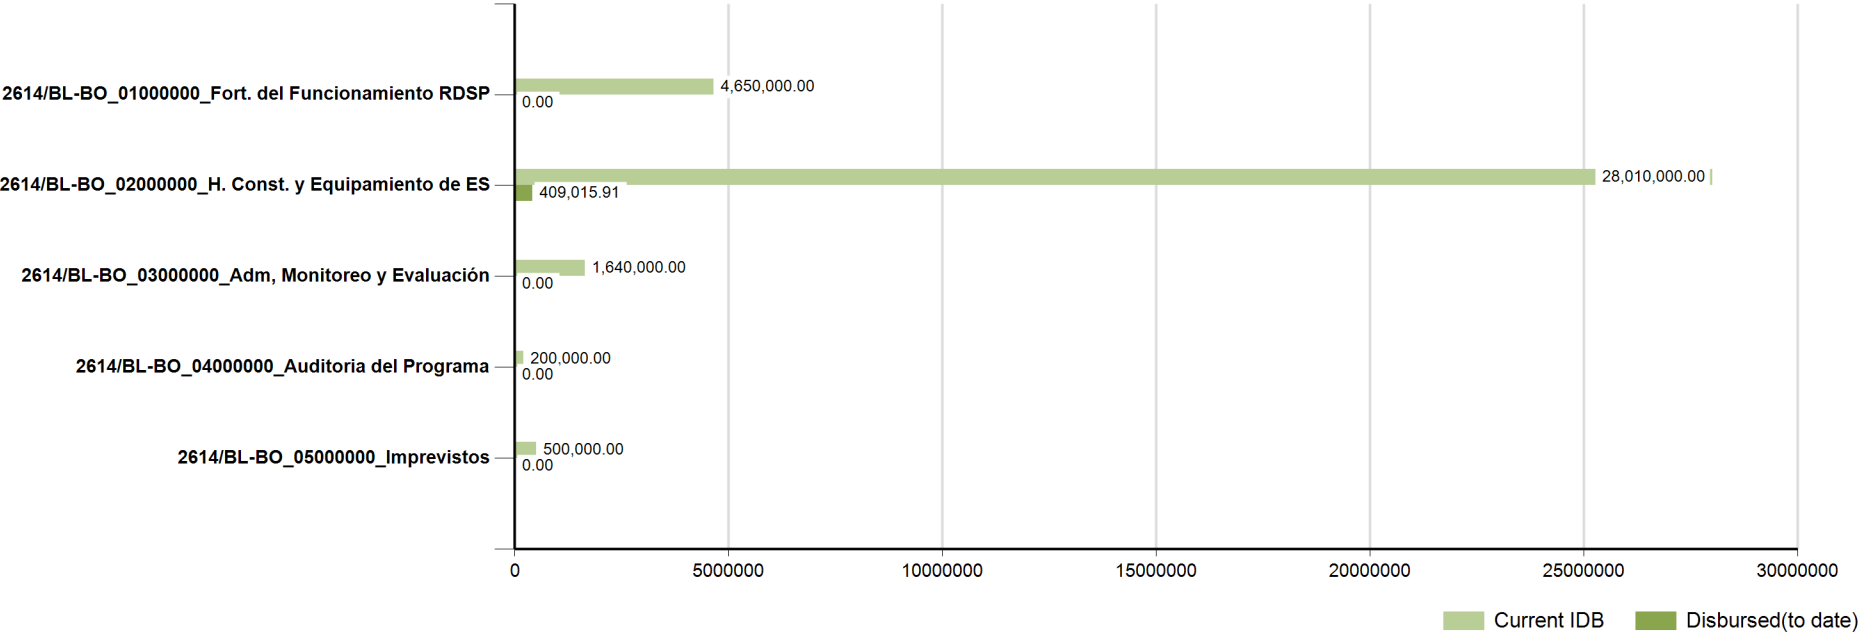

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mortalidad materno infantil en el Departamento de Potosi reducida							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Tasa de mortalidad infantil por 1000 NV		por 1000 NV	50.00	2003	Encuesta Nacional de Demografia y Salud	Existe discrepancias entre las cifras nacionales e internacionales para este indicador, siendo los internacionales en el rango de 350 - 400 para Potosí. Adicionalmente, es probable que en los primeros años de ejecución, se registrarán más muertes por ten	P	30.00
							P(a)	30.00
							A	
1.2 Razon de Mortalidad materna en el Departamento de Potosi		Razon	310.00	2008	Encuesta Nacional de Demografia y Salud		P	100.00
							P(a)	100.00
							A	
1.3 Tasa de Mortalidad neonatal		por 1000 NV	27.00	2003			P	0.00
							P(a)	0.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator


 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Cobertura de Parto Institucional		porcentaje	36.00	2010	Informes del Ministerio de Salud y Deportes, para la linea de base y al final del proyecto se puede verificar con el Estudio de Brechas		P					55.00
							P(a)					55.00
							A					

1.2 Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital		Porcentaje	56.00	2010	Informes del Ministerio de Salud y Deportes, los datos para la línea de base y al final del proyecto se pueden verificar con el Estudio de Brechas		P						80.00
							P(a)						80.00
							A						
1.3 Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud		Porcentaje	10.00	2011	Encuesta antes y después del Ministerio de Salud y Deportes, se llama Estudio de Brechas		P						50.00
							P(a)						50.00
							A						
1.4 Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos		Número	0.00	2011	Informes de Servicio Departamental de Salud, al final del proyecto se puede verificar con el Estudio de Brechas		P						200.00
							P(a)						200.00
							A						
1.5 Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud		Personas	50.00	2011	Estudio de Brechas, Encuesta realizada por el MSD		P						200.00
							P(a)						200.00
							A						

1.6 Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	 RF	Personas		2012	Se debe calcular el indicado r solo en base a la línea de base y la evaluación final. No existe información confiable de año en año para calcular esta información. Se calculará el indicado r usando información administrativa sobre parto institucional, mult	P	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00
	P(a)					0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00	
	A											

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Diagnosticos del sector salud realizados.	Estudio	P	1.00	3.00	P	38,000.00	100,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	38,000.00	100,000.00
		A	2.00	2.00	A	50,729.00	50,729.00
Plan de promoción de salud implementado	Plan	P		1.00	P	18,000.00	1,018,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	18,000.00	1,018,000.00
		A			A		
Obstetricas incorporadas al sistema de salud	Personas	P		30.00	P		210,000.00
		P(a)		30.00	P(a)		210,000.00
		A			A		
Personal de los centros de primer nivel capacitado	Personas	P		200.00	P		200,000.00
		P(a)		200.00	P(a)		200,000.00
		A			A		
Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Sistema	P		1.00	P	0.00	500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	500,000.00
		A			A		
Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o adecuado	Documento	P		1.00	P		75,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		75,000.00
		A			A		
Unidad de transporte para referencias y urgencias incorporada	Unidad	P		1.00	P		450,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		450,000.00
		A			A		
Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Estrategia	P		1.00	P		1,314,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,314,000.00
		A			A		
Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Personas	P		90.00	P		280,000.00
		P(a)		90.00	P(a)		280,000.00
		A			A		
Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Sistema	P		1.00	P		68,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		68,000.00
		A			A		
Inversiones en infraestructura y equipamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua diseñado	Hospital	P		1.00	P	100,000.00	300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	100,000.00	352,429.00
		A			A	0.00	0.00
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua construido	Hospital	P		1.00	P		6,730,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		6,730,000.00
		A			A		
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua equipado	Hospital	P		1.00	P		5,106,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		5,106,000.00
		A			A		
Pre-inversión de establecimientos de salud realizada	Documento	P		1.00	P		10,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		10,000.00
		A			A		

Hospital Ocuri construido	Hospital	P		1.00	P		4,200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		4,200,000.00
		A			A		
Hospital de Ocurí equipado	Hospital	P		1.00	P		2,400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,400,000.00
		A			A		
Establecimientos de salud intervenidos	Establecimiento	P		11.00	P		13,149,185.00
		P(a)		11.00	P(a)		13,096,756.00
		A			A	668,441.00	668,441.00
Centro de coordinación de urgencias construido	Centro	P		1.00	P		450,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		450,000.00
		A			A		
Administracion y Monitoreo							

Other Cost		2013	Cost
Administración y/o fortalecimiento institucional MSD y SEDES	P	\$30,000.00	\$740,000.00
	P(a)	\$30,000.00	\$740,000.00
	A	\$66,032.00	\$66,032.00
Auditorías	P		\$200,000.00
	P(a)		\$200,000.00
	A		
Imprevistos	P		\$995,000.00
	P(a)		\$995,000.00
	A		
Monitoreo y evaluación	P		\$1,100,000.00
	P(a)		\$1,100,000.00
	A		
Administración y/o fortalecimiento institucional FPS	P	\$5,000.00	\$2,674,815.00
	P(a)	\$5,000.00	\$2,674,815.00
	A		
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$191,000.00	\$42,270,000.00
	P(a)	\$191,000.00	\$27,165,300.00
	A	\$785,202.00	\$785,202.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
