



Operation Number: **HA-L1050**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **7/8/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/08/2014**
Division Chief validation date: **07/08/2014**
Country Representative validation date: **07/09/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program to Establish a Partial Credit Guarantee Fund for Enterprise Development	Loan Number:	2416/GR-HA
Executing Agency (EA):	Fond de Développement Industriel		
Team Leader:	Dominguez,Joaquin J.	Sector/Subsector:	BANKING MARKET DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HAITI
Borrower:	REPUBLIQUE D' HAITI	Convergence related Operation(s):	HA-G1022

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
Aggregated	\$32,500,000.00	\$32,500,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$52,500,000.00
HA-G1022	\$12,500,000.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00
HA-L1050	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$40,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
Aggregated	\$20000000.00	1850488.99	9.25%	\$18149511.01
HA-L1050	\$20,000,000.00	\$1,850,488.99	9.25%	\$18,149,511.01
HA-G1022	\$0.00	\$0.00		\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	The first supervision mission was focused on training government agencies on the development and implementation of an environmental management system to manage impacts and risks.

Reformulation Information

	Main Operation	Oper. HA-G1022
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO	NO
Date of approval:		

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

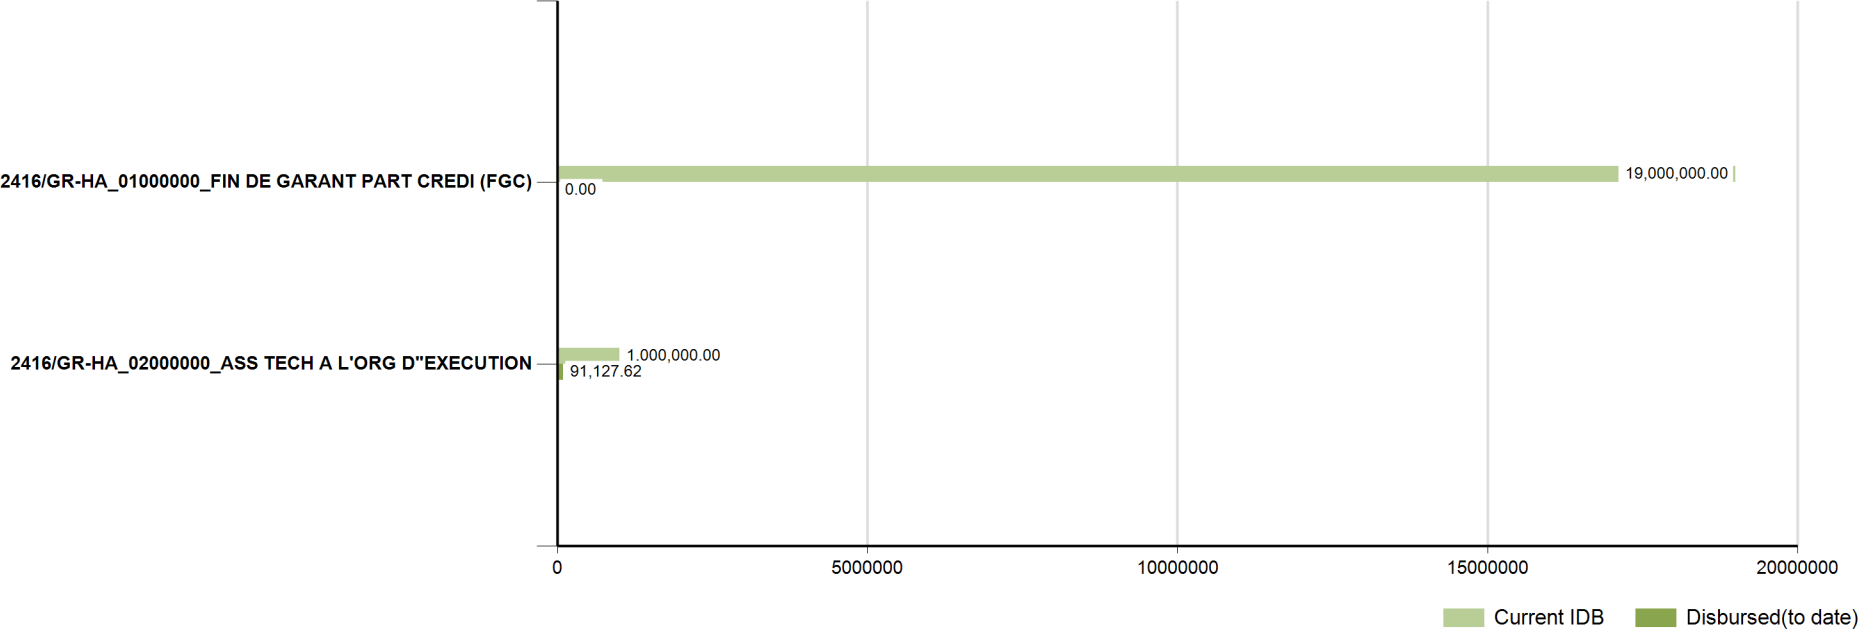

1.2 Tasa de supervivencia de empresas participantes						Se asume que, en caso de tener que ser ejecutada as las garantías s, existe una gran probabilidad que la empresa esté en proceso de liquidación. Se han estimado o un total de 840 empresas en condiciones de participar del programa, sobre la base del total de pré	P	100.00	85.00	65.00	50.00	50.00			50.00
							P(a)	100.00	85.00	65.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
							A	100.00	87.35						
Outcome:	2 Garantías emitidas (prestatarios elegibles presentados para reestructuración)														
Observation:	El monto de garantías posible de emitir por el fondo en su conjunto es de USD 68 millones como resultado del apalancamiento (2:1). La cifra total de créditos posibles de garantizar, con los recursos disponibles en el proyecto, se elevaría a un máximo de U														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
2.1 Garantías emitidas						Se asume una temporalidad del fondo de 9 meses extensible a 12 (18) meses. Tiempo promedio de procesamiento 5 días (3 x oficial + 0,5 Gerente) días. Promedio procesamiento carpeta: 4 /semana . Semanas productivas; 45: Promedio préstamo a ser presentado (US	P	22,800,000.00	15,200,000.00					38,000,000.00
							P(a)	22,800,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00
								A	3,333,289.00	0.00				
		\$	0.00	2011	Informes del Proyecto / Informes del Agente Fiduciario									
Outcome:	3 Garantías emitidas													
Observation:	Se asume una temporalidad del fondo de 9 meses extensible a 12 (18) meses. Tiempo promedio de procesamiento 5 días (3 x oficial + 0,5 Gerente) días. Promedio procesamiento carpeta: 4 /semana. Semanas productivas; 45: Promedio préstamo a ser presentado (US													
Outcome:	4 El FDI está en condiciones de gerenciar el Fondo creado por el Programa u otros con similares características													
Observation:	Dadas las características del proyecto, la formación de los cuadros gerenciales del FDI está basada en un esquema de learning by doing.													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
4.1 Funciones Management Fondo Instrumentadas		%	0.00	2011	Informes de Auditoría del Programa (Capacidad Institucional)	Se han asumido 6 funciones básicas relacionadas con el funcionamiento del Fondo: Finanzas, Riesgos, Evaluación Crediticia, Evaluación Ambiental, Reportin g y Back Office (soporte logística integral). En particular, el foco se centrará sobre estas funciones	P	50.00	50.00					100.00
	P(a)						50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	A						100.00	100.00						
Outcome:	5 Personas empleadas por (i) la incubadora de empresas (IE) y (ii) los microparques (Espacios Productivos Conjunto)													
Observation:	Indica la cantidad de personas que se emplearán como resultado de la instalación de: i) las empresas apoyadas en forma directa por la incubadora de empresas (IE) del programa y; ii) los microparques (Espacios Productivos Conjuntos) en sectores económicos													

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
5.1 Personas Empleadas			Cantidad	0.00	2013	Informes de Avance del Programa / OE	Indica la cantidad de personas que se emplearán como resultado de la instalación de: (i) las empresas apoyadas en forma directa por la IE del programa y; (ii) los microparques (EPCs) en sectores económicos estratégicos priorizados por el GoH	P							
		P(a)								0.00	850.00	150.00	200.00	49.00	1,249.00
		A													
Outcome:	6 Capital aportado por la IE devuelto														
Observation:															

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
6.1 Empresas al día en los pagos de cuotas de capital aportado por la IE			%	100.00	2013	Informes de Avance del Programa / OE	Indica el grado de avance de la devolución del capital recibido de la IE, a partir de la rentabilidad obtenida por las empresas apoyadas por la IE independiente de la cuantía del pago, es decir, mide si han pagado o no su cuota correspondiente. Dadas	P								
								P(a)			100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00
								A								
Outcome:	7 Capacidad Productiva Microparques (EPC) inicial mantenida															
Observation:																

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
7.1 Tasa de ahorro promedio anual generado por los microproductores (beneficiarios) del microparque (EPC) con respecto del capital mínimo necesario para reponer la capacidad productiva instalada al inicio del programa (incluyendo los equipamientos entregados,			%	0.00	2013	Informes de Avance del Programa / OE / Informes de Avance del Gestor del microparque (EPC)	Mide la relación entre el ahorro generado, en promedio, por año, por los microproductores (beneficiarios) del microparque (EPC) y el capital mínimo necesario para reponer la capacidad de producción originalmente aportada a los microproductores, según el c	P							
							P(a)			0.00	10.00	30.00	50.00	100.00	100.00
							A								
Outcome:	8 Empresas tratadas por el IE son sostenibles														
Observation:															

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
8.1 Empresas evaluadas como elegibles para ser objeto de financiamiento por los intermediarios financieros			%	0.00	2013	Informes de Avance del Programa / OE - Informe de consultoría de los Program Managers de las empresas asistidas por la IE	Se mide: (i) la efectiva transferencia de las capacidades gerenciales necesarias para la presentación de un pedido de financiación a una IFI y; (ii) la generación de beneficios por encima de las tasas de interés de mercado que las IFIs cobrarían	P							
							P(a)			0.00	0.00	0.00	54.00	80.00	80.00
							A								
Outcome:	9 Las empresas de arrendamiento son rentables														
Observation:															

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
9.1 Tasa de retorno sobre el capital		%	0.00	2013	Informes de empresas de arrendamiento / Balances auditados de empresas de arrendamiento / Informes de avance OE	Mide la rentabilidad de la actividad de arrendamiento y demostrará que el mercado es viable. Se mide como EBITDA, según los datos proporcionados por las empresas en sus estados financieros auditados	P							
							P(a)		2.00	6.00	16.00	16.00	16.00	16.00
							A							

Outcome:

10 Contratos de arrendamiento pendientes (vigentes)

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
10.1 Monto de contratos de arrendamiento pendientes (vigentes)		USD	0.00	2013	Balances auditados de las empresas de arrendamiento / Informes de Avance del OE	Mide el monto (en dólares) del arrendamiento financiero o proporcionado por las empresas financiadas por el programa	P							
							P(a)		0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	5,800,000.00
							A							

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Emisión de Garantías		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Instituciones Financieras Intermedias elegibles para presentar operaciones susceptibles de ser garantizadas	IFIs	P		5.00	P		
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	0.00	3.00
		A		6.00	A		3.00
Garantías en condición de ser emitidas (en función de la capacidad y disponibilidad de los fondos para emitir garantías y de la capacidad operativa del FDI para procesarlas) sobre el total de las garantías disponibles a emitir	Monto Garantías	P		25,200,000.00	P		12,600,000.00
		P(a)	22,800,000.00	10,000,000.00	P(a)	11,400,000.00	5,000,000.00
		A		10,000,000.00	A		5,000,000.00
Fondo de Garantías Parciales de Crédito establecido y operando	%	P		100.00	P	100.00	200.00
		P(a)	100.00	100.00	P(a)	0.00	100.00
		A		100.00	A		100.00
Asistencia Técnica FDI		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Asistencia Técnica (servicios de consultoría/otros servicios/equipamientos adicionales) para desarrollo e instrumentación operativa dentro del FDI de las funciones necesarias y suficientes para gerenciar Fondos de Garantía de Crédito	%	P	10.00	160.00	P	80,000.00	551,093.00
		P(a)	10.00	200.00	P(a)	80,000.00	154,393.00
		A		200.00	A		154,393.00
Administración y Supervisión							
Reformulación Parcial 1: Ampliación Programa Piloto para brindar apoyo a MiPyMEs		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Empresas asistidas por la incubadora de empresas (IE)	Empresas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	25.00	P(a)	258,000.00	2,357,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Microparque (EPC) instalado y en funcionamiento	Microparques	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	268,000.00	4,080,800.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Reformulación Parcial 1: Financiamiento piloto para mecanismos de arrendamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Compañías de arrendamiento creadas con recursos del Programa	Compañías	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	8,000,000.00
		A		0.00	A		0.00
Consultorías Técnicas apoyo creación Empresas Arrendamiento Realizadas	Consultorías	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	50,000.00	250,000.00
		A		0.00	A		0.00
Reformulación Parcial 1: Asistencia Técnica Firma Especializada							
Reformulación Parcial 1: Gestión y Supervisión							
Reformulación Parcial 1: Imprevistos							

Other Cost		2013	Cost
Auditoría y Evaluaciones	P	\$15,000.00	\$69,500.00
	P(a)	\$15,000.00	\$14,200.00
	A		\$14,200.00
Apoyo Técnico Firma Especializada	P		
	P(a)	\$45,500.00	\$1,041,851.00
	A		\$0.00
Gestión y Supervisión del Programa (incluye auditorías y evaluación)	P		
	P(a)	\$24,000.00	\$489,001.00
	A		\$0.00
Imprevistos	P		
	P(a)	\$0.00	\$464,348.00
	A		\$0.00
Monto disponible para la segunda reformulación del programa (la línea de desarrollo "anchors")	P		\$0.00
	P(a)		\$14,831,407.00
	A		\$0.00
Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$95,100.00	\$13,220,793.00
	P(a)	\$12,140,500.00	\$36,322,556.00
	A		\$5,168,696.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
