



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO JULIO 2017 - DICIEMBRE 2017

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Inclusión Financiera para una Agricultura Climáticamente Inteligente en Argentina

Nro. Proyecto: AR-T1170 - Proyecto No.: ATN/ME-15925-AR

Propósito: Mejorar las condiciones económicas y la capacidad de resiliencia al cambio climático de pequeños productores en zonas "extrapampeanas" de Argentina a través de una intervención integral, basada en la adopción de tecnología, el desarrollo de capacidades y el acceso a crédito especializado.

País Administrador

ARGENTINA

País Beneficiario

ARGENTINA

Agencia Ejecutora:

FUNDACION BANCO CREDICOOP


Líder equipo de diseño:

ALEJANDRO PARDO



Líder equipo de supervisión:

MARIEL SABRA


CICLO DEL PROYECTO




RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.467
Promedio FOMIN: 2.785

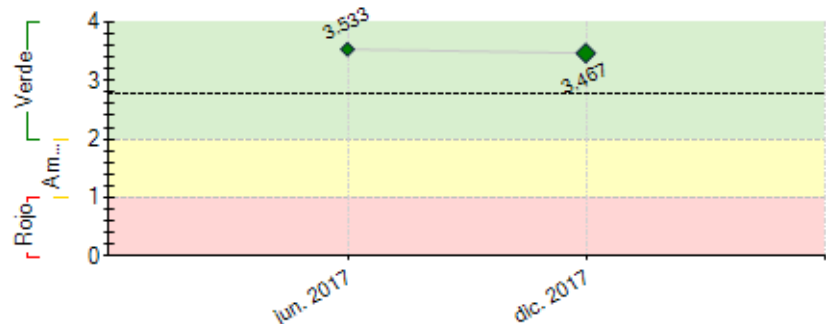

----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS


CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Baja

Adquisiciones: Baja

Capacidad Técnica: Media

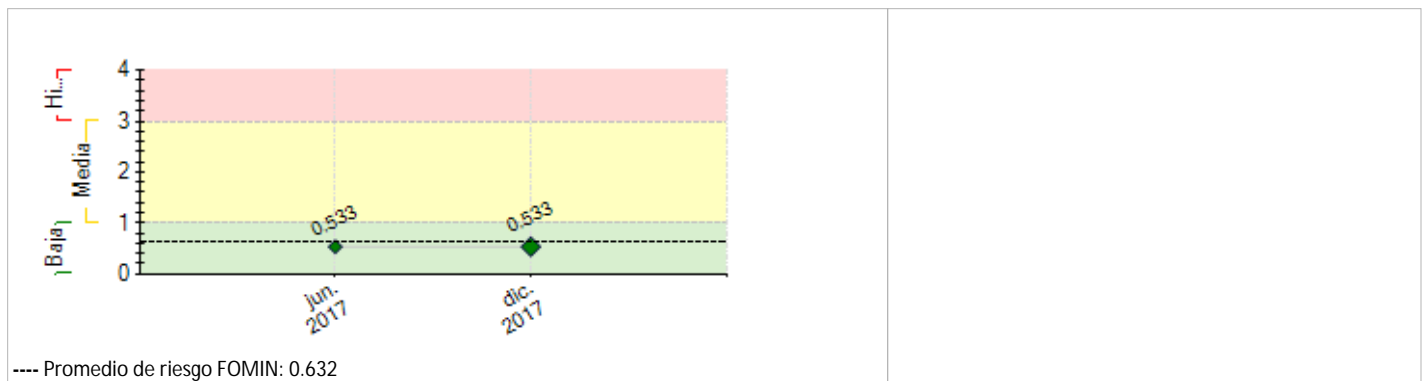

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales logros alcanzados fueron: i) cumplimiento de las CP rápidamente; ii) lanzamiento de la réplica del proyecto antes del tiempo previsto; iii) inicio de las actividades de reproducción de semillas adaptadas genéticamente por parte del INTA, en la región Cuyo, que posibilitará a los pequeños productores contar las variedades y calidades necesarias para incrementar su productividad; iv) selección de la firma y del laboratorio para la realización de estudios de suelo en la región NEA; v) Lanzamiento de las mesas de articulación público privadas en la región Cuyo; vi) inicio de las actividades de capacitación y AT en las dos regiones.

Hasta el momento no hubo mayores dificultades ni retrasos en la ejecución del proyecto.

El principal riesgo del proyecto es que los pequeños productores no efectúen las inversiones necesarias para realizar los cambios productivos vinculados a la mitigación de los problemas climáticos. Para minimizar el problema se lanzó una línea de crédito especial y se realizan acciones de sensibilización.

Se considera que el proyecto podrá cumplir con sus objetivos, ya que se vienen realizando si mayores dificultades todas las actividades previstas en el proyecto y hay entusiasmo por parte de las cooperativas y productores beneficiarios.

Entre las acciones críticas futuras se destacan: i) Actividades en el área de comercialización; ii) Asistencia técnica a productores para implementar los cambios; iii) Actividades de articulación público privada.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo, el proyecto se desempeña según esperado, y se alcanzaron los objetivos acumulados sin mayores inconvenientes.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el semestre los principales avances fueron los siguientes: i) lanzamiento de la sede NEA (selección y contratación del coordinador; selección de firmas para estudios de suelo y para capacitaciones a jóvenes); ii) suscripción del convenio entre FECOAGRO, INTA y la Fundación Credicoop para la implementación del proyecto en la Región de Cuyo; iii) inicio de las actividades de reproducción de semillas por parte del INTA; iv) comienzo de las capacitaciones; v) creación de una línea crediticia específica para el Proyecto.

Se cumplió con los hitos programados para el semestre.

Para el próximo semestre se espera lograr lo siguiente: i) Avanzar en la estrategia de comercialización mediante la contratación de consultorias para desarrollar dicha estrategia y para realizar estudios de mercados y detección de posibilidades de diversificar la producción; ii) Continuación de la capacitación de productores en el nuevo paquete tecnológico, asociatividad y comercialización; iii) Lanzamiento de nuevas mesas de articulación público privadas; iv) Contratación de la estrategia de comunicación y difusión del Programa; v) contratación de una firma consultora para realizar diagnósticos, planes de mejora y estudio de suelos en la región NEA; vi) Contratación del servicio de laboratorio para los estudios de suelo; vii) Otorgamiento de créditos a productores y Capacitación de gerentes y oficiales de crédito de la Región Cuyo respecto de la nueva línea de financiamiento.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo, el proyecto se desempeña según esperado, y se alcanzaron los objetivos del semestre sin mayores inconvenientes.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Pequeños productores, con acceso integral a financiamiento, tecnología y capacidades CSA, incrementan su productividad y sus ingresos.	I.1 800 productores obtienen asistencia técnica y capacitaciones para implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.	0				800 Mar. 2020	0	
Propósito: Mejorar las condiciones económicas y la capacidad de resiliencia al cambio climático de pequeños productores en zonas "extrapampeanas" de Argentina a través de una intervención integral, basada en la adopción de tecnología, el desarrollo de capacidades y el acceso a crédito especializado.	R.1 Valor estimado total de los créditos CSA otorgados por el proyecto, para el conjunto de productos financiero desarrollados a partir de este piloto, en varias regiones del país, en función de la demanda	0 Abr. 2017	50000 Ene. 2019	250000 Ene. 2020		750000 Ene. 2021	20800 Dic. 2017	
	R.2 Número estimado de productores que obtienen acceso a créditos CSA otorgados por el proyecto, para el conjunto de productos financiero desarrollados a partir de este piloto, en varias regiones del país, en función de la demanda.	0	50 Ene. 2019	500 Ene. 2020		2000 Ene. 2021	2 Dic. 2017	
	R.3 Incremento del porcentaje de ingresos brutos por ventas de beneficiarios que aplican el paquete tecnológico CSA en las dos regiones piloto.	0 Mar. 2017	15 Ene. 2019	25 Ene. 2020		30 Ene. 2021	0	
	R.4 Incremento de al menos 50%, en la productividad, medida como total de producción por unidad de área, para los beneficiarios que modifican el sistema de riego y renuevan sus plantaciones las dos regiones piloto.	0 Mar. 2017	30 Ene. 2019	40 Ene. 2020		50 Ene. 2021	0	

Componente 1: Incorporación de un paquete tecnológico CSA para pequeños productores Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de productores capacitados en el nuevo paquete tecnológico, asociatividad y comercialización	0 Mar. 2017	200 Mar. 2018	500 Mar. 2019	800 Mar. 2020	800 Mar. 2020	200 Nov. 2017	En curso
	C1.12 Número de productores que adoptan el nuevo paquete tecnológico.	0 Mar. 2017	50 Mar. 2018	150 Mar. 2019	300 Mar. 2020	300 Mar. 2020		
	C1.13 Número de nuevas especies agrícolas y productos agroindustriales desarrollados de acuerdo a la demanda detectada.	0 Mar. 2017	10 Mar. 2019	40 Mar. 2020		40 Mar. 2020		
	C1.14 Número de nuevos clientes compradores a los que los productores agrícolas logran vender	0 Mar. 2017	5 Mar. 2019	10 Mar. 2020		10 Mar. 2020	1 Dic. 2017	En curso
	C1.15 Número de localidades con mesas de articulación público privadas	0 Mar. 2017	1 Mar. 2018	3 Mar. 2019	5 Mar. 2020	10 Ago. 2020		
	C1.16 Número de cooperativas fortalecidas en gestión cooperativa y gobernanza	0 Mar. 2017	10 Mar. 2018	30 Mar. 2019	40 Mar. 2020	40 Mar. 2020	28 Nov. 2017	En curso
Componente 2: La prueba de mercado y desarrollo de una línea de productos financieros de CSA Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de sucursales de Banco Credicoop que aplican los productos financieros CSA desarrollados por el proyecto	0 Mar. 2017	5 Mar. 2018	70 Mar. 2019	150 Mar. 2020	150 Mar. 2020	16 Dic. 2017	En curso
	C2.12 Número de productos financieros adaptados o desarrollados para CSA	0 Mar. 2017	1 Mar. 2018	3 Mar. 2019	3 Mar. 2020	3 Mar. 2020	1 Dic. 2017	En curso
	C2.13 Número de oficiales de crédito capacitados y comercializando productos financieros CSA	0 Mar. 2017	5 Mar. 2018	70 Mar. 2019	150 Mar. 2020	150 Mar. 2020	3 Dic. 2017	En curso
	C2.14 Número de productores que acceden al crédito de agricultura climáticamente inteligente del Banco Credicoop en las 2 regiones piloto	0 Mar. 2017	50 Mar. 2018	100 Mar. 2019	400 Mar. 2020	400 Mar. 2020	2 Dic. 2017	En curso
	C2.15 Número de productores que cuentan con seguro agrícola.	0 Mar. 2017	100 Mar. 2019	300 Mar. 2020		300 Mar. 2020		
Componente 3: Sistematización y Réplica del Modelo Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número de evaluaciones de impacto, estudios de caso y sistematizaciones	0 Mar. 2017	1 Mar. 2020			1 Mar. 2020		
	C3.12 Número de instituciones que acceden a productos y/o actividades de transferencia de conocimiento	0 Mar. 2017	5 Mar. 2018	10 Mar. 2019	15 Mar. 2020	15 Mar. 2020		
	C3.13 Coordinación y complementación con el Programa PROSAP y otros programas	0 Mar. 2017	1 Mar. 2018	2 Mar. 2019	3 Mar. 2020	3 Mar. 2020	1 Oct. 2017	Finalizado
	C3.14 Porcentaje de ANRs del PROSAP vinculados a incorporación de tecnología y crédito CSA, en regiones en las que se actuó en conjunto	0 Mar. 2017	3 Mar. 2018	5 Mar. 2019	10 Mar. 2020	10 Mar. 2020		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Contrato con INTA firmado y en ejecución	1	Sep. 2017	1	Jun. 2017	Logrado
H2 Sistema de monitoreo diseñado y en implementación	1	Sep. 2017	1	Sep. 2017	Logrado
H1 Condiciones previas	8	Sep. 2017	8	Mar. 2017	Logrado
H3 Consultoría sobre estrategia comercial nuevas especies y agroindustria de San Juan realizada	1	Mar. 2018			
H4 Réplica del proyecto comenzada	1	Sep. 2018	1	Ago. 2017	Logrado
H5 Consultoría con propuesta de paquete tecnológico en la región a replicar, realizada	1	Sep. 2018			
H6 Al menos 3 localidades instalaron mesas de articulación público privadas	3	Mar. 2019			
H7 Al menos 50 productores recibieron créditos del Banco Credicoop, de la línea especial del programa y 50 aplican seguros agrícolas	50	Mar. 2019			
H8 Al menos 100 productores introdujeron nuevas especies agrícolas y/o productos agroindustriales	100	Sep. 2019			
H9 Al menos 500 productores recibieron capacitación y AT vinculadas al nuevo paquete tecnológico	500	Sep. 2019			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. eventos extremos relacionados con el cambio climático en un período particular de siembra-cosecha	Media	apoyo a los productores en el manejo del riesgo climático, mediante la capacitación y asistencia técnica para introducir un nuevo paquete tecnológico, además de productos financieros orientados a la adaptación al cambio climático y creación de resiliencia climática, específicamente a través de un seguro agrícola;	Project Coordinator

2. posible ralentización de la demanda de financiamiento CSA por parte del sector agropecuario o restricciones sobrevenidas de carácter regulatorio;	Baja	Desarrollo de una línea de crédito especial, contemplando fechas de pago vinculadas a las de cosecha y comercialización. Articulación con entidades públicas para la obtención de subsidios de tasa y/o disminución del costo del crédito	Project Coordinator
3. cambios inesperados en las demandas del mercado en relación con las nuevas variedades a introducir y los nuevos productos provenientes del proceso de diversificación	Baja	realización de un estudio de mercado y rentabilidad sobre las nuevas variedades y potenciales nuevos productos, para determinar los alcances y características de la demanda, además de fortalecer al área comercial de las cooperativas;	Project Coordinator
4. disponibilidad limitada de fondos públicos para desarrollo del sector agropecuario, debido a restricciones fiscales para el financiamiento de las inversiones necesarias a realizar por las cooperativas y los productores.	Baja	generación de acuerdos con el Banco Credicoop con la posibilidad de duplicar los fondos de la línea de crédito que atenderá las necesidades de financiamiento de los beneficiarios del proyecto.	Project Coordinator
5. retornos menores o riesgos climáticos mayores a los proyectados para la aplicación de tecnología CSA, particularmente en fase de ampliación a productores en otras regiones, con condiciones de partida diferentes	Baja	Los retornos menores se mitigarán con estudios de mercado que posibilitarán producir las variedades solicitadas por el mercado y con una rentabilidad aceptable. Los riesgos climáticos se tratarán de minimizar, con tecnologías más acordes (genética y sistemas de riego), junto con un seguro climático para parte de los riesgos climáticos (granizo).	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Un aspecto importante para lograr la sostenibilidad del proyecto es la articulación con el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, que interactúan en la generación e instrumentación de políticas para paliar los problemas productivos y ambientales vinculados al cambio climático. Dicha articulación posibilita la continuidad de acciones y financiamiento para el logro de los objetivos del proyecto. En la región Cuyo, dicha articulación está siendo llevada a cabo por la Universidad Nacional de San Juan, que ha sido contratada por el proyecto para esta actividad. En la región NEA se contratará durante el semestre.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]
