



Operation Number: **DR-L1067**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/5/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/06/2015**
Division Chief validation date: **10/09/2015**
Country Representative validation date: **10/13/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthening of the Management for Results of the Sector Health in Dominican Re	Loan Number:	2973/OC-DR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
Team Leader:	Distrutti,Marcella	Sector/Subsector:	HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1067	\$146,000,000.00	\$146,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1067	\$146,000,000.00	\$88,045,480.00	60.31%	\$57,954,520.00

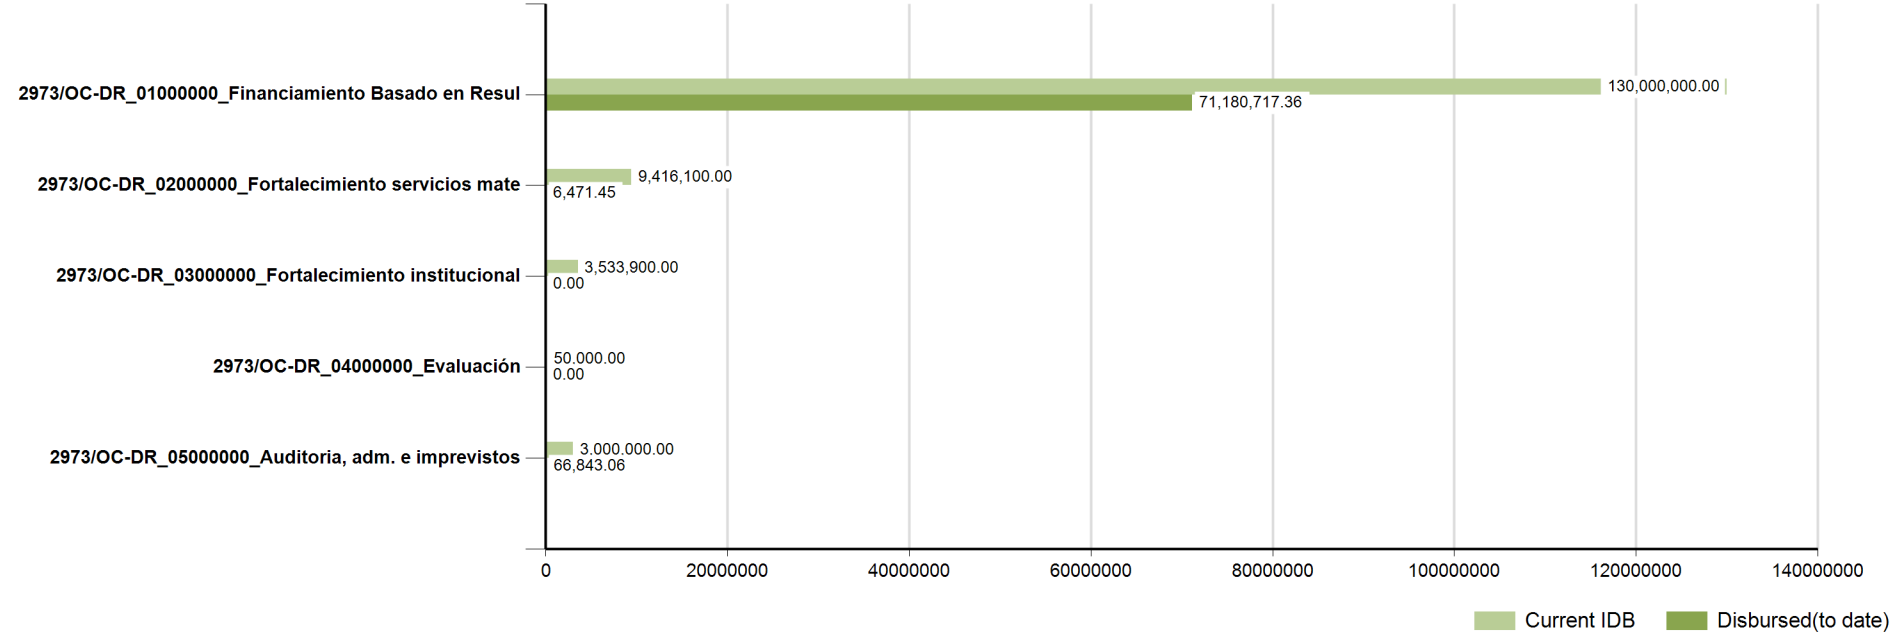
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	




Reformulation Information


Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
3.1 Porcentaje de menores		Porcentaje	6.79	2013	Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)	Cuatrimestral	P		20.00		60.00	60.00
							P(a)		10.00		60.00	60.00
							A					
Outcome:	4 Niños mayores de 15 meses y menores de 24 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
4.1 Porcentaje de niños		Porcentaje	1.80	2013	Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)	Cuatrimestral	P		20.00		60.00	60.00
							P(a)		10.00		60.00	60.00
							A					
Outcome:	5 Niños menores de 24 meses con controles de desarrollo y crecimiento completo según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
5.1 Porcentaje de niños		Porcentaje	0.54	2013	Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)	Cuatrimestral	P		20.00		60.00	60.00
							P(a)		10.00		60.00	60.00
							A					
Outcome:	6 Individuos sintomáticos respiratorios captados con resultados de baciloscopia documentado en centro de primer nivel en las cinco regiones del proyecto, aumentado											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
6.1 Porcentaje de individuos		Porcentaje	0.81	2013	Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
							P(a)		10.00		50.00	50.00
							A					
Outcome:	7 Mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado											
Observation:												

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
7.1 Hombres mayores de 18 años tamizados		 P-G	Porcentaje	12.44	2013	Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
								P(a)		10.00		50.00	50.00
		A											
7.2 Mujeres mayores de 18 años tamizadas			Porcentaje	5.68	2013	Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
								P(a)		10.00		50.00	50.00
		A											
Outcome:		8 Diagnosticados con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado											
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
8.1 Hombres diagnosticados		 P-G	Porcentaje	2.51	2013	Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
								P(a)		10.00		50.00	50.00
		A											
8.2 Mujeres diagnosticadas			Porcentaje	1.16	2013	Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
								P(a)		10.00		50.00	50.00
		A											
Outcome:		9 Mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en las cinco regiones del proyecto, aumentado .											
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
9.1 Hombres mayores de 18 años		 P-G	Porcentaje	0.20	2013	Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
								P(a)		10.00		50.00	50.00
		A											
9.2 Mujeres mayores de 18 años			Porcentaje	0.06	2013	Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
								P(a)		10.00		50.00	50.00
		A											
Outcome:		10 Diagnosticados con Diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado											
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP	
10.1 Hombres diagnosticados	 P-G	Porcentaje	1.77	2013	Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
							P(a)		10.00		50.00	50.00
							A					
10.2 Mujeres diagnosticadas		Porcentaje	0.67	2013	Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)		P		10.00		50.00	50.00
							P(a)		10.00		50.00	50.00
							A					
Outcome:	11 Población SIUBEN I y II con carnets de afiliación al régimen subsidiado en las cinco regiones del proyecto, aumentado .											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP	
11.1 Porcentaje de población		Porcentaje	0.00	2013	Informes de empresa encargada de elaboración y entrega de carnets / reportes de auditorías concurrentes		P		30.00		80.00	80.00
							P(a)		30.00		80.00	80.00
							A					
Outcome:	12 Dependientes de afiliados al régimen subsidiado que poseen información de acta de nacimiento en la base de datos de afiliados del SENASA en las cinco regiones del proyecto, aumentado.											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP	
12.1 Cantidad de dependientes		Dependientes	0.00	2013	Reporte de Base de Datos del SENASA		P		50,000.00		120,000.00	120,000.00
							P(a)		50,000.00		120,000.00	120,000.00
							A					
Outcome:	13 Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGHO) implementado y en funcionamiento en los hospitales en que se implementará el CEMI.											
Observation:												

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP	
13.1 Hospitales con SIGHO implementado y en funcionamiento			Sistema	0.00	2013	Reportes anuales de evaluación emitidos por la Dirección de Tecnología de Información del MISPAS		P		3.00	9.00	12.00	
								P(a)		0.00	9.00	12.00	
								A		0.00			
Outcome:	14 Muertes maternas e incidentes auditados por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP	
14.1 Porcentaje de muertes maternas e incidentes auditados			Porcentaje	0.00	2013	Actas de las sesiones del Comité		P		30.00	95.00	95.00	
								P(a)		30.00	95.00	95.00	
								A					
Outcome:	15 Muertes neonatales auditadas por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP	
15.1 Porcentaje de las muertes neonatales auditadas			Porcentaje	0.00	2013	Actas de las sesiones del Comité		P		30.00	95.00	95.00	
								P(a)		30.00	95.00	95.00	
								A					
Outcome:	16 Mujeres que reciben tratamiento activo de la tercera etapa del parto en los hospitales en que se implementará el CEMI, aumentado .												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP	
16.1 Porcentaje de mujeres que reciben tratamiento			Porcentaje	0.00	2013	Reportes de Descripción de Parto obtenido en la primera etapa del registro físico de cada paciente, una vez implementado el SIGHO		P		25.00	90.00	90.00	
								P(a)		0.00	25.00	90.00	90.00
								A		0.00			

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

I. Financiamiento de prestaciones basado en resultados (FBR) en salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	Personas	P	1,232,025.00	1,448,100.00	P	25,323,929.57	132,365,564.02
		P(a)	1,239,430.00	1,448,100.00	P(a)	27,935,619.45	132,148,126.96
		A	1,234,037.00	1,277,710.00	A	13,600,861.91	84,816,367.98
II. Calidad de los servicios de salud materno infantil fortalecida		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	Hospitales	P	0.00	15.00	P	194,700.00	272,000.00
		P(a)	0.00	15.00	P(a)	189,500.00	272,000.00
		A	0.00	0.00	A	70,269.94	70,269.94
Personal de salud de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en programas Cuidados Obstétricos de Emergencia	Personas	P	200.00	200.00	P	1,407,799.97	2,415,999.98
		P(a)	0.00	200.00	P(a)	1,407,799.97	2,415,999.98
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Personal de salud del área de perinatología de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en sepsis neonatal	Personas	P	150.00	150.00	P	18,000.00	539,000.00
		P(a)	0.00	150.00	P(a)	18,000.00	539,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Embarazadas vinculadas a los hospitales en que se implementara el CEMI capacitadas en sesiones de preparación al parto	Porcentaje	P	15.00	50.00	P	530,000.00	1,122,000.00
		P(a)	0.00	50.00	P(a)	530,000.00	1,122,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
III. Función de rectoría del sector salud fortalecida		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Proceso de certificación Hospitales CEMI	Hospitales certificados	P		10.00	P		82,897.99
		P(a)		10.00	P(a)		82,897.99
		A		0.00	A	0.00	0.00
Plan decenal de salud 2016-2025 terminado	Plan	P	1.00	1.00	P	149,500.00	160,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		160,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Unidad de análisis de monitoreo y evaluación de desempeño dentro del MISPAS en funcionamiento	Unidad	P	1.00	1.00	P	150,000.00	150,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	50,000.00	150,000.00
		A	0.00	0.00	A	9,929.74	9,929.74
Normas y Guías Nacionales de Rehabilitación actualizadas	Normas	P	1.00	1.00	P	30,000.00	30,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	30,000.00	30,000.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Normas Nacionales para la homologación de las funciones de los sistemas de información de salud elaboradas	Normas	P	0.00	1.00	P	70,000.00	70,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	35,000.00	70,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de gestión clínico-administrativo para el segundo y tercer nivel instalado en los hospitales CEMI	Sistema	P	0.00	1.00	P	3,927,666.67	4,320,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,195,555.00	4,320,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudio de análisis de las implicaciones de eliminar la ley de pasantía médica terminado	Estudio	P	1.00	1.00	P	35,000.00	35,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	35,000.00	35,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudio de análisis de esquemas de incentivo a recursos humanos en salud para trabajar en áreas geográficas apartadas terminado	Estudio	P	0.00	1.00	P	35,000.00	35,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	35,000.00	35,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Estudio de análisis de factibilidad de la implementación de una tarjeta electrónica de salud vinculada al Sistema de Gestión Clínica terminado	Estudio	P	1.00	3.00	P	35,000.00	35,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		35,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
IV. Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Evaluación de la reforma del sector salud	Evaluación	P	1.00	1.00	P	50,000.00	50,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2015	Cost
Contratación personal UCP	P	\$908,943.30	\$3,148,238.01
	P(a)	\$528,416.00	\$3,148,238.01
	A	\$59,493.27	\$59,493.27
Gerentes de Campo FBR (Componente I)	P	\$137,800.00	\$400,300.00
	P(a)	\$30,000.00	\$400,300.00
	A	\$15,000.00	\$15,000.00
Gerentes de Campo CEMI (Componente II)	P	\$163,800.00	\$351,000.00
	P(a)	\$155,000.00	\$351,000.00
	A	\$52,665.65	\$52,665.65
Gastos operativos visitas a regiones de salud para la implementación del FBR (Componente I)	P	\$76,285.71	\$178,000.00
	P(a)	\$60,000.00	\$178,000.00
	A	\$9,520.00	\$11,975.07
Gastos operativos visitas a hospitales (Componente II)	P	\$60,000.00	\$120,000.00
	P(a)	\$60,000.00	\$120,000.00
	A	\$9,520.00	\$9,520.00
Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementacion del FBR (Componente I)	P		\$60,000.00
	P(a)	\$35,000.00	\$60,000.00
	A	\$38,927.00	\$62,395.73
Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementacion del CEMI (Componente II)	P	\$60,000.00	\$60,000.00
	P(a)	\$35,000.00	\$60,000.00
	A	\$38,927.00	\$38,927.00
Readecuación física oficina UCP	P		\$0.00
	P(a)	\$25,000.00	\$217,437.06
	A	\$224,052.92	\$224,052.92
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$33,363,425.22	\$146,000,000.00
	P(a)	\$32,389,890.42	\$127,739,277.01
	A	\$14,129,167.43	\$85,370,597.30

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Mujeres diagnosticadas	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	This indicator was calculated for women and men, so we can now report it for both genders separately (to assess the impact of the intervention on both genders).	9/22/2015	4/1/2015
Outcome	Hombres diagnosticados	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	This indicator was calculated for women and men, so we can now report it for both genders separately (to assess the impact of the intervention on both genders).	9/22/2015	4/1/2015

Outcome	Mujeres mayores de 18 años	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	This indicator was calculated for women and men, so we can now report it for both genders separately (to assess the impact of the intervention on both genders).	9/22/2015	4/1/2015
Outcome	Hombres mayores de 18 años	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	This indicator was calculated for women and men, so we can now report it for both genders separately (to assess the impact of the intervention on both genders).	9/22/2015	4/1/2015
Outcome	Mujeres diagnosticadas	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	This indicator was calculated for women and men, so we can now report it for both genders separately (to assess the impact of the intervention on both genders).	9/22/2015	4/1/2015
Outcome	Hombres diagnosticados	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	This indicator was calculated for women and men, so we can now report it for both genders separately (to assess the impact of the intervention on both genders).	9/22/2015	4/1/2015
Outcome	Mujeres mayores de 18 años tamizadas	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	This indicator was calculated for women and men, so we can now report it for both genders separately (to assess the impact of the intervention on both genders).	9/22/2015	4/1/2015
Outcome	Hombres mayores de 18 años tamizados	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	This indicator was calculated for women and men, so we can now report it for both genders separately (to assess the impact of the intervention on both genders).	9/22/2015	4/1/2015
Output	Auditoría de procesos de registro y consolidación de información para la implementación del mapa sanitario	Modify Unit of Measure	The unit of measure was incorrect.	9/22/2015	9/1/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
