

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s): 2653/OC-EC
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): EC-T1228
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 250.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 129.000.000,00
% Décaissé: 51,60
Solde: 121.000.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 250.000.000,00
Courant BID: 250.000.000,00
Pari Passu: 99,00
Cofinancement/Pays: 1.456.080,00
Estimation Initiale: 251.456.080,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012

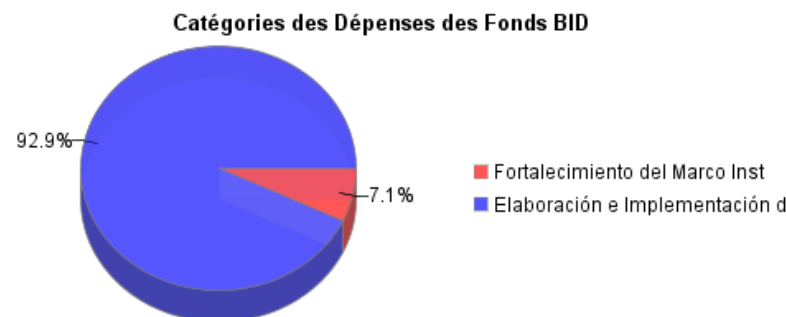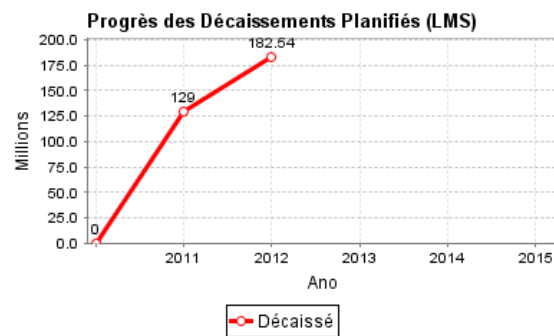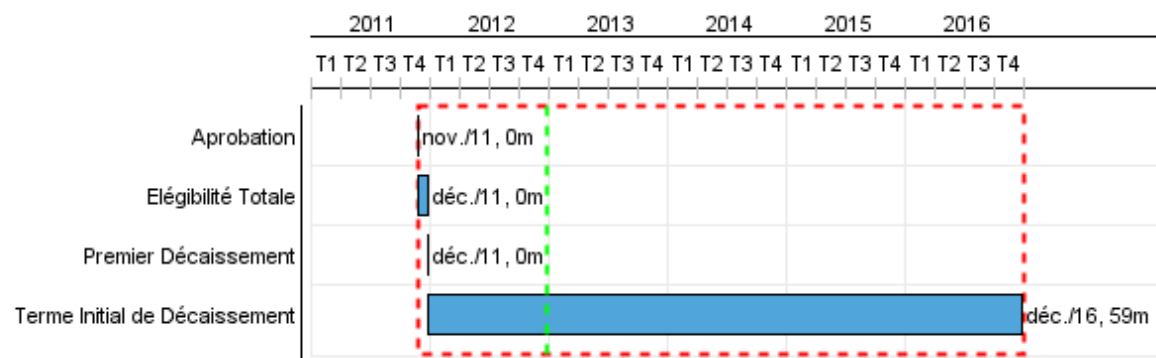

Progrès Cumulé à 2012

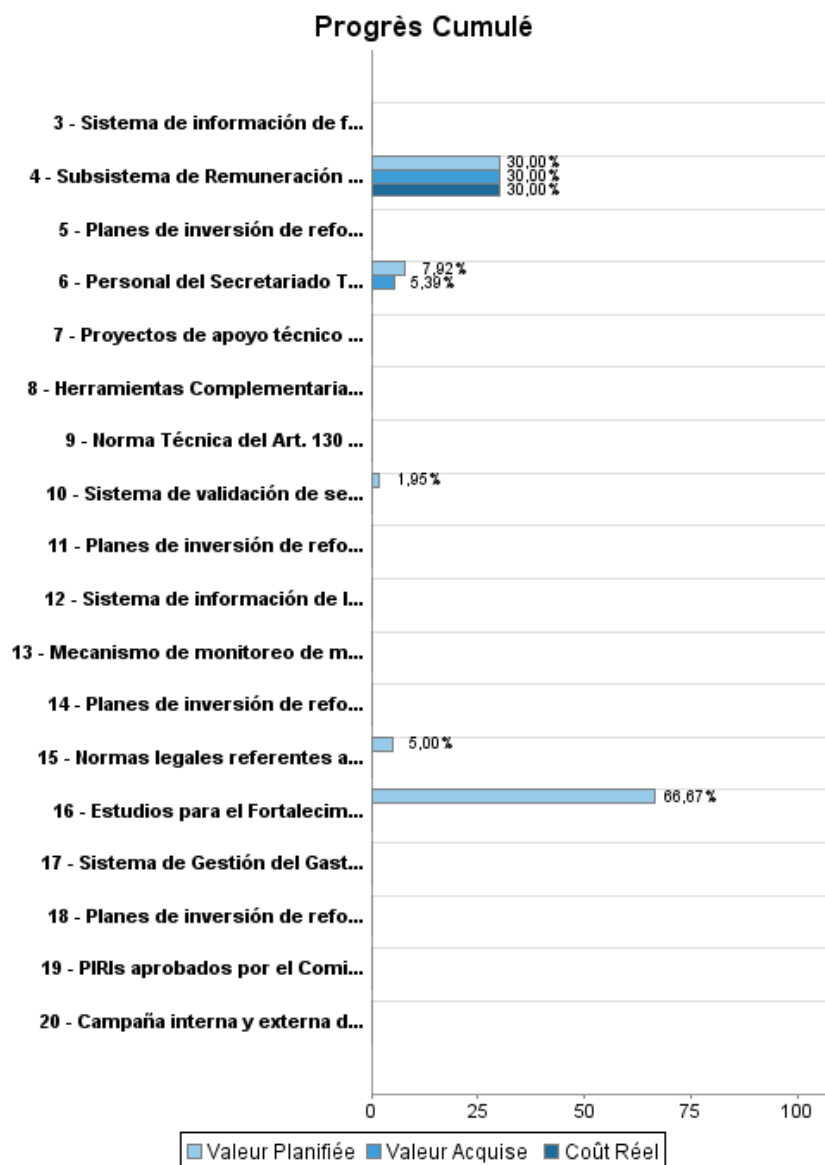

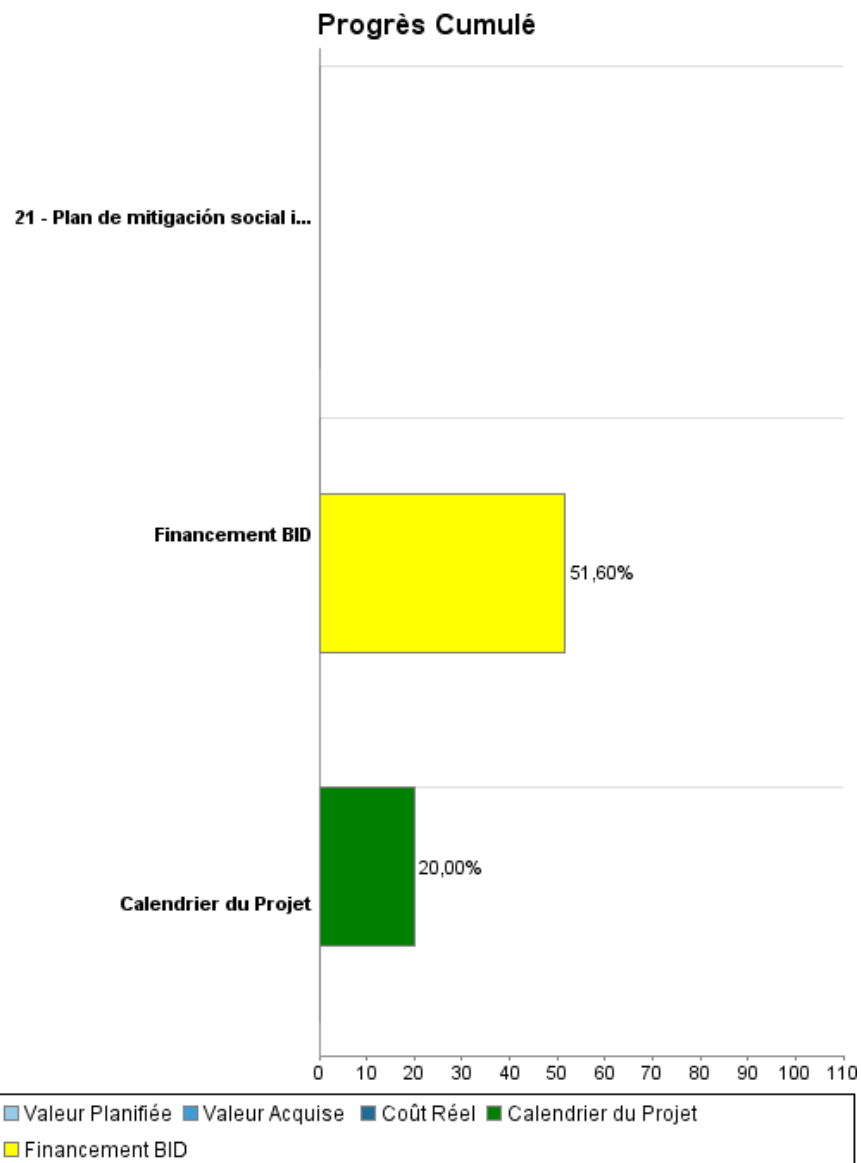

Résultats

Résultat: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.40	2008	P A	0.60

Résultat: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice de coherencia del Servicio Civil	Indice	0.13	2011	P A	0.30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Indice	0.28	2011	P A	0.45
Mérito del Servicio Civil	Indice	0.33	2011	P A	0.55

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				
Sistema de Gestión del Gasto (Planificación, Inversión y Presupuesto) ajustados para interoperar el monitoreo del Plan de Inversiones (PAI)	Sistema				2,00				
Sistema de información de funciones del Estado que evite sobreposición de funciones implementado,	Sistema				1,00				400.000,00
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación, simplificadas.	Normas	17,00			34,00	20.000,00			400.000,00
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida (incluye talleres)	Campaña				1,00				700.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración diseñadas	Herramientas				3,00				355.000,00
Personal del Secretariado Técnico del Comité capacitado	Funcionarios	50,00	34,00		92,00	8.000,00			101.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				10,00				7.900.000,00
Sistema de información de la Gestión del Talento Humano (TH) implementado	Sistema				1,00				2.100.000,00
Proyectos de apoyo al fortalecimiento del servicio civil implementados	Proyecto				3,00				768.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				2.500.000,00
Sistema de validación de selección de personal implementado	Sistema				1,00	22.000,00			1.130.000,00
Norma Técnica del Art. 130 de la LOSEP elaborada	Norma								
Subsistema de Remuneración Variable de la Función Ejecutiva implementado	Subsistema				1,00		375.000,00		1.250.000,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios	1,00			3,00	200.000,00			300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
PIRIs aprobados por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional.	PIRIs				9,00				5.909.920,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Educación implementado.	PIRIs				1,00	203.106.336,00	126.398.071,00		135.910.050,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Salud implementado.	PIRIs				1,00				57.432.250,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Justicia implementado.	PIRIs				1,00				25.563.865,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Finanzas implementado.	PIRIs				1,00				1.455.983,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio del Interior implementado.	PIRIs				1,00				5.823.933,00
Administración del Proyecto									
Equipo de Gestión	N/A					224.101,00	87.807,00		906.080,00
Auditorías Concurrentes	N/A					110.000,00	42.000,00		400.000,00
Evaluación Ex post	N/A								150.000,00
TOTAL						203.690.437,00	126.902.878,00		251.456.081,00
