

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo: 2653/OC-EC
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): EC-T1228
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 250.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 129.000.000,00
% Desembolsado: 51,60
Saldo: 121.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original: 250.000.000,00
Actual BID: 250.000.000,00
Pari-passu: 99,00
Co-financiamiento/País: 1.456.080,00
Estimado Original: 251.456.080,00
Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012
Validado por Representante de País: 28-sep-2012

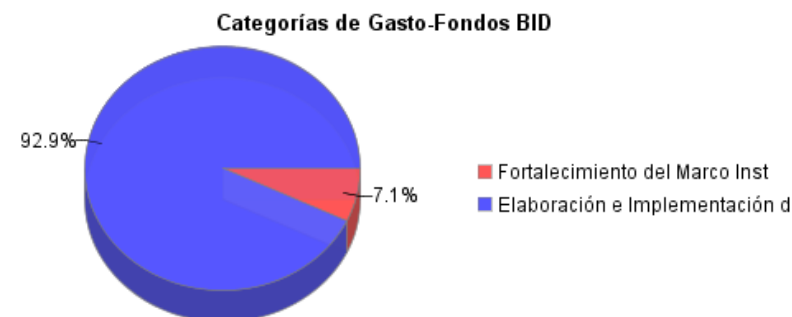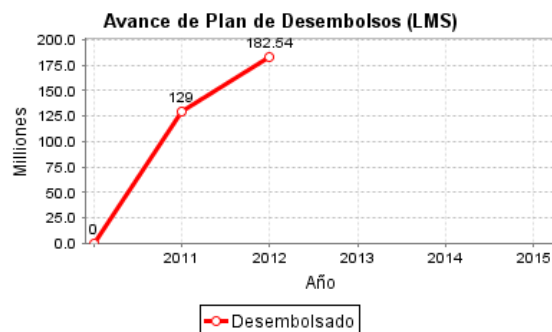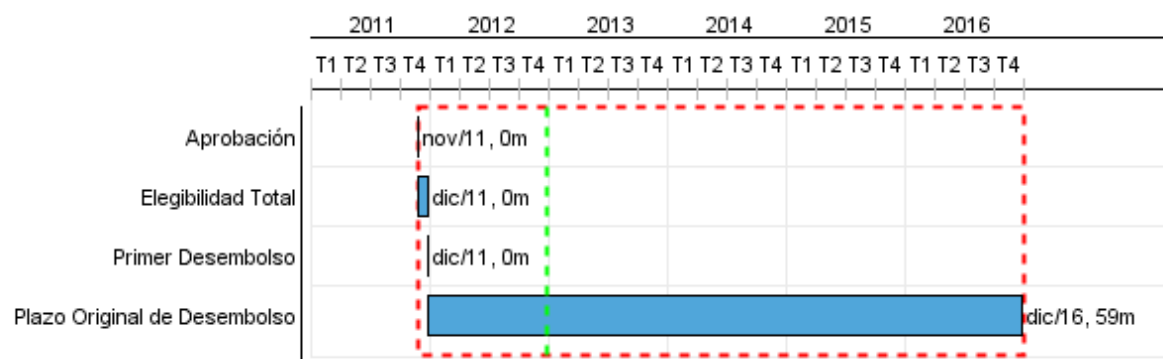

Progreso Acumulado al 2012

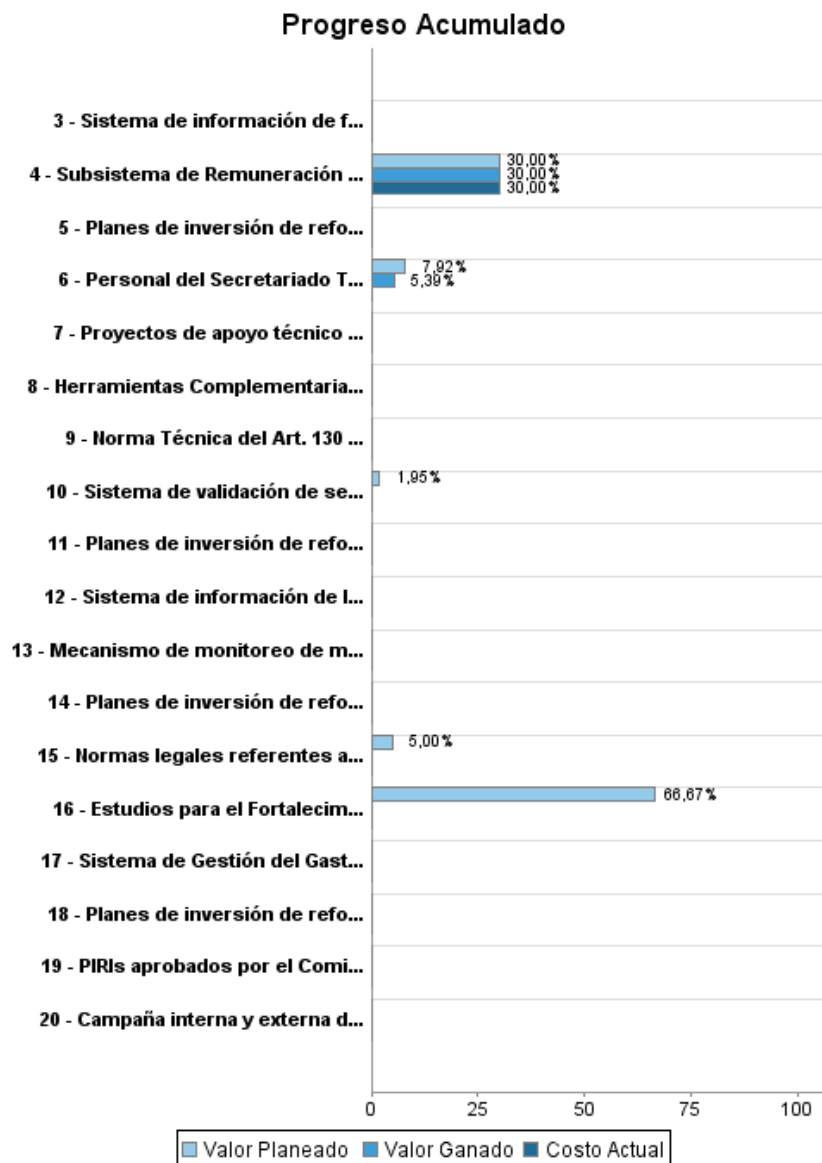


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

EC-L1094 - Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 28/09/2012

Progreso Acumulado

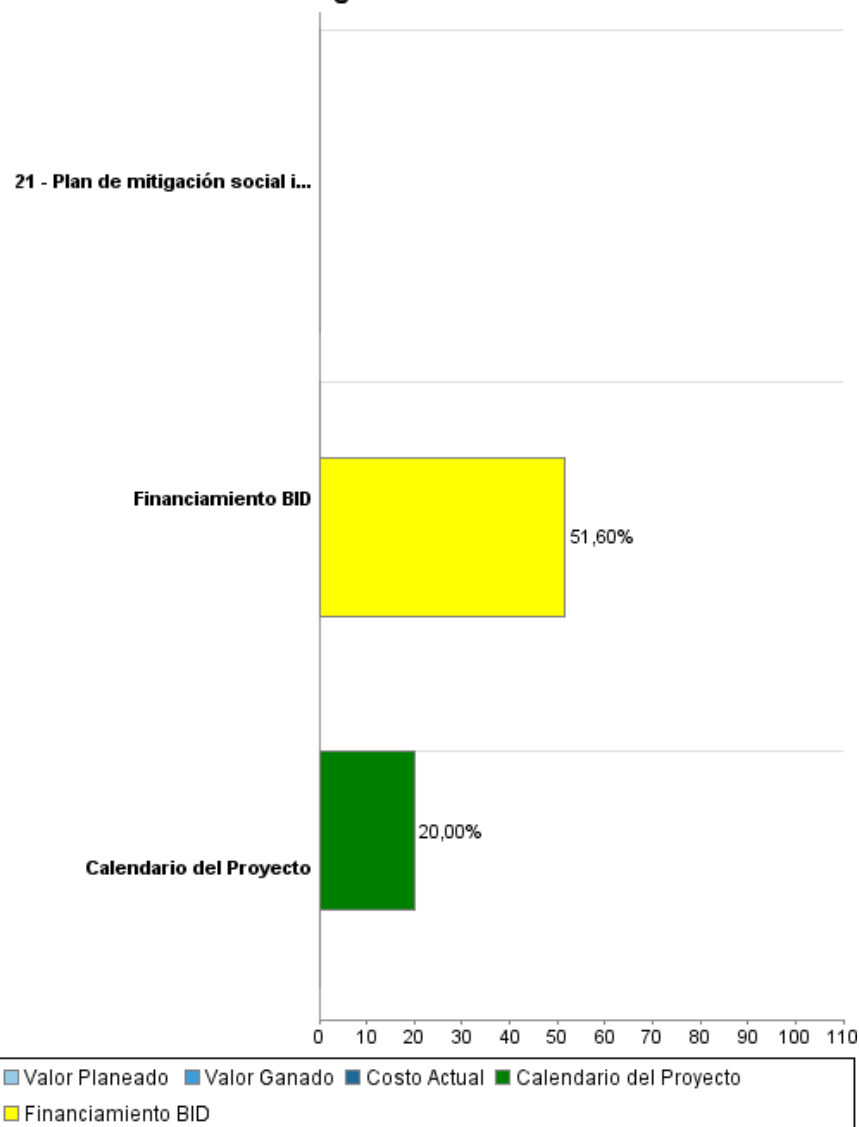

Resultados

Resultado: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.40	2008	P A	0.60

Resultado: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice de coherencia del Servicio Civil	Índice	0.13	2011	P A	0.30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Índice	0.28	2011	P A	0.45
Mérito del Servicio Civil	Índice	0.33	2011	P A	0.55

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				
Sistema de Gestión del Gasto (Planificación, Inversión y Presupuesto) ajustados para interoperar el monitoreo del Plan de Inversiones (PAI)	Sistema				2,00				
Sistema de información de funciones del Estado que evite sobreposición de funciones implementado,	Sistema				1,00				400.000,00
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación, simplificadas.	Normas	17,00			34,00	20.000,00			400.000,00
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida (incluye talleres)	Campaña				1,00				700.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración diseñadas	Herramientas				3,00				355.000,00
Personal del Secretariado Técnico del Comité capacitado	Funcionarios	50,00	34,00		92,00	8.000,00			101.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				10,00				7.900.000,00
Sistema de información de la Gestión del Talento Humano (TH) implementado	Sistema				1,00				2.100.000,00
Proyectos de apoyo al fortalecimiento del servicio civil implementados	Proyecto				3,00				768.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				2.500.000,00
Sistema de validación de selección de personal implementado	Sistema				1,00	22.000,00			1.130.000,00
Norma Técnica del Art. 130 de la LOSEP elaborada	Norma								
Subsistema de Remuneración Variable de la Función Ejecutiva implementado	Subsistema				1,00		375.000,00		1.250.000,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios	1,00			3,00	200.000,00			300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
PIRIs aprobados por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional.	PIRIs				9,00				5.909.920,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Educación implementado.	PIRIs				1,00	203.106.336,00	126.398.071,00		135.910.050,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Salud implementado.	PIRIs				1,00				57.432.250,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Justicia implementado.	PIRIs				1,00				25.563.865,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Finanzas implementado.	PIRIs				1,00				1.455.983,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio del Interior implementado.	PIRIs				1,00				5.823.933,00
Administración del Proyecto									
Equipo de Gestión	N/A					224.101,00	87.807,00		906.080,00
Auditorías Concurrentes	N/A					110.000,00	42.000,00		400.000,00
Evaluación Ex post	N/A								150.000,00
TOTAL						203.690.437,00	126.902.878,00		251.456.081,00
