
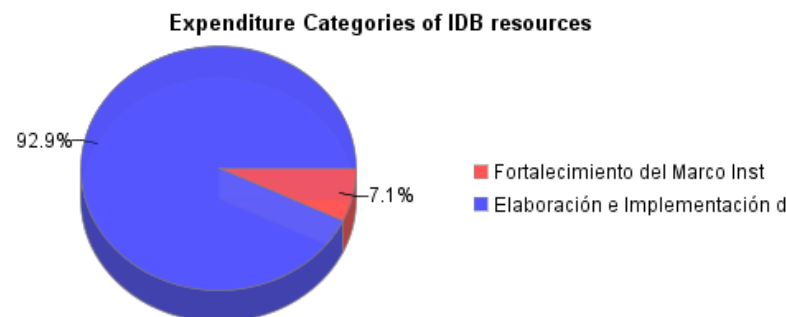
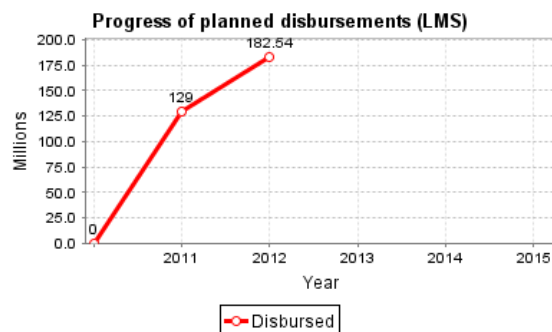



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Loan Number(s):	2653/OC-EC	Current Approved Amount:	250.000.000,00	Original IDB:	250.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	129.000.000,00	Current IDB:	250.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	51,60	Pari-passu:	99,00
Related Operation(s):	EC-T1228	Balance:	121.000.000,00	Co-Financing/Country:	1.456.080,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	251.456.080,00
				Amortization Period (months):	234


Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 28-sep-2012 Validated by Country Representative: 28-sep-2012

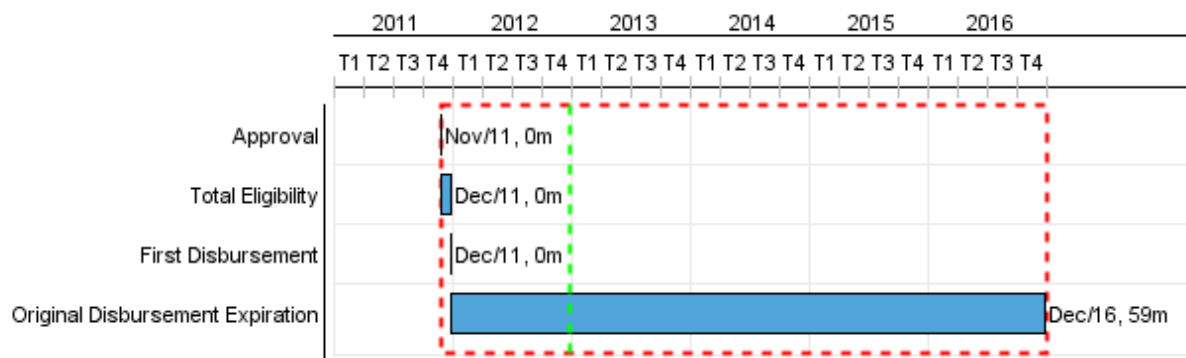

Accumulated Progress as of 2012

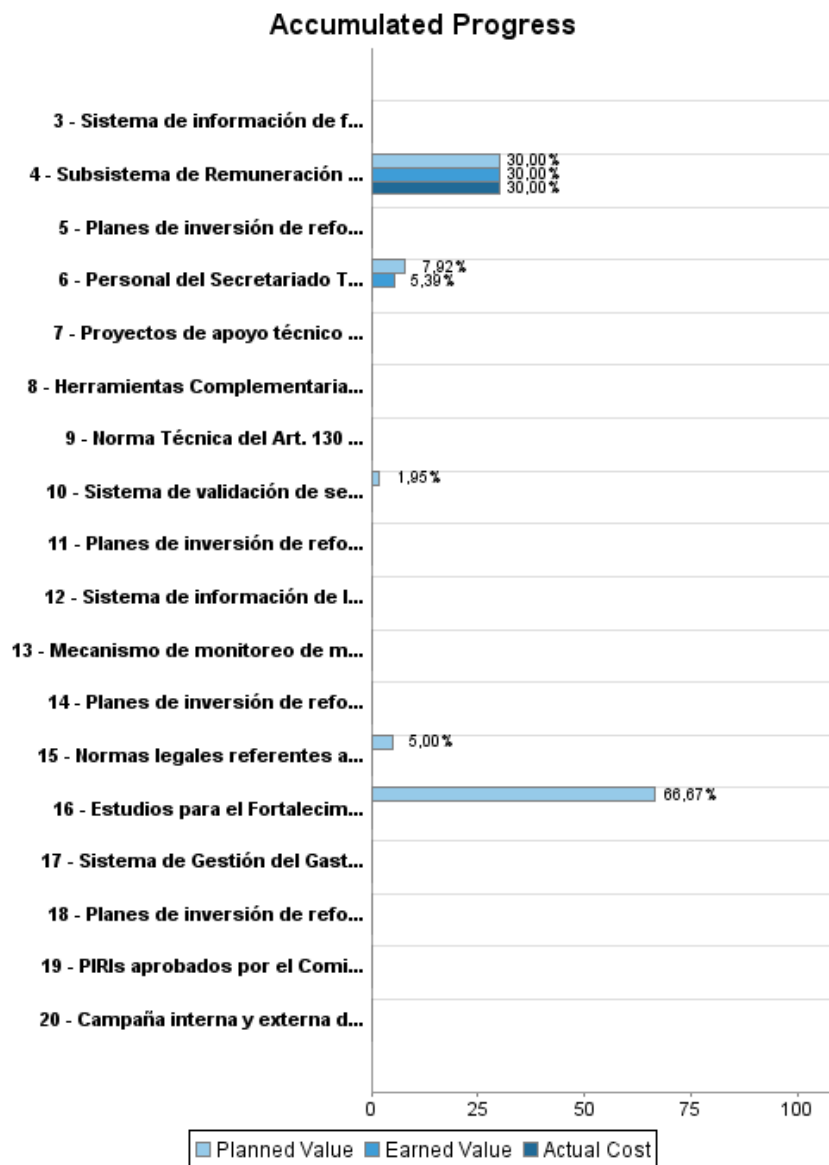

Accumulated Progress

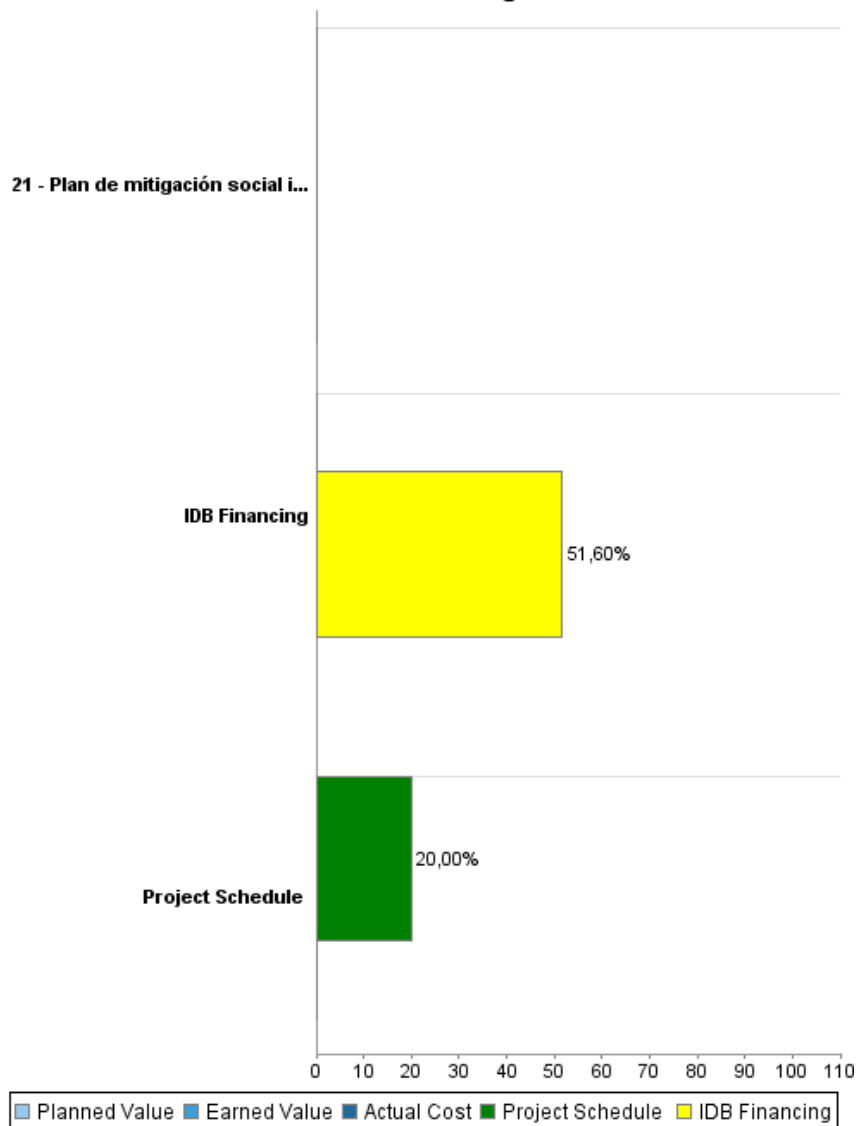

Outcomes

Outcome: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Indice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.40	2008	P A	0.60

Outcome: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Indice de coherencia del Servicio Civil	Indice	0.13	2011	P A	0.30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Indice	0.28	2011	P A	0.45
Mérito del Servicio Civil	Indice	0.33	2011	P A	0.55

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				
Sistema de Gestión del Gasto (Planificación, Inversión y Presupuesto) ajustados para interoperar el monitoreo del Plan de Inversiones (PAI)	Sistema				2,00				
Sistema de información de funciones del Estado que evite sobreposición de funciones implementado,	Sistema				1,00				400.000,00
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación, simplificadas.	Normas	17,00			34,00	20.000,00			400.000,00
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida (incluye talleres)	Campaña				1,00				700.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración diseñadas	Herramientas				3,00				355.000,00
Personal del Secretariado Técnico del Comité capacitado	Funcionarios	50,00	34,00		92,00	8.000,00			101.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				10,00				7.900.000,00
Sistema de información de la Gestión del Talento Humano (TH) implementado	Sistema				1,00				2.100.000,00
Proyectos de apoyo al fortalecimiento del servicio civil implementados	Proyecto				3,00				768.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				2.500.000,00
Sistema de validación de selección de personal implementado	Sistema				1,00	22.000,00			1.130.000,00
Norma Técnica del Art. 130 de la LOSEP elaborada	Norma								
Subsistema de Remuneración Variable de la Función Ejecutiva implementado	Subsistema				1,00		375.000,00		1.250.000,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios	1,00			3,00	200.000,00			300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
PIRIs aprobados por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional.	PIRIs				9,00				5.909.920,00

PROGRESS MONITORING REPORT

EC-L1094 - Public Administration Institutional Reform Program
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 28/09/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Educación implementado.	PIRIs				1,00	203.106.336,00	126.398.071,00		135.910.050,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Salud implementado.	PIRIs				1,00				57.432.250,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Justicia implementado.	PIRIs				1,00				25.563.865,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Finanzas implementado.	PIRIs				1,00				1.455.983,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio del Interior implementado.	PIRIs				1,00				5.823.933,00
Administración del Proyecto									
Equipo de Gestión	N/A					224.101,00	87.807,00		906.080,00
Auditorías Concurrentes	N/A					110.000,00	42.000,00		400.000,00
Evaluación Ex post	N/A								150.000,00
TOTAL						203.690.437,00	126.902.878,00		251.456.081,00
