













































































ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half		1st Half	
						Qtr 1		Qtr 3	Qtr 1
1		Proyecto "Consolidación de la Gestión Tributaria y Aduanera"	1450 days	Wed 10/1/14	Wed 4/22/20				
2		INICIO	1 day	Wed 10/1/14	Thu 10/2/14				
3		Componente 01: Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero de administrados a nivel nacional	1300 days	Thu 10/2/14	Thu 9/26/19				
4		Subcomponente 1.1 Mejoramiento del Control Tributario	1300 days	Thu 10/2/14	Thu 9/26/19				
5		Servicio de consultoría para el modelamiento y desarrollo del sistema de Cuenta Única	59 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/26/19				
6		Servicio de consultoría para el modelamiento y desarrollo del sistema de Gestión Inductiva	59 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/26/19				
7		Servicio de consultoría para el modelamiento y desarrollo del sistema de Gestión de Riesgos	59 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/26/19				
8		Hardware (72 Cores al 2014)	6 mons	Thu 10/2/14	Thu 3/19/15				
9		Hardware (34 Cores del 2015 al 2017)	32 mons	Thu 3/19/15	Thu 8/31/17				
10		Software (72 Cores al 2014)	6 mons	Thu 10/2/14	Thu 3/19/15				
11		Software (34 Cores del 2015 al 2017)	32 mons	Thu 3/19/15	Thu 8/31/17				
12		Solución informática - CRM	6 mons	Thu 10/2/14	Thu 3/19/15				
13		Solución informática - Gestión de Riesgo	6 mons	Thu 10/2/14	Thu 3/19/15				
14		Subcomponente 1.2 Mejoramiento del control aduanero	720 days	Thu 10/2/14	Thu 7/6/17				
15		Embarcaciones	380 days	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16				
16		Embarcación Marítima	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16				
17		Embarcación Fluvial	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16				
18		Embarcación Lacustre	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16				

Project: VII PEP Date: Tue 4/29/14	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	



















ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half			1st Half		
						Qtr 1			Qtr 3		Qtr 1
19		Equipos de inspeccion no intrusivos	380 days	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16						
20		Scanvan	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16						
21		Detector de trazas	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16						
22		Identificador de químicos	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16						
23		Kit Anticontrabando	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16						
24		ZVB	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16						
25		Servicio - Diseño de Gestión Coordinadas de Fronteras	720 days	Thu 10/2/14	Thu 7/6/17						
26		Protocolo para la actuación coordinada en Fronteras.	36 mons	Thu 10/2/14	Thu 7/6/17						
27		Mapeo y Adecuación de los procesos para aplicar la GCF.	20 mons	Thu 10/2/14	Thu 4/14/16						
28		Modelo e implantación del Tránsito Internacional de Mercancías.	20 mons	Thu 10/2/14	Thu 4/14/16						
29		Identificación de los riesgos para el control en fronteras.	20 mons	Thu 10/2/14	Thu 4/14/16						
30		Soporte para revisión de la normativa OEA para la ampliación de sus ventajas	20 mons	Thu 10/2/14	Thu 4/14/16						
31		Consultoría para la capacitación de los equipos validadores OEA	20 mons	Thu 10/2/14	Thu 4/14/16						
32		pasantías como parte de la capacitación de los equipos validadores OEA	20 mons	Thu 10/2/14	Thu 4/14/16						
33		Identificación de requerimientos y diseño de la plataforma informática para la gestión del OEA.	20 mons	Thu 10/2/14	Thu 4/14/16						
34		Diseño y apoyo para desarrollar una estrategia de reconocimiento mutuo y su implantación con Colombia, Costa Rica y México.	20 mons	Thu 10/2/14	Thu 4/14/16						

Project: VII PEP
Date: Tue 4/29/14

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half			1st Half
						Qtr 1		Qtr 3	Qtr 1
35		Subcomponente 1.3 Mejoramiento de la arquitectura informática	380 days	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16				
36		Fortalecimiento de la Plataforma de Base de datos	380 days	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16				
37		Hardware (Servidores RISC, Switch SAN, servicios continuidad operativa)	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16				
38		Software (Licencias del sistema operativo, base de datos, servicios continuidad operativa)	19 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/1/16				
39		Soluciones continuas de alta Disponibilidad	120 days	Thu 12/24/15	Thu 6/9/16				
40		Hardware (Equipos de telecomunicaciones, servidores, servicio de continuidad operativa)	6 mons	Thu 12/24/15	Thu 6/9/16				
41		Software (licencias de plataforma, gestión, centrales telefónicas, video conferencia, servicio de continuidad operativa)	6 mons	Thu 12/24/15	Thu 6/9/16				
42		Implementación de un Centro de Monitoreo Predictivo	120 days	Thu 12/24/15	Thu 6/9/16				
43		Hardware (Servicios de Implementación de Infraestructura Física, servidores, Paneles)	6 mons	Thu 12/24/15	Thu 6/9/16				
44		Software (Licencias de plataforma, Servicios de Implementación de Procesos y Buenas Prácticas, servicios continuidad operativa)	6 mons	Thu 12/24/15	Thu 6/9/16				
45		Subcomponente 1.4 Línea de base	100 days	Thu 10/2/14	Thu 2/19/15				
46		Servicio de consultoría a suma alzada para el desarrollo de Línea de Base	5 mons	Thu 10/2/14	Thu 2/19/15				
47		Subcomponente 1.5 Gestión del Proyecto - SUNAT	1100 days	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				
48		Experto en adquisiciones A	55 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				
49		Experto en adquisiciones B	55 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				
50		Experto financiero-contable	55 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				



















Project: VII PEP
Date: Tue 4/29/14

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	



















ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half		1st Half	
						Qtr 1		Qtr 3	Qtr 1
51		Experto en ejecución contractual	55 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				
52		Experto técnico	55 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				
53		Servicios de abogado (tiempo parcial)	55 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				
54		Experto en servicios informáticos (tiempo parcial)	55 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				
55		Apoyo administrativo	55 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/20/18				
56		Aseguramiento de la calidad	47 mons	Thu 3/19/15	Thu 10/25/18				
57		Desarrollo de software de gestión del proyecto ajustado a requerimientos	16 mons	Thu 10/2/14	Thu 12/24/15				
58		Componente 02: Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria y municipal	1361 days	Wed 10/1/14	Thu 12/19/19				
59		Subcomponente 2.1 Mejora del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM	1361 days	Wed 10/1/14	Thu 12/19/19				
60		Recurso Humano	1021 days	Wed 1/20/16	Thu 12/19/19				
61		Desarrollo	1020 days	Thu 1/21/16	Thu 12/19/19				
62		Asistente Soporte Administrativo (Desarrollo)	38 mons	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
63		Jefe de Desarrollo y Mantenimiento (Desarrollo)	38 mons	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
64		Analista Sistemas(Desarrollo) - 5personas	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
65		Programador Sistemas (Desarrollo) - 6personas	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
66		Arquitecto Web (Desarrollo)	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
67		Programador de Contenidos (Desarrollo)	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
68		Administrador de Base de Datos (Desarrollo)	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
69		Analista BI (Desarrollo) - 2 personas	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
70		Programador BI (Desarrollo) - 2personas	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
71		Arquitecto BI (Desarrollo)	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				

Project: VII PEP Date: Tue 4/29/14	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half		1st Half	
						Qtr 1		Qtr 3	Qtr 1
72		Documentador (Desarrollo) - 2 personas	760 days	Thu 1/21/16	Thu 12/20/18				
73		Ejecutor de Pruebas Web (Desarrollo)	13 mons	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
74		Ejecutor de Pruebas BI (Desarrollo)	13 mons	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
75		Administrador SRTM (Desarrollo)	20 mons	Thu 7/7/16	Thu 1/18/18				
76		Soporte Post productivo al desarrollo	500 days	Thu 1/18/18	Thu 12/19/19				
77		Asistente Soporte Administrativo (Soporte - post productivo)	13 mons	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
78		Jefe de Desarrollo y Mantenimiento (Soporte - post productivo)	13 mons	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
79		Analista Sistemas (Soporte - post productivo)	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
80		Programador Sistemas (Soporte - post productivo) - 2personas	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
81		Arquitecto Web (Soporte - post productivo)	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
82		Programador de Contenidos (Soporte - post productivo)	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
83		Administrador de Base de Datos (Soporte - post productivo)	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
84		Analista BI (Soporte - post productivo)	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
85		Programador BI (Soporte - post productivo) - 2personas	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
86		Arquitecto BI (Soporte - post productivo)	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
87		Documentador (Soporte - post productivo)	260 days	Thu 12/20/18	Thu 12/19/19				
88		Administrador SRTM (Soporte - post productivo)	260 days	Thu 1/18/18	Thu 1/17/19				
89		Capacitación	760 days	Thu 1/19/17	Thu 12/19/19				
90		Líder de Capacitación (Capacitación)	38 mons	Thu 1/19/17	Thu 12/19/19				

Project: VII PEP Date: Tue 4/29/14	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half			1st Half		
						Qtr 1			Qtr 3		Qtr 1
91		Analista de Capacitación (Capacitación) - 8personas	38 mons	Thu 1/19/17	Thu 12/19/19						
92		Mesa de Ayuda	500 days	Thu 1/19/17	Thu 12/20/18						
93		Jefe de Soporte y Mesa de Ayuda (Mesa ayuda)	12 mons	Thu 1/19/17	Thu 12/21/17						
94		Soporte técnico usuarios en sitio (Mesa de ayuda) - 8personas	12 mons	Thu 1/19/17	Thu 12/21/17						
95		Jefe de Soporte y Mesa de Ayuda (Mesa ayuda - post productivo)	13 mons	Thu 12/21/17	Thu 12/20/18						
96		Soporte técnico usuarios en sitio (Mesa de ayuda - post productivo) - 6personas	13 mons	Thu 12/21/17	Thu 12/20/18						
97		Operadores de Mesa de Ayuda (Mesa Ayuda - Post productivo) - 3personas	13 mons	Thu 12/21/17	Thu 12/20/18						
98		Gestión de Cambio	760 days	Wed 1/20/16	Wed 12/19/18						
99		Especialista de Gestión de Cambio (Gestión del cambio)	38 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/19/18						
100		Analista de Gestión de Cambio (Gestión del cambio)	38 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/19/18						
101		Especialista en comunicaciones (Gestión del cambio)	38 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/19/18						
102		Coordinación Técnica	1020 days	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
103		Jefe Oficina de Proyectos (PMO) - Coordinación técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
104		Analista de Rentas - Coordinación Técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
105		Analista de Catastro - Coordinación Técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
106		Especialista Tributario - Coordinación Técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						

Project: VII PEP Date: Tue 4/29/14	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half			1st Half		
						Qtr 1		Qtr 3		Qtr 1	
107		DBA - Coordinación Técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
108		Arquitecto de HW y SW - Coordinación Técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
109		Jefe Gestión de Cambio y Capacitación - Coordinación Técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
110		Jefe Desarrollo, Mantenimiento y Mesa de Ayuda - Coordinación Técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
111		Analistas de Sistemas - Coordinación Técnica	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
112		Supervisión	1020 days	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
113		Especialista en procesos	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
114		Especialista en TI	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
115		Especialista en Procedimientos Tributarios	51 mons	Wed 1/20/16	Wed 12/18/19						
116		Servidores	240 days	Wed 10/1/14	Wed 9/2/15						
117		Aplicaciones producción SRTM (Infraestructura)	8 mons	Thu 12/25/14	Thu 8/6/15						
118		Aplicaciones contingencia SRTM (Infraestructura)	8 mons	Thu 12/25/14	Thu 8/6/15						
119		BI - Reportes producción (Infraestructura)	8 mons	Thu 12/25/14	Thu 8/6/15						
120		Desarrollo SRTM (Infraestructura)	8 mons	Thu 11/27/14	Thu 7/9/15						
121		Pruebas SRTM (Infraestructura)	8 mons	Thu 11/27/14	Thu 7/9/15						
122		Desarrollo y Pruebas BI (Infraestructura)	8 mons	Thu 11/27/14	Thu 7/9/15						
123		Elaboración estudio definitivo y bases	12 mons	Wed 10/1/14	Wed 9/2/15						
124		Equipamiento y Mobiliario	240 days	Thu 12/25/14	Thu 11/26/15						
125		Switches Core (Infraestructura)	6 mons	Thu 12/25/14	Thu 6/11/15						
126		Switches de 24 puertos (Infraestructura)	6 mons	Thu 12/25/14	Thu 6/11/15						
127		Computadoras, Proyector multimedia y Multifuncional laser	9 mons	Thu 3/19/15	Thu 11/26/15						

Project: VII PEP Date: Tue 4/29/14	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half			1st Half
						Qtr 1		Qtr 3	Qtr 1
128		Discos SAS para ampliación de SAN (Infraestructura)	6 mons	Thu 3/19/15	Thu 9/3/15				
129		Módulos de escritorio (Infraestructura)	9 mons	Thu 3/19/15	Thu 11/26/15				
130		Software y licencias	360 days	Thu 1/22/15	Thu 6/9/16				
131		Herramienta de inteligencia de negocio (infraestructura)	13 mons	Thu 3/19/15	Thu 3/17/16				
132		Sistema Operativo Linux Red Hat para Servidores (infraestructura)	8 mons	Thu 3/19/15	Thu 10/29/15				
133		Base de datos Oracle (Mesa de ayuda)	8 mons	Thu 1/22/15	Thu 9/3/15				
134		Herramienta para Administración, Diseño y Modelado de datos (Desarrollo)	9 mons	Thu 4/16/15	Thu 12/24/15				
135		Herramienta para mesa de ayuda (Desarrollo)	9 mons	Thu 4/16/15	Thu 12/24/15				
136		Herramienta para BI (Desarrollo)	15 mons	Thu 4/16/15	Thu 6/9/16				
137		Subcomponente 2.2 Mejora de la gestión de la DGPIP - Procesos Optimizados y Adecuada Organización-DGPIP	1220 days	Thu 11/27/14	Thu 8/1/19				
138		Adecuada capacitación	1220 days	Thu 11/27/14	Thu 8/1/19				
139		consultoría Organizacional para la mejora de la DGPIP	16 mons	Thu 12/25/14	Thu 3/17/16				
140		Consultoría de Diseño de plan de capacitación	6 mons	Thu 11/27/14	Thu 5/14/15				
141		Programas de capacitación locales	42 mons	Thu 3/19/15	Thu 6/7/18				
142		Programas de capacitación en el extranjero	42 mons	Thu 5/14/15	Thu 8/2/18				
143		pasantías sectoriales	41 mons	Thu 7/9/15	Thu 8/30/18				
144		Programas a distancia	40 mons	Thu 7/7/16	Thu 8/1/19				

Project: VII PEP Date: Tue 4/29/14		Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
		Split		Inactive Task		Manual Summary	
		Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
		Summary		Inactive Summary		Finish-only	
		Project Summary		Manual Task		Deadline	
		External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Half		1st Half
						Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1
169		AE 2017	4.5 mons	Wed 3/14/18	Wed 7/18/18			
170		AE 2018	4.5 mons	Wed 3/13/19	Wed 7/17/19			
171		AE 2019	4.5 mons	Wed 12/18/19	Wed 4/22/20			
172		Seguimiento y evaluación del Proyecto	509 days	Wed 8/9/17	Mon 7/22/19			
173		Evaluación intermedia	3 mons	Wed 8/9/17	Tue 10/31/17			
174		Evaluación final	5.05 mons	Mon 3/4/19	Mon 7/22/19			



Project: VII PEP

Date: Tue 4/29/14

Task

External Milestone

Manual Summary Rollup

Split

Inactive Task

Manual Summary

Milestone

Inactive Milestone

Start-only

Summary

Inactive Summary

Finish-only

Project Summary


Manual Task

Deadline

External Tasks


Duration-only

Progress

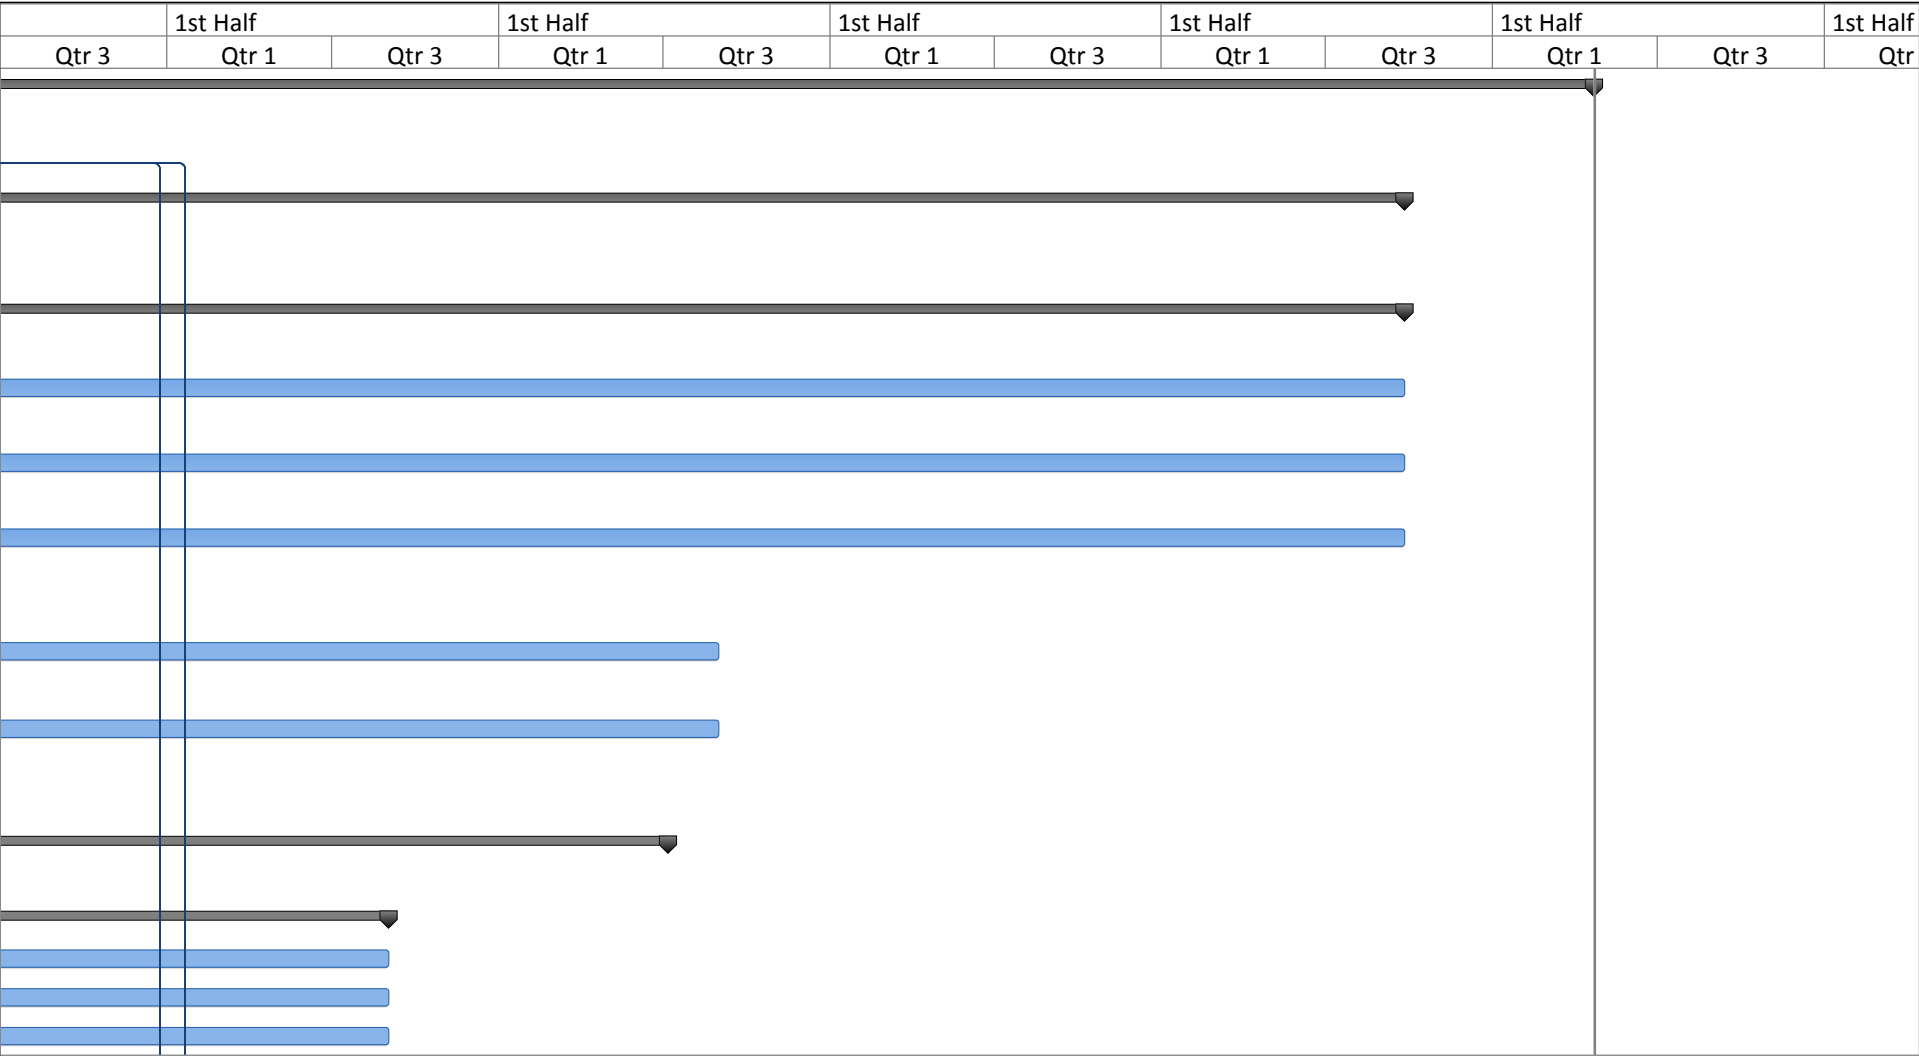


Project: VII PEP
Date: Tue 4/29/14

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

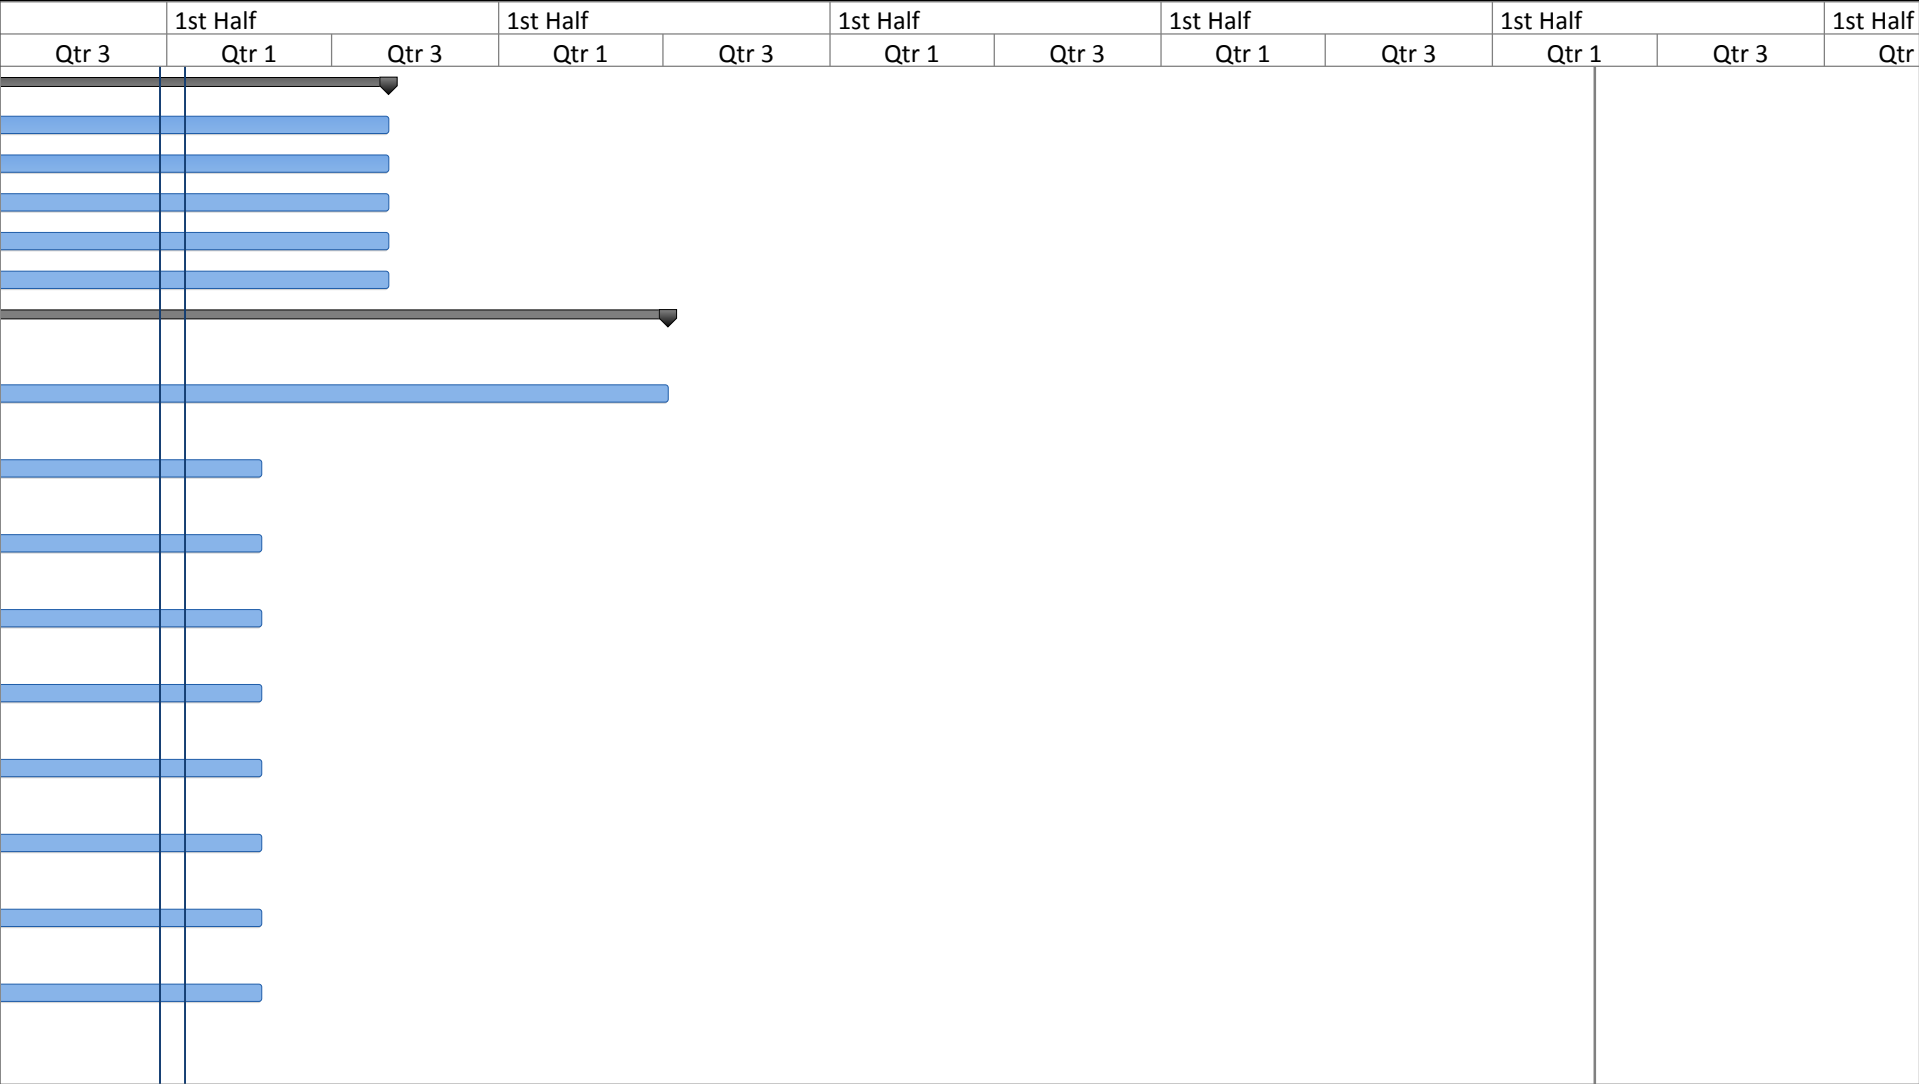


Project: VII PEP
Date: Tue 4/29/14

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

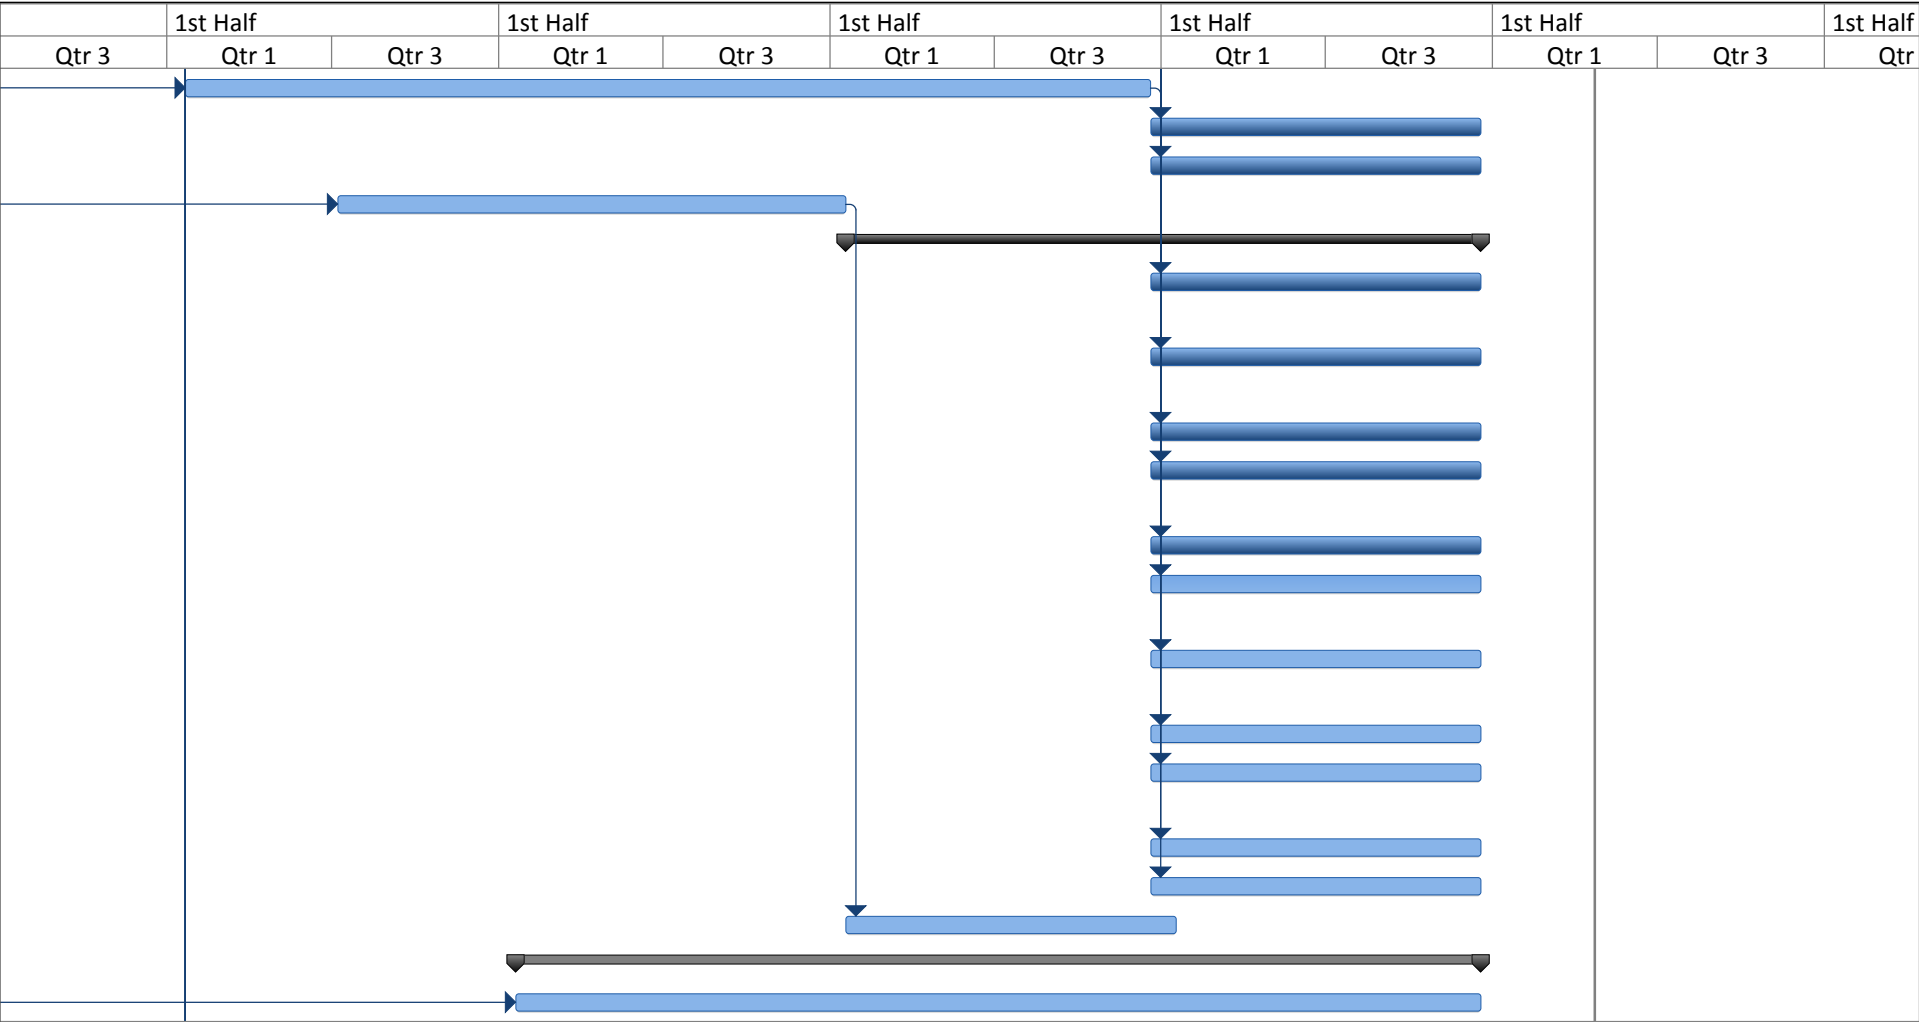


Project: VII PEP
Date: Tue 4/29/14

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

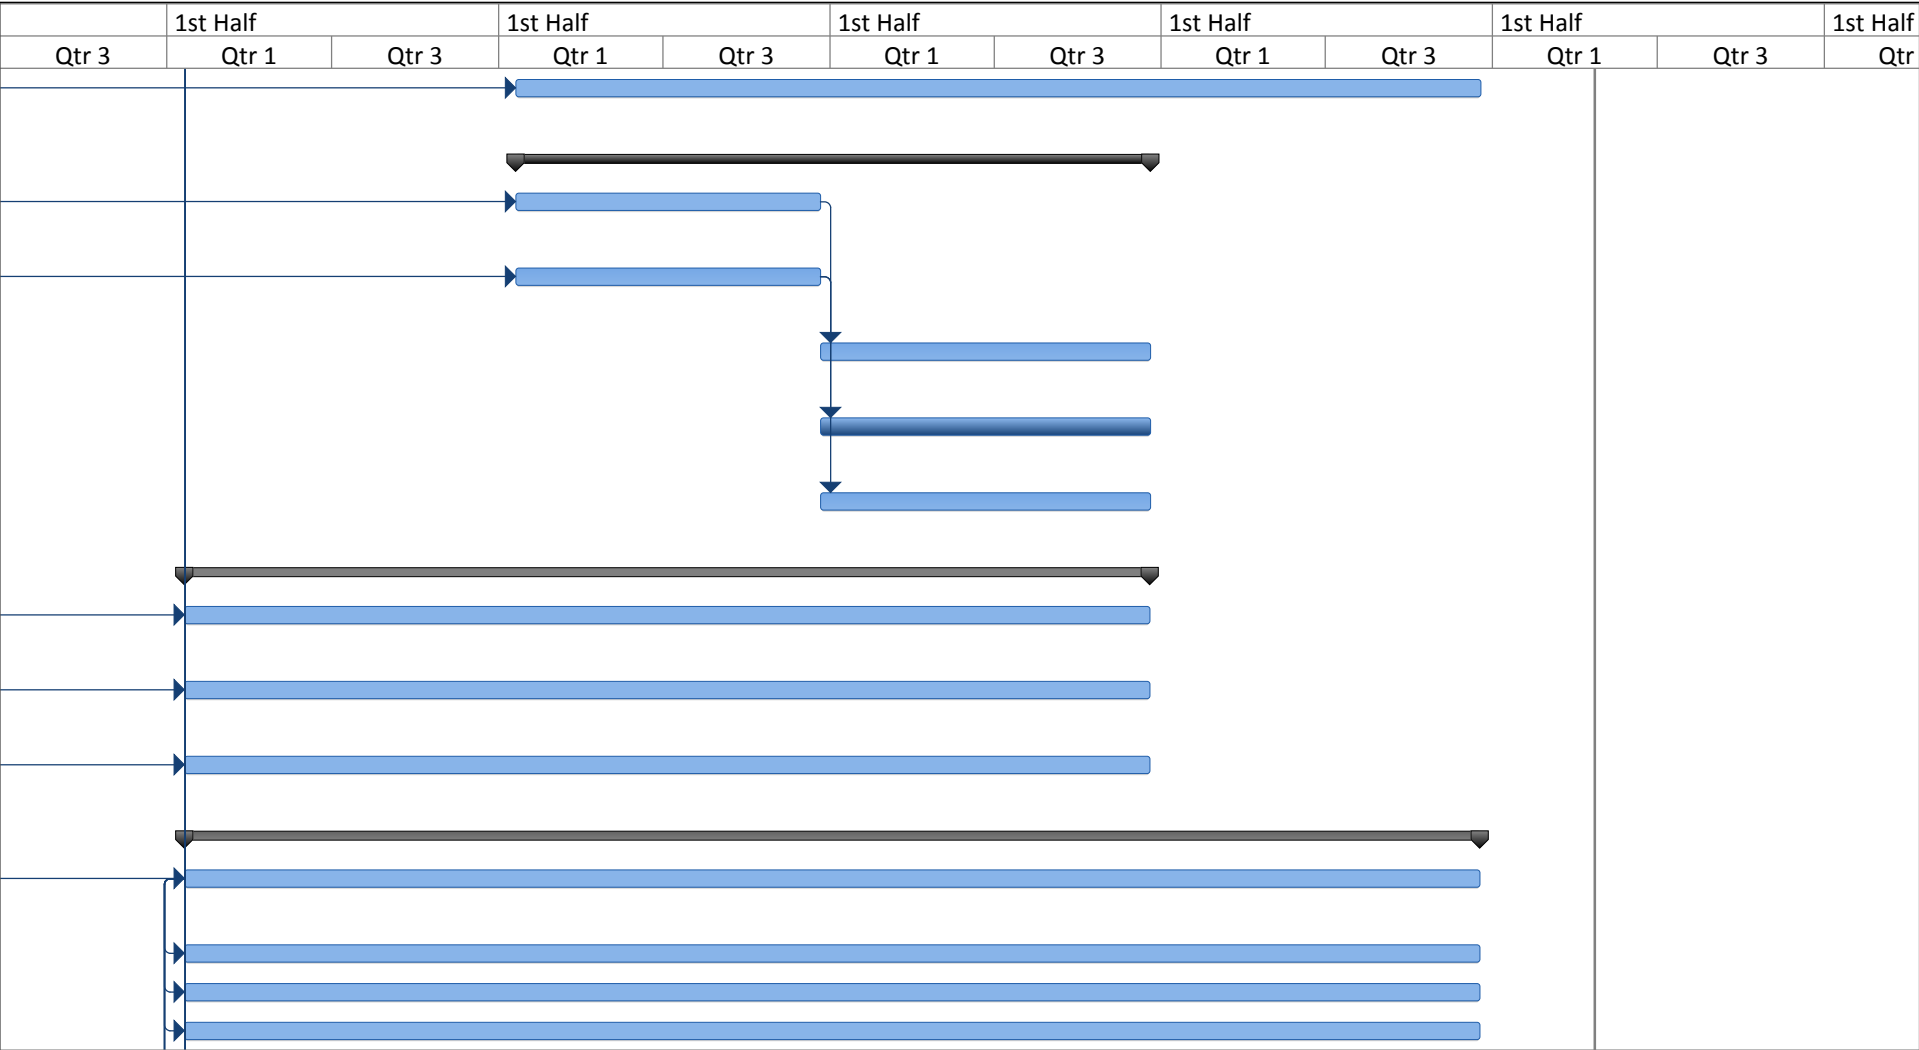


Project: VII PEP Date: Tue 4/29/14	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

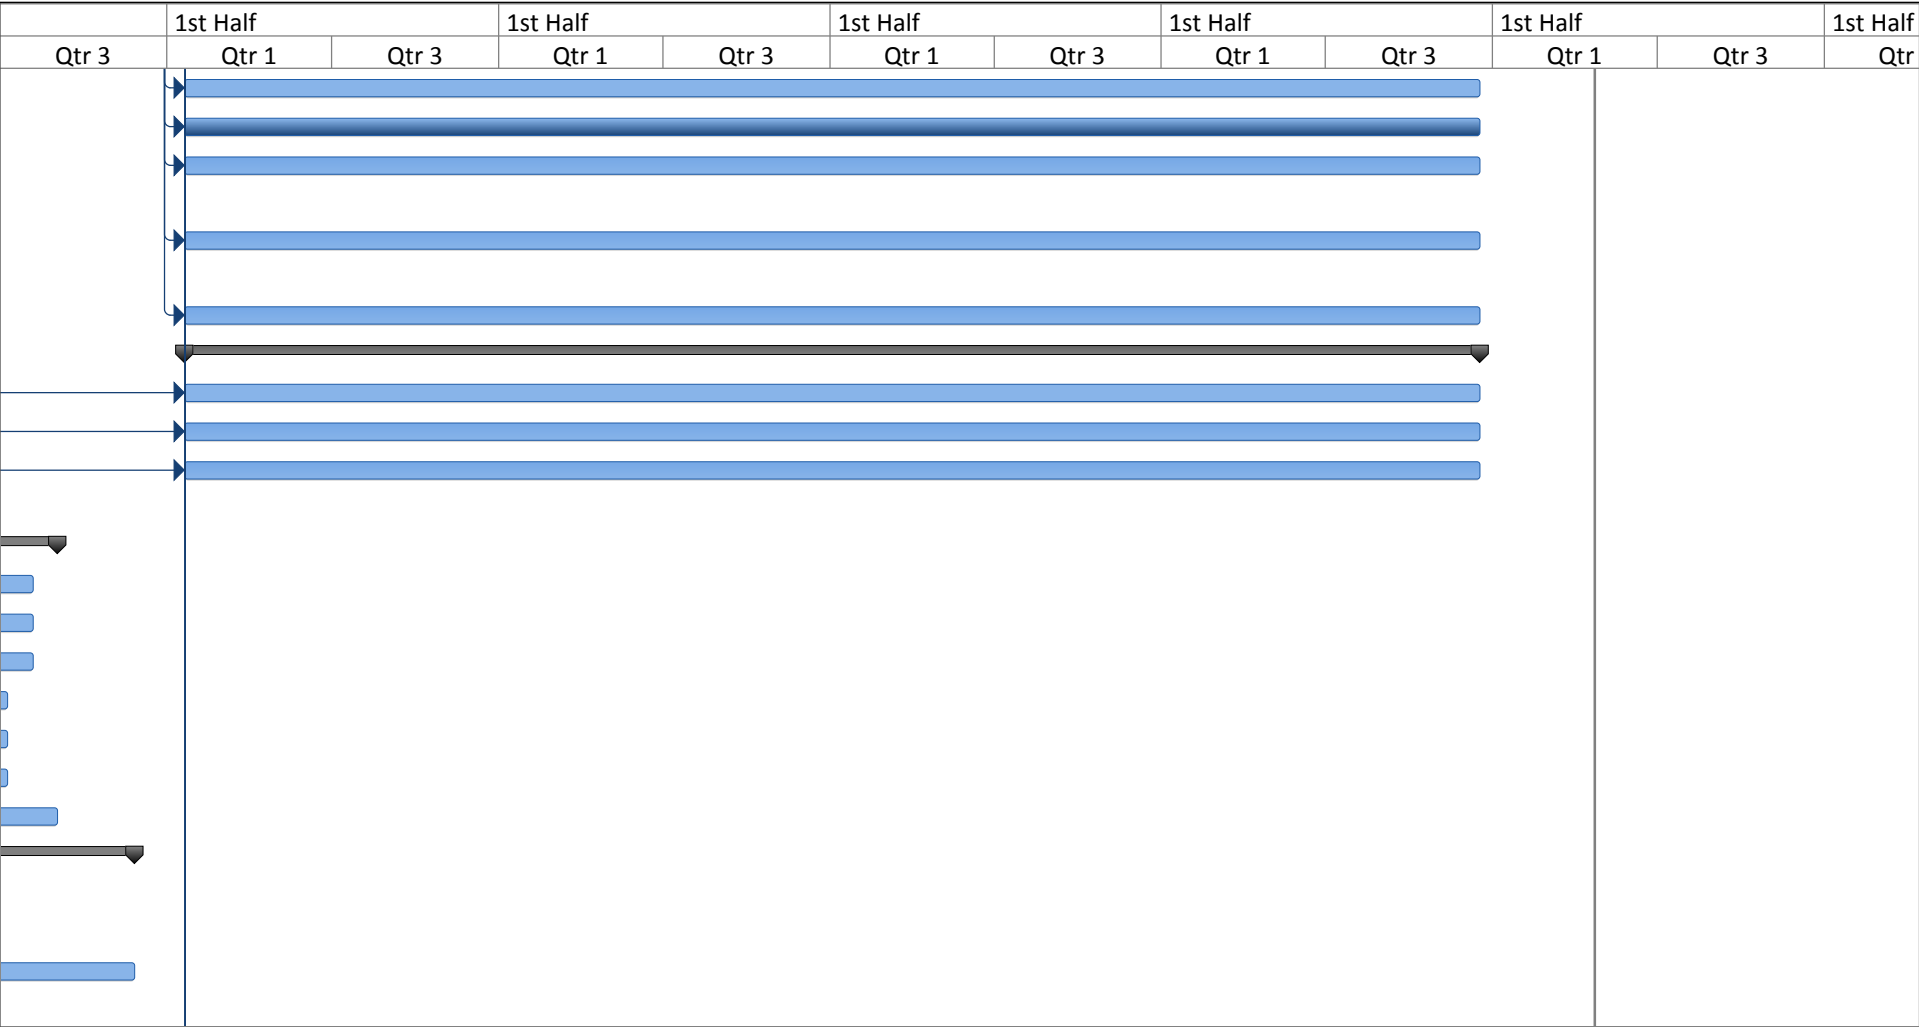

Project: VII PEP
Date: Tue 4/29/14

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

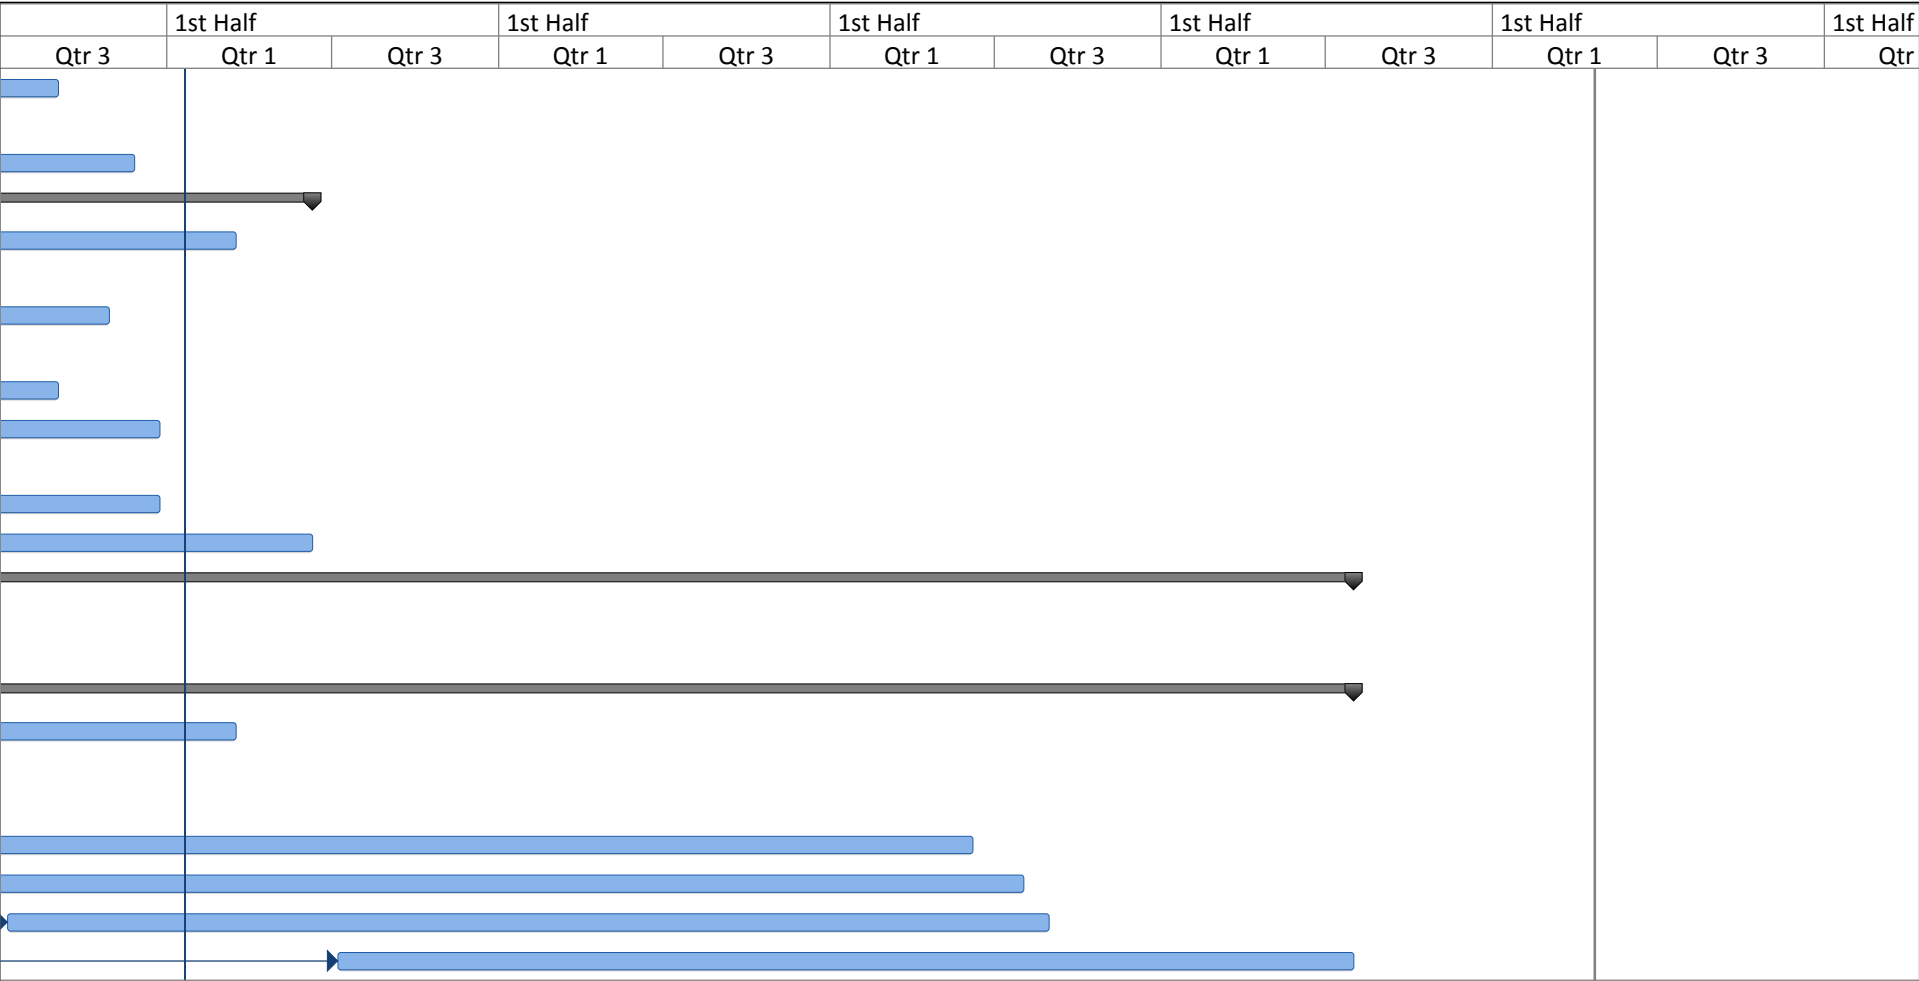

Project: VII PEP
Date: Tue 4/29/14

Task


Split


Milestone


Summary


Project Summary


External Tasks














External Milestone


Inactive Task


Inactive Milestone


Inactive Summary


Manual Task


Duration-only














Manual Summary Rollup


Manual Summary


Start-only


Finish-only


Deadline


Progress




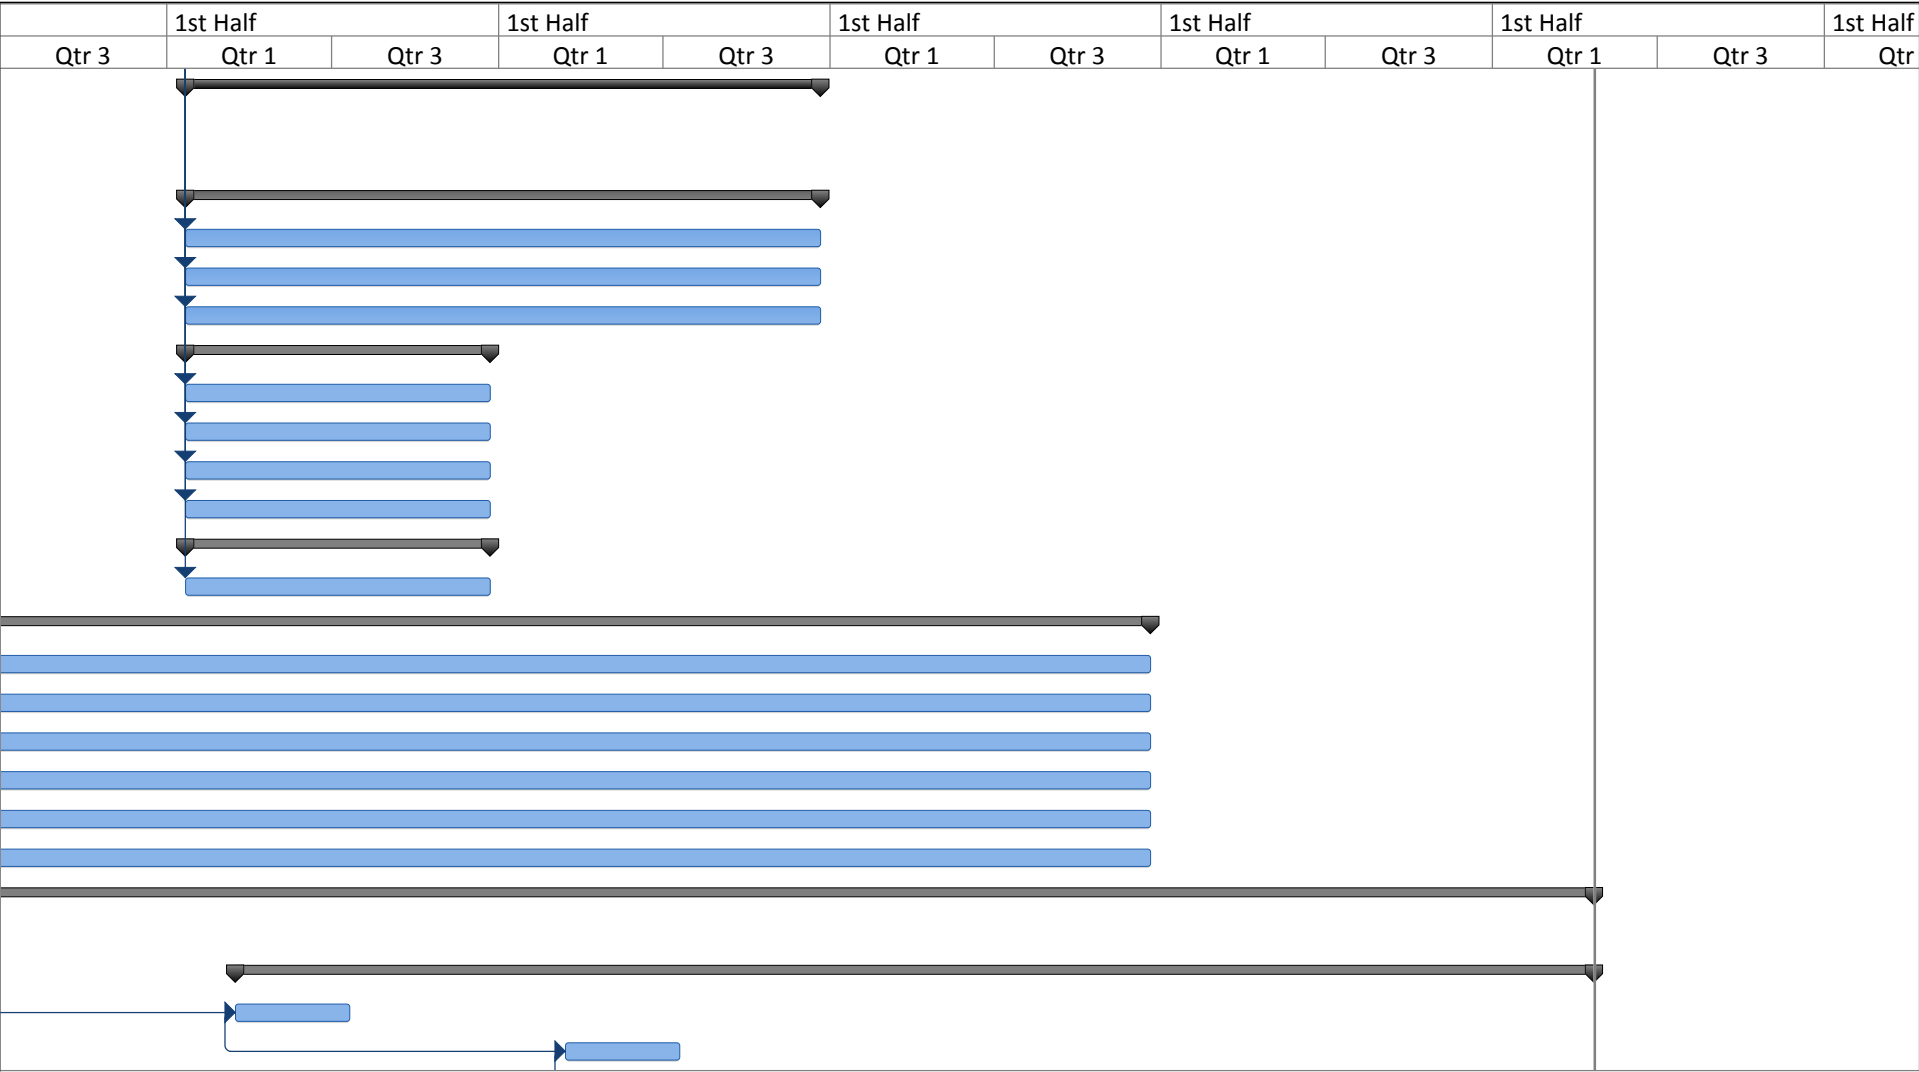













Project: VII PEP
Date: Tue 4/29/14

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

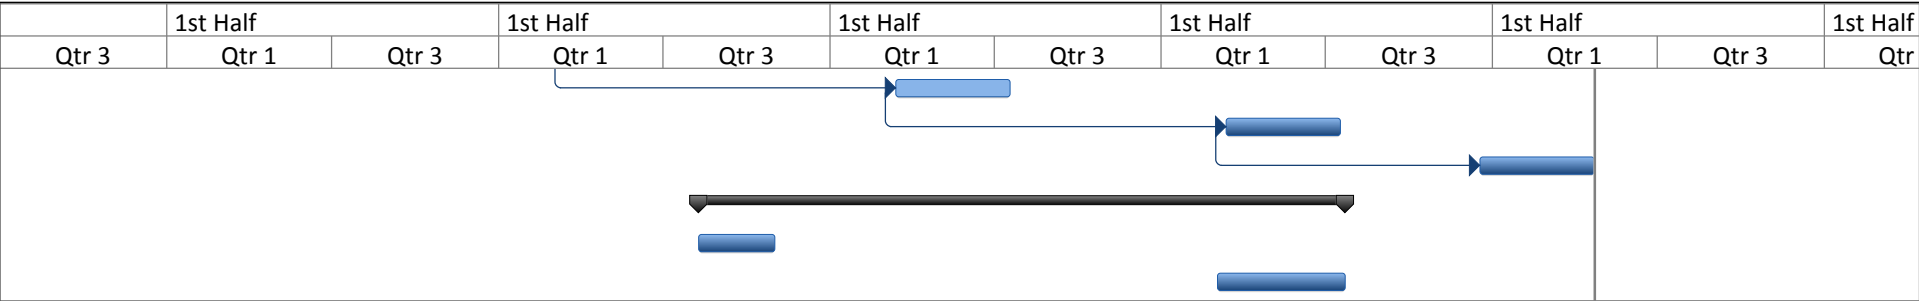

Project: VII PEP Date: Tue 4/29/14	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	
