

PROJECT STATUS REPORT (CANCELLATION)

JANUARY 2011 - JUNE 2011

SECTION 1: PROJECT SUMMARY

PROJECT NAME: Promoting Diaspora and Local Support for Productive Initiatives

Project Number: RG-M1069 - Operation Number: ATN/ME-9732-RG

Purpose:

The purpose of the Program is to develop transnational linkages to foster local productive development among communities throughout the participating countries.

Country Administrator
UNITED STATES

Beneficiary Country
ARGENTINA, DOMINICAN REPUBLIC, EL
SALVADOR, GUATEMALA, MEXICO,
NICARAGUA


Group
FCD - Financial Sector and Capital
Markets

Subgroup
REMS - Remittances



Executing Agency: Hispanics in Philanthropy

Design Team Leader: Shepherd, Daniel
Supervision Team Leader: Peinado-Vara, Estrella


TIMELINE




FUNDS

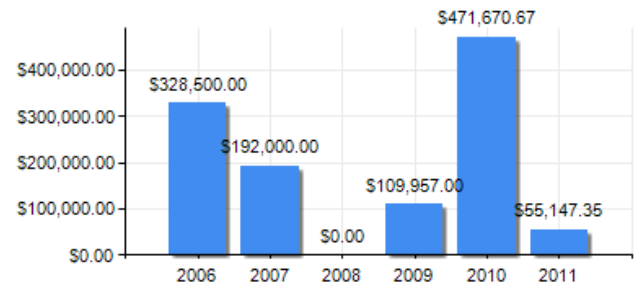

PERFORMANCE SCORE




Current score: Unsatisfactory: 1.895
MIF Average: 2.476

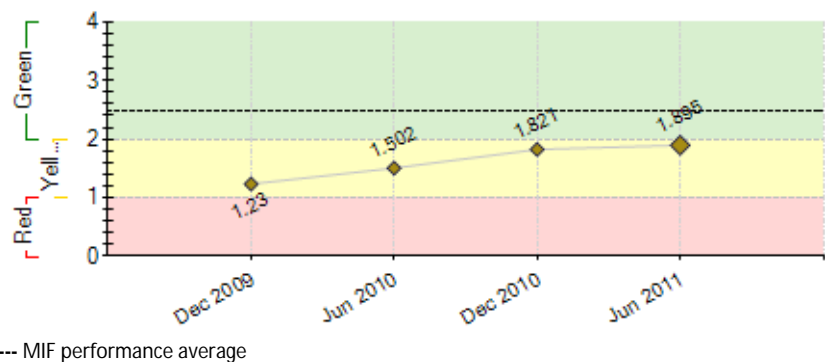

EXTERNAL RISKS

INSTITUTIONAL CAPACITY

Risk
Financial Management: 0
Procurement: 0
Technical Capacity: 0

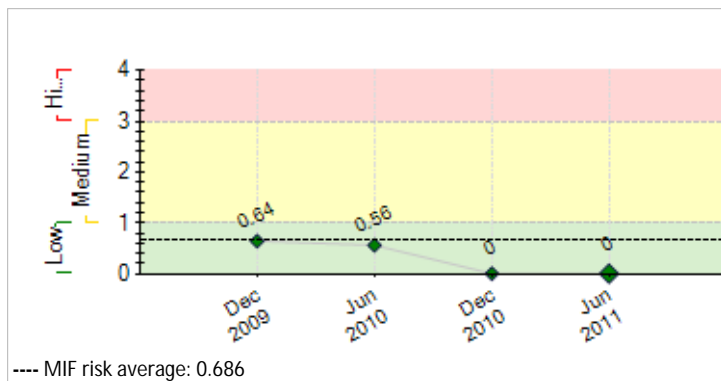

SECTION 2: PERFORMANCE

Summary of project performance since inception

Desde el inicio del programa hasta junio del 2010 el programa tuvo un desempeño medianamente satisfactorio. Sin embargo de julio de 2010 hasta el día de hoy el desempeño ha mejorado significativamente logrando un desempeño satisfactorio y cumpliendo de forma exitosa los hitos establecidos en la fase de cierre.

1. Se logró recaudar un fondo por \$1, 155,535 dólares o 60% de la meta original.
2. Se financiaron 6 iniciativas productivas en Argentina, Republica Dominicana y Mexico, con un promedio de financiación de \$150,000 dólares.
3. Cuatro comités de donantes locales establecidos en Argentina, Guatemala, México y República Dominicana
4. Seis rondas de donativos en cinco países.
5. 162 propuestas recibidas.
6. 58 visitas en sitio como parte del proceso de selección.
7. Cuatro eventos regionales para anunciar el programa (Nueva York, Buenos Aires, Guanajuato y Guatemala. Un evento con la diáspora y un evento para difundir los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas del programa.
8. Dos publicaciones: Desarrolla tu Mundo Seis Estudios de Caso y Opportunities and Challenges Facing Diaspora-Inclusive Productive Initiatives in Latin America.

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

Este constituye su PSR final. Desde Julio 2006 el proyecto tuvo un desempeño pobre dada la falta de capacidad del Ejecutor para manejar un proyecto de esta magnitud, no logrando los objetivos propuestos. Tras la evaluación intermedia, se acordó por lo tanto la cancelación parcial de recursos de la contribución tras un período de wind down a fin de honrar los compromisos acordados y realizar tareas de diseminación, que se realizaron adecuadamente según se acordó.

Summary of project performance in the last six months

Durante este último periodo del programa se tuvo un desempeño satisfactorio. Las actividades planteadas para este semestre se completaron. Las actividades realizadas fueron la evaluación final de Crece Guanajuato, las auditorías de los proyectos en República Dominicana y Mexico. Así mismo se llevó a cabo el evento Migration, Economic Opportunities and Social Investments: Past and Future donde se presentaron los resultados obtenidos y dos publicaciones; **Desarrolla tu Mundo Seis Estudios de Caso**, donde se recopila la experiencia de los proyectos financiados bajo el programa cuyo principal objetivo es presentar los logros, desafíos y próximos pasos y **Opportunities and Challenges Facing Diaspora-Inclusive Productive Initiatives in Latin America** la cual analiza un tipo específico de involucramiento de las diásporas con sus comunidades, en particular la inversión como método mitigante ante la migración. El simposio contó con la participación de representantes de WOLA, Oxfam Mexico, Western Union Foundation, Woodrow Wilson Center, COFEM, Nalac, entre otros. Gustavo Arnavat, United States Executive Director para el Banco Interamericano de Desarrollo, acudió al evento como orador invitado. Se tuvo una audiencia de 70 personas. Actividades de cierre como informe financiero y auditoría final, están en curso.

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

El ejecutor ha realizado las actividades de cierre propuestas en tiempo y forma. El presente constituye su PSR final, quedando pendientes solo la presentación de informe financiero y auditoría final, que se encuentran en realización.

SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators		Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
Purpose: The purpose of the Program is to develop transnational linkages to foster local productive development among communities throughout the participating countries.	P.I1	Number of jobs created.	0			3000	711	
	P.I2	New community-based business established.	0			0	6	
	P.I3	Percentage of increase in the performance (annual sales indicators) of micro and SMEs participating in the project.	0			0	20	
	P.I4	Number of projects supported with alliances forged with community emigrants that have become involved with the development of their communities of origin.	0			33	7	
	P.I5	Value in US\$ million raised from diaspora organizations/individuals and other foundations to support communities in the region.	0			2.3	1.3	
Component 1: Promotion and awareness-raising for productive	C.I.1	Number of countries with a local program site committee and structure established.	0	2	3	6	4	Finished
				Jul 2007	Jul 2008	Jul 2009	Jun 2010	

development support. Weight: 2% Classification: Unsatisfactory	C1.12 Number of people/organizations involved in the transfer of skills,	0				1200 Jul 2011	800 Dec 2009	Finished
	C1.13 Number of means for promotion and outreach activities included in the program (websites, published in local newspapers, existing newsletter emailed monthly to HIP's 450 members, etc.).	0					700	Finished
	C1.14 Number of means for promotion and outreach activities included in the program (websites, published in local newspapers, existing newsletter emailed monthly to HIP's 450 members, etc.).	0				Jul 2011 3 Jul 2009	Dec 2009 5 Dec 2009	Finished

Component 2: Grant Fund to Support to Productive Community Initiatives Weight: 81% Classification: Very Unsatisfactory	C2.11 Number of grants with transnational elements approved (cumulative).	0	8 Jul 2007	18 Jul 2008	30 Jul 2009	33 Jul 2010	6 Jun 2010	Finished
---	--	---	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------

Component 3: Monitoring, Evaluation and Dissemination of the Results Weight: 17% Classification: Satisfactory	C3.11 Percentage of the beneficiary entities that have institutionalized a monitoring for results scheme that will permit them to measure the achievements and milestones and to undertake the necessary adjustments during the implementation in order to maximize the effectiveness in the development of the projects.	0				100 Jul 2011	100 Dec 2009	Finished
	C3.12 Number of individuals made aware of the results of the program through the media, program website and other means.	0				20000 Jul 2011	16000 Jun 2011	Finished

Milestones	Planned	Due Date	Achieved	Date achieved	Status
M0 Previous Conditions	1	Jan 2007	1	Jul 2006	Achieved
M1 [*] Línea de base para los dos proyectos que permanecen abiertos	1	Sep 2010	1	Jul 2010	Achieved
M2 [*] Estudio de casos / mapeo	1	Mar 2011	1	Apr 2011	Achieved late
M3 Conferencia regional sobre la diáspora	1	Apr 2011	1	Nov 2010	Achieved

[*] Indicate that the milestone has been reformulated

CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE

- [X] Executing agency institutional capacity
- [X] Others, which?: Cancelación, acordada Dic 2009

SECTION 4: RISKS**MOST IMPORTANT RISKS AFFECTING FUTURE PERFORMANCE**

PROJECT RISK LEVEL: Low TOTAL NUMBER OF RISKS: 5 IN EFFECT RISKS: 0 NOT IN EFFECT RISKS: 1 MITIGATED RISKS: 4

SECTION 5: SUSTAINABILITY

Likelihood of project sustainability after project completion: LP - Low Probability

CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY**Issue**

- [X] Lack of a **sustainability plan** or its inadequate implementation

Comments

Sin plan de sostenibilidad establecido.

Actions related to sustainability which will be or have been implemented:

En la etapa de cierre de los proyectos se llevaron a cabo planes de acción enfocados a actividades de sostenibilidad de los proyectos. Creando fondos con dinero HIP para continuar los proyectos hasta finales del 2011 para trabajar en la parte comercial y de fortalecimiento de las agencias para lograr mejores y mayores impactos dentro de los proyectos y de las comunidades.

Se ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad para continuar impulsando proyectos de desarrollo con involucramiento de las diásporas. El desarrollo de nuevas redes filantropía y en el futuro cercano HIP desarrollará una herramienta para facilitar la vinculación de recursos filantrópicos, con causas/acciones en América Latina.

SECTION 6: PRACTICAL LESSONS

1. Los indicadores y objetivos que se establecen en los documentos de proyecto durante el diseño no siempre son factibles de lograrse, como en este caso. Tanto el ejecutor como el equipo de proyecto los estiman muy factibles en el diseño, pero al iniciarse la implementación tales indicadores deben ajustarse a la realidad, y la unidad ejecutora debe ser parte de tal ejercicio, ya que es quien en definitiva enfrenta la realidad del país, el mercado, y el proyecto.

Relative to
ImplementationAuthor
Auge, Isabel [MIF]
