



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación y Apoyo al Sector de Capital Emprendedor INOVAR II

Nro. Proyecto: BR-M1044 - Nro. Operación: ATN/ME-10588-BR

Resultado: Impulsar o setor de capital empreendedor no Brasil a um nível próximo daquele estabelecido pelas normas internacionais e transmitir os conhecimentos adquiridos a partir das experiências do INOVAR a outros países da região

País Administrador
BRASIL

País Beneficiario
BRASIL

Grupo
FCD - Sector financiero y mercado de capitales


Subgrupo
CDVP - Desarrollo del mercado de capitales

Agencia Ejecutora: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS FINEP


Líder equipo de diseño: García-Robles, Susana

Líder equipo de supervisión: Gilio, Ismael Gilio


CRONOLOGÍA DE EVENTOS

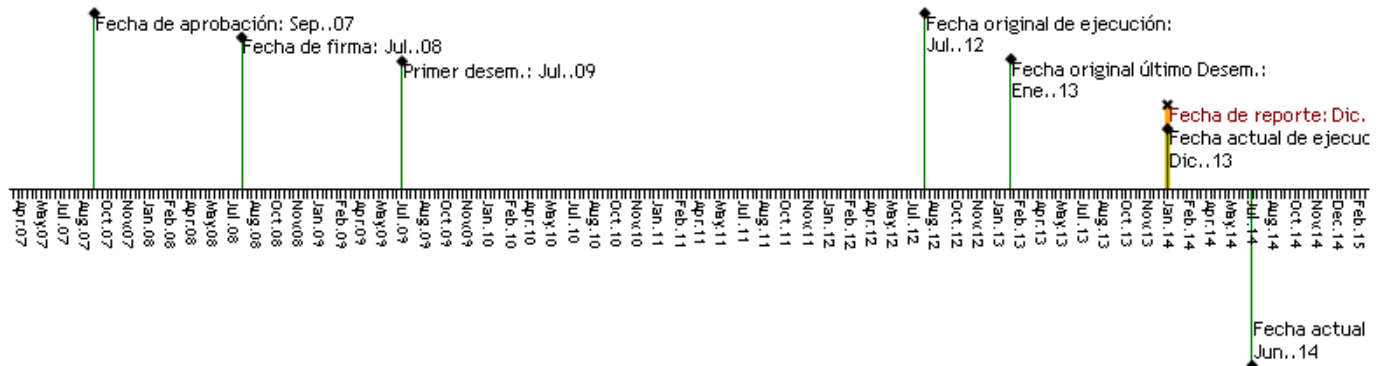

RECURSOS

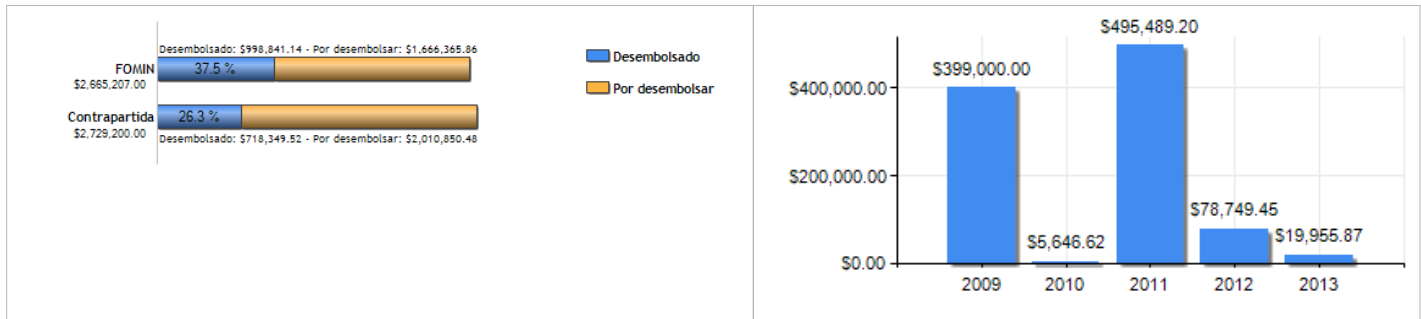

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

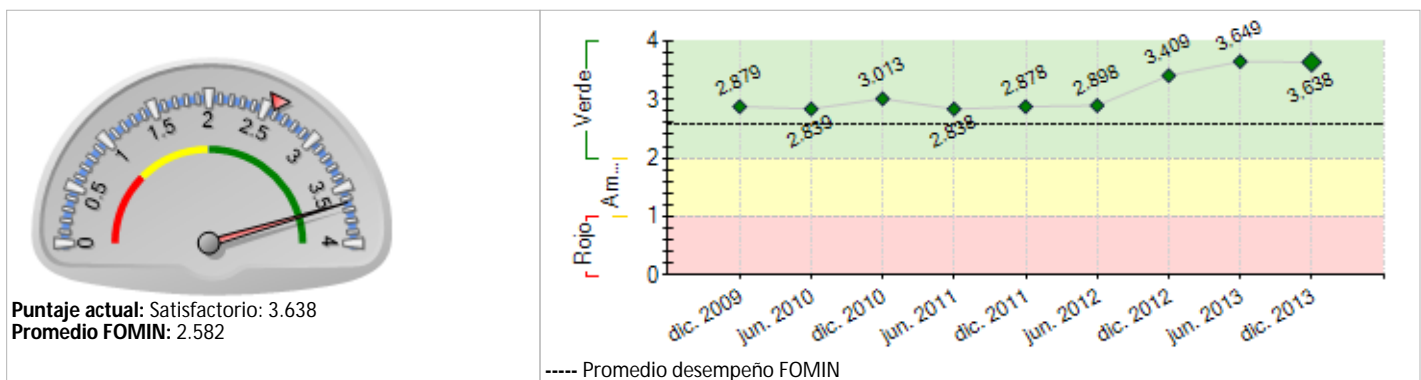

RIESGOS EXTERNOS


CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera:

Adquisiciones:

Capacidad Técnica:

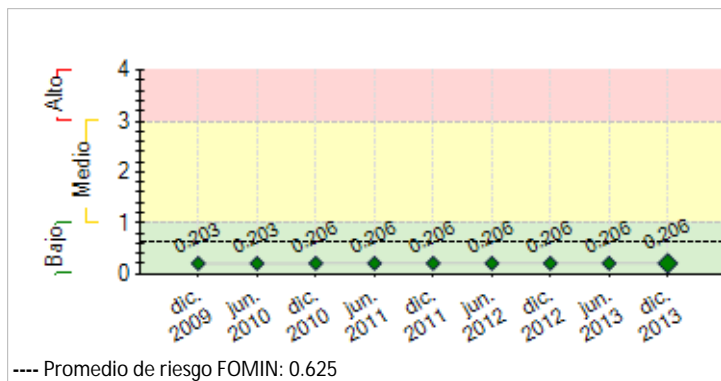

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O programa alcançou suas metas na maior parte das ações planejadas inicialmente, havendo, no entanto, necessidade de ajustes em algumas ações dado o desenvolvimento da própria indústria e de suas necessidades. Componente I: 15 Seed Fóruns com 169 empresas capacitadas; Novos gestores de Capital Semente têm sido identificados; as DDs tem ocorrido de acordo com a demanda e 8 fundos de Capital Semente foram aprovados para investimento e concentram, hoje, mais de 110 investidores-anjos como quotistas; Foram realizados 3 workshops de anjos Componente II: O Toolkit não foi desenvolvido por causa da mudança de orientação estratégica que impediu alocação de profissionais para esta ação; o programa Intercambista Inovar já contou com 5 visitas: 01 da Costa Rica, 02 da Colômbia e 02 da Jamaica; e a Conferência Latino Americana foi substituída pelo Policy Fórum com o BID que ocorreu no dia 17 de maio de 2012. O Componente III: adesão de 10 investidores nacionais ao Inovar Fundos e a atração de investidores internacionais para a Banca de Fundos; O Prêmio Inovar realizou sua quinta edição em 2013 incorporado ao Prêmio FINEP; o Comitê de Investidores na ABVCAP apresentou um Guia de Melhores Práticas para a indústria de VC. Desenvolvimento Institucional: a equipe da FINEP tem recebido capacitação contínua e acesso aos relatórios internacionais da indústria. A supervisora do BID/FUMIn realizou 9 visitas de acompanhamento. Está sendo organizado o processo da fase final do programa.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Proyecto en fase final de cierre, con desempeño satisfactorio, con metas, objetivos e indicadores alcanzados, de acuerdo con la programación.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Foi realizado o 5º Prêmio Inovar. Houve a 9ª visita da supervisora do BID/FUMIN.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Impulsionar o setor de capital empreendedor no Brasil a um nível próximo daquele estabelecido pelas normas internacionais e transmitir os conhecimentos adquiridos a partir das experiências do INOVAR a outros países da região	R.1 Número de novas empresas investidas no âmbito do programa.	0 Jul. 2008				150 Jul. 2012	107 Feb. 2014	
	R.2 Número de países da América Latina que receberam a transferência do conjunto de instrumentos do INOVAR.	0 Jul. 2008				4 Jul. 2012	3.1 Feb. 2014	
	R.3 Número de novos fundos de capital semente criados.	0 Jul. 2008				10 Jul. 2012	7 Ago. 2012	
Componente 1: INOVAR SEMENTE Peso: 40% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Número de fundos de capital semente que receberam assistência técnica.	0 Jul. 2008	2 Jul. 2009	4 Jul. 2010	6 Jul. 2011	8 Jul. 2012	13 Abr. 2010	Finalizado
	C1.12 Número fóruns de capital semente realizados.	0 Jul. 2008	2 Jul. 2009	5 Jul. 2010	9 Jul. 2011	13 Jul. 2012	15 Feb. 2013	
	C1.13 Número de redes de investidores "anjo" establecidas.	0 Jul. 2008	1 Jul. 2009	2 Jul. 2010	3 Jul. 2011	4 Jul. 2012	3 Ago. 2012	Atrasado
	C1.14 Número de empresas que apresentam seus planos de negócio (desenvolvidos com a assistência da FINEP).	0 Jul. 2008	10 Jul. 2009	25 Jul. 2010	45 Jul. 2011	65 Jul. 2012	76 Ago. 2010	Finalizado
	C1.15 Número de "due diligences" realizadas em fundos de capital semente.	0 Jul. 2008	3 Jul. 2009	6 Jul. 2010	9 Jul. 2011	12 Jul. 2012	18 Ene. 2011	Finalizado
	C1.16 Número de investimentos aprovados pela diretoria da FINEP em fundos de capital semente.	0 Jul. 2008	2 Jul. 2009	4 Jul. 2010	6 Jul. 2011	8 Jul. 2012	7 Ago. 2012	Atrasado
	C1.17 Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0 Jul. 2008				1 Ene. 2009	1 May. 2010	
Componente 2: INOVAR AMÉRICA LATINA Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de Toolkits do INOVAR elaborados.	0 Jul. 2008				1 Jul. 2010	0 Ago. 2011	Atrasado
	C2.12 Número de estágios (6 meses de duração) realizados na FINEP por profissionais de instituições dos países associados da América Latina e o Caribe.	0 Jul. 2008	2 Jul. 2009	4 Jul. 2010	6 Jul. 2011	8 Jul. 2012	6 Sep. 2013	Atrasado
	C2.13 Número de Conferências Bienais realizadas no Brasil para instituições dos países associados.	0 Jul. 2008	1 Jul. 2010			2 Jul. 2012	1 Ago. 2012	Atrasado

	C2.14	Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0 Jul. 2008				1 Ene. 2009	1 May. 2010	
Componente 3: INOVAR INVESTIDORES	C3.11	Número de potenciais investidores, nacionais ou internacionais, que aderiram à Incubadora de Fundos Inovar.	0 Jul. 2008	2 Jul. 2009	4 Jul. 2010	6 Jul. 2011	8 Jul. 2012	8 May. 2010	Finalizado
Peso: 30%	C3.12	Número de road shows internacionais realizados para apresentar os fundos Inovar que foram selecionados para due diligence e ainda se encontram em fase de captação.	0 Jul. 2008	1 Jul. 2009	2 Jul. 2010	3 Jul. 2011	4 Jul. 2012	0 Ene. 2011	
Clasificación: Satisfactorio	C3.13	Número de eventos "Prêmio INOVAR" (quatro categorias de premiação para os anos 1 e 2 e cinco categorias para os demais anos).	0 Jul. 2008	1 Jul. 2009	2 Jul. 2010	3 Jul. 2011	4 Jul. 2012	4 Feb. 2013	
	C3.14	Número de investidores Inovar enviados ao Venture Capital Institute, ou evento similar	0 Jul. 2008	2 Jul. 2009	4 Jul. 2010	6 Jul. 2011	8 Jul. 2012	15 Ene. 2011	Finalizado
	C3.15	Número de cursos da European Investment Fund realizados no Brasil para investidores e gestores Inovar.	0 Jul. 2008	1 Jul. 2010			2 Jul. 2012	1 Ene. 2011	
	C3.16	Criação de uma Associação de Investidores.	0 Jul. 2008				1 Jul. 2011	1 Ago. 2011	
	C3.17	Contratação de assessoria jurídica para dar assistência legal às atividades e investimento da FINEP e desenvolvimento de modelos de documentos legais.	0 Jul. 2008				1 Jul. 2009	1 Feb. 2013	
	C3.18	Entrega de software para geração de documentos legais padrão para fundos de Venture Capital e Private Equity.	0 Jul. 2008				1 Ene. 2010	0 Ene. 2011	Atrasado
	C3.19	Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0 Jul. 2008				1 Ene. 2009	1 May. 2010	
Componente 5: Apoio institucional para a FINEP	C5.11	Gerente Inovar selecionad@ e contratad@.	0				1 Ene. 2009	1 May. 2010	
Peso: 10%	C5.12	Número de eventos de capacitação oferecidos para a equipe do Departamento de Investimentos da FINEP.	0	2 Jul. 2009	4 Jul. 2010	6 Jul. 2011	8 Jul. 2012	11 Ene. 2011	Finalizado
Clasificación: Muy Satisfactorio	C5.13	Número de profissionais (consultores e assitentes).	0				3 Jul. 2009	1 Ene. 2011	Atrasado
	C5.14	Acompanhamento do programa pelo supervisor do BID/FUMIN da Sede.	0	1 Jul. 2009	2 Jul. 2010	3 Jul. 2011	4 Jul. 2012	4 May. 2010	Finalizado

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	6	Ene. 2009	6	Jun. 2009	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Baixo nível de retenção de recursos humanos qualificados e designados para este programa por parte da FINEP.	Bajo	A FIA, contratada pela FINEP, realizou em 2010 um estudo para alterar o plano de carreira de seus funcionários visando dar maior estabilidade ao quadro funcional macro. A retenção por parte da FINEP dos responsáveis pela execução do programa possui uma dependência muito grande do plano de carreira da FINEP, mas possui também o auxílio do programa de capacitação e desenvolvimento dos funcionários ligados ao programa.	Project Coordinator
2. Baixo interesse dos investidores por este tipo de investimento.	Bajo	Monitoramento dos interesses dos investidores neste tipo de investimento.	Project Coordinator
3. Poucos investidores institucionais, tanto locais quanto internacionais, atraídos para os ativos brasileiros de capital empreendedor.	Bajo	Monitoramnto das condições que afetam o mercado de capitais e o setor empreendedor brasileiro.	Project Coordinator
4. Aumento das taxas de juros no País.	Bajo	Monitoramento das condições que afetam o mercado de capitais.	Project Coordinator
5. Instabilidade do setor de capital privado e de capital empreendedor na Região.	Bajo	Monitoramento das condições que afetam o mercado de capitais.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 7 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Não há o que reportar para este periodo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]
