



Operation Number: **CO-L1041**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/1/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/06/2015**
Division Chief validation date: **05/05/2015**
Country Representative validation date: **05/05/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Project for Strengthening Judicial Services	Loan Number:	2277/OC-CO,2277/OC-CO-1,2277/OC-CO-2
Executing Agency (EA):	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ,CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ,Ministerio del Interior y de Justicia		
Team Leader:	Valenti Lopez,Paolo	Sector/Subsector:	MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1041	\$21,382,325.00	\$21,382,325.00	\$0.00	\$0.00	\$21,382,325.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1041	\$21,382,325.00	\$13,664,764.72	63.91%	\$7,717,560.28


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

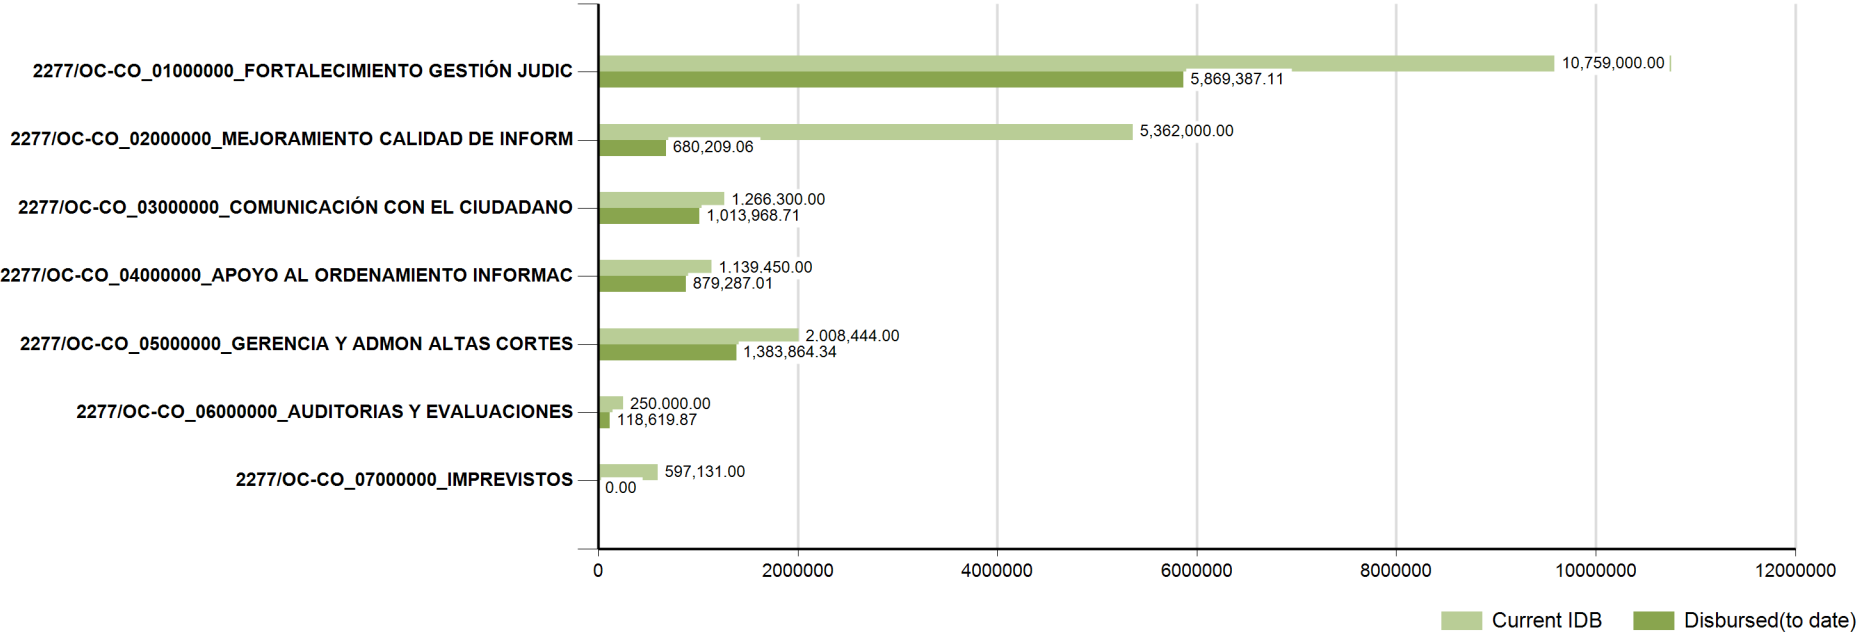

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Contribuir a mejorar la administración de la justicia en los servicios prestados por: las Altas Cortes, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgados Administrativos de Bogotá.							
Observation:	Dado la escasez de información relacionada a la agilización de procesos judiciales en las Altas Cortes actualmente la medición del indicador de impacto es solamente medible a través de encuestas de satisfacción al inicio y a l final de la ejecución de pro							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Porcentaje de encuestados que opinan que la justicia cumple con una perspectiva integral en sus servicios su administración (honesta, accesible, humana, interactiva, eficiente, efectiva en derechos y conocimientos jurídico, eficaz e imagen positiva), acorde con la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en Colombia		%	65.29	2012	Encuesta de percepción de usuarios de los Servicios de justicia de las Altas Cortes, Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y Juzgados Administrativos de Bogotá,	Realizada por la firma AAIC en el 2012 y a ser reaplicada en el 2016. este indicador se estableción en este PMR como se tenía previsto desde el inicio del proyecto	P	
							P(a)	70.00
							A	0.00

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.		%	19.00	2007	Resultados World Business Environment Survey.		P	23.00	
							P(a)	23.00	
							A	0.00	
Outcome:	2 Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.		%	8.00	2007	Resultados World Business Environment Survey		P	13.00	
							P(a)	13.00	
							A	0.00	
Outcome:	3 Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.		%	41.25	2007	Resultados Latinobarómetro		P	44.00
							P(a)	44.00
							A	0.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento de la Gestion Judicial		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo	P		0.00	P	1,256,200.00	4,219,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,688,200.00	4,219,000.01
		A	0.00	0.00	A	123,567.13	1,505,663.64
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Diagnostico	P			P		
		P(a)			P(a)		
		A			A		
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas	P		340.00	P		400,000.00
		P(a)	280.00	340.00	P(a)	202,656.65	335,937.32
		A	210.00	270.00	A	335,937.32	335,937.32
Salas de audiencia equipadas y en funcionamiento	Salas	P		18.00	P	460,000.00	1,060,000.00
		P(a)	6.00	18.00	P(a)	1,214,250.18	3,817,278.50
		A	3.00	15.00	A	2,007,122.65	3,153,215.82
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes	P	38,000.00	38,000.00	P	2,260,000.00	5,080,000.00
		P(a)	0.00	93,000.00	P(a)	554,094.89	2,386,784.17
		A	0.00	93,000.00	A	157,570.34	2,016,533.52
Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema	P	1.00	1.00	P	1,500,000.00	3,502,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,500,000.00	3,502,000.00
		A	0.00	0.00	A	558,910.52	1,000,013.01
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega	P	0.00	1.00	P	860,000.00	1,860,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,340,270.13	1,860,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mejoramiento de los servicios al ciudadano		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia	P		1.00	P		1,026,300.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	199,582.24	1,022,290.10
		A	1.00	1.00	A	191,844.37	848,187.83
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal	P		1.00	P		240,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	244,009.90
		A	0.00	1.00	A	0.00	244,009.90
Apoyo al ordenamiento de la información normativa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema	P	0.00	1.00	P	200,500.00	1,054,500.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	319,286.00	1,139,450.00
		A	1.00	1.00	A	241,252.00	935,253.00
Gerencia y Administración para las Altas Cortes							
Auditorías y evaluaciones							
Imprevistos							

Other Cost		2014	Cost
Auditorías y evaluaciones	P		\$250,000.00
	P(a)	\$125,000.00	\$347,131.00
	A	\$167,209.58	\$167,209.58
Imprevistos	P		\$1,564,525.00
	P(a)	\$0.00	\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Gerencia y Administración para las Altas Cortes	P	\$225,200.00	\$1,126,000.00
	P(a)	\$15,892.58	\$2,508,444.00
	A	\$447,044.47	\$1,557,151.89
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$6,761,900.00	\$21,382,325.00
	P(a)	\$7,159,232.67	\$21,382,325.00
	A	\$4,230,458.38	\$11,763,175.51

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
