


Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
0			Plan de Ejecución del Programa PR-L1153	1954 days	Mon 5/3/18	Thu 28/8/25	\$130.000.000,00							
1			Actividades previas de preparación del Programa	240 days	Mon 5/3/18	Fri 1/2/19	\$0,00							
14			Contrato de Préstamo firmado y ratificado por Ley	106 days	Mon 4/2/19	Mon 1/7/19	\$0,00							
15			Elaboración y envío al Congreso del Mensaje del Poder Ejecutivo	6 days	Mon 4/2/19	Mon 11/2/19	\$0,00	MH						
16			Primer Trámite Constitucional - Cámara de Senadores	46 days	Tue 12/2/19	Tue 16/4/19	\$0,00	Cám. Senadores						
17			Ley aprobada por la Cámara de Senadores	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0,00							
18			Segundo Trámite Constitucional - Cámara de Diputados	46 days	Wed 17/4/19	Wed 19/6/19	\$0,00	Cámara de Diputados						
19			Ley sancionada por la Cámara de Diputados	0 days	Wed 19/6/19	Wed 19/6/19	\$0,00							
20			Tramitación de la promulgación de la Ley que aprueba el CP	5 days	Thu 20/6/19	Wed 26/6/19	\$0,00	Congreso Nacional						
21			Ley promulgada	0 days	Wed 26/6/19	Wed 26/6/19	\$0,00							
22			Gestiones para la publicación en la Gaceta Oficial	3 days	Thu 27/6/19	Mon 1/7/19	\$0,00	Gaceta Oficial						
23			Ley de aprobación del CP publicada en la Gaceta Oficial - Elegibilidad del Préstamo	0 days	Mon 1/7/19	Mon 1/7/19	\$0,00							
24			Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00							
25			Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Estipulaciones Especiales (según cada Contrato de Préstamo)	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00	Responsable institucional						
26			Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Normas Generales	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00	Responsable institucional						
27			Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas	0 days	Mon 30/9/19	Mon 30/9/19	\$0,00							
28	1		Componente 1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público	1728 days	Tue 16/10/18	Thu 29/5/25	\$32.600.000,00							
29	1.1	P1	Producto 1: Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas	1198 days	Wed 27/11/19	Fri 28/6/24	\$500.000,00							
30	1.1.1		SBCC_33. Contratación de Firma Consultora para la revisión del marco legal de la SENATICS y elaboración de propuestas de cambio normativo con asistencia técnica especializada	1198 days	Wed 27/11/19	Fri 28/6/24	\$500.000,00							
31	1.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 27/11/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
42	1.1.1.2		Etapas de Contratación	132 days	Mon 6/1/20	Tue 7/7/20	\$0,00							
72	1.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1038 days	Tue 7/7/20	Fri 28/6/24	\$500.000,00							
80	1.2	P2	Producto 2: Servicios simplificados y digitalizados	1500 days	Tue 2/7/19	Mon 31/3/25	\$3.000.000,00							
81	1.2.1		Tramitación del Decreto que instruya a los sectores el inicio del proceso de simplificación de trámites	200 days	Tue 2/7/19	Mon 6/4/20	\$0,00							
82	1.2.1.1	GRP - Act. # 2.1	Emitir una instrucción de obligatoriedad del poder ejecutivo para dictar la reglamentación pertinente que permita ejecutar la simplificación y digitalización de los trámites para el sector público. El Ministro debe coordinar la instrucción con Presidencia	200 days	Tue 2/7/19	Mon 6/4/20	\$0,00	Director del Programa						
83	1.2.2		SCC_34. Contratación de firma consultora para el diseño metodológico de la simplificación y digitalización	195 days	Tue 3/9/19	Mon 1/6/20	\$60.000,00							
84	1.2.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 3/9/19	Thu 10/10/19	\$0,00							
95	1.2.2.2		Etapas de Contratación	79 days	Fri 11/10/19	Wed 29/1/20	\$0,00							
115	1.2.2.3		Etapas de ejecución del contrato	88 days	Wed 29/1/20	Mon 1/6/20	\$60.000,00							

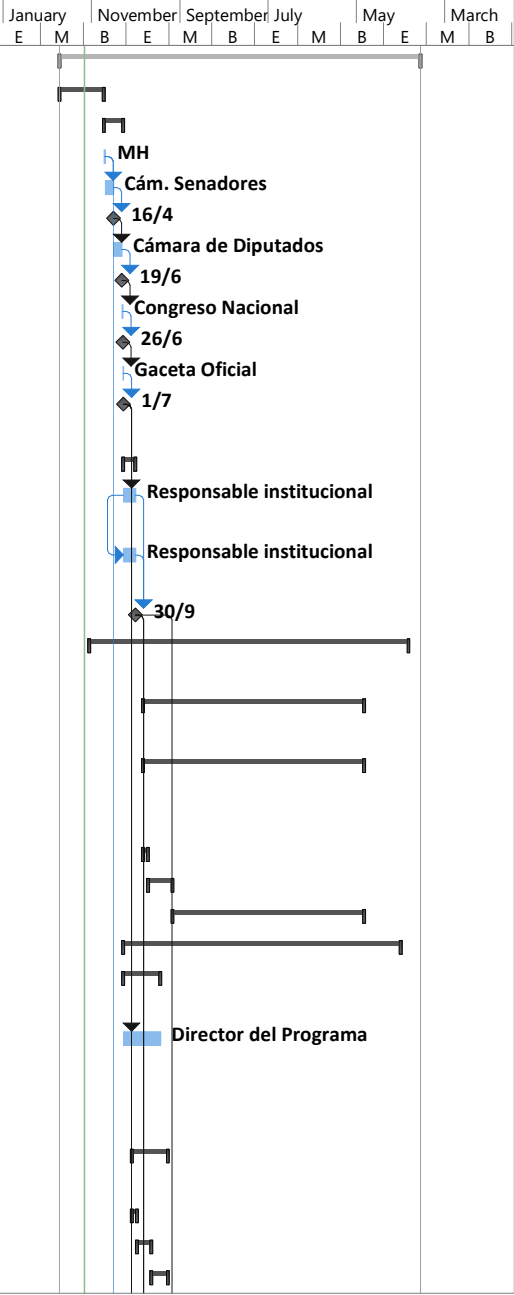

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B E	July E M	May B E	March M B
119	1.2.3		SBCC_35. Contratación de Firma Consultora para simplificar y digitalizar procesos del Grupo 1	820 days	Wed 27/11/19	Tue 17/1/23	\$900.000,00							
120	1.2.3.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 27/11/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
131	1.2.3.2		Etapas de Contratación	132 days	Mon 6/1/20	Tue 7/7/20	\$0,00							
161	1.2.3.3		Etapas de ejecución del contrato	660 days	Tue 7/7/20	Tue 17/1/23	\$900.000,00							
167	1.2.4		SBCC_36. Contratación de Firma Consultora para simplificar y digitalizar procesos del Grupo 2	556 days	Tue 23/11/21	Tue 9/1/24	\$900.000,00							
168	1.2.4.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 23/11/21	Thu 30/12/21	\$0,00							
179	1.2.4.2		Etapas de Contratación	132 days	Fri 31/12/21	Mon 4/7/22	\$0,00							
209	1.2.4.3		Etapas de ejecución del contrato	396 days	Mon 4/7/22	Tue 9/1/24	\$900.000,00							
214	1.2.5		SBCC_37. Contratación de Firma Consultora para simplificar y digitalizar procesos del Grupo 3	556 days	Tue 17/1/23	Tue 4/3/25	\$900.000,00							
215	1.2.5.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 17/1/23	Thu 23/2/23	\$0,00							
226	1.2.5.2		Etapas de Contratación	132 days	Fri 24/2/23	Mon 28/8/23	\$0,00							
256	1.2.5.3		Etapas de ejecución del contrato	396 days	Mon 28/8/23	Tue 4/3/25	\$900.000,00							
261	1.2.6		SBCC_38. Contratación de Firma Consultora para la supervisión del servicio de simplificación y digitalización de procesos	1404 days	Wed 13/11/19	Mon 31/3/25	\$240.000,00							
262	1.2.6.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 13/11/19	Fri 20/12/19	\$0,00							
273	1.2.6.2		Etapas de Contratación	132 days	Mon 23/12/19	Tue 23/6/20	\$0,00							
303	1.2.6.3		Etapas de ejecución del contrato	1244 days	Tue 23/6/20	Mon 31/3/25	\$240.000,00							
307	1.2.7		Coordinación de las actividades - puntos focales	1234 days	Wed 8/7/20	Mon 31/3/25	\$0,00							
308	1.2.7.1		Actividades de Gestión	1234 days	Wed 8/7/20	Mon 31/3/25	\$0,00	Director Misional						
309	1.3	P3	Producto 3: Sistema de Información de Salud (HIS), digitalizado	1685 days	Tue 16/10/18	Mon 31/3/25	\$5.500.000,00							
310	1.3.1		Hito 1: Elaboración del Plan estratégico de TIC para el sector Salud	445 days	Tue 16/10/18	Mon 29/6/20	\$100.000,00							
311	1.3.1.1		Formulación y tramitación del instrumento normativo para simplificar trámites	88 days	Tue 16/10/18	Thu 14/2/19	\$0,00	CT PR-T1255						
312	1.3.1.2		Selección y detalle de las áreas de intervención	88 days	Fri 15/2/19	Tue 18/6/19	\$0,00	CT PR-T1255						
313	1.3.1.3		Mapeo de los procesos a ser simplificados asociados a los servicios de salud	88 days	Wed 19/6/19	Fri 18/10/19	\$0,00	CT PR-T1255						
314	1.3.1.4	GRP - Act. # 2.6	PRT-T1255 diagnosticará y definirá las ampliaciones necesarias a los sistemas de salud. Se realizará una audiencia pública con el lanzamiento. Someter TdR y/o especificaciones técnicas a una consulta previa donde las empresas afinen las propuestas.	88 days	Wed 19/6/19	Fri 18/10/19	\$0,00	CT PR-T1255						
315	1.3.1.5		SCC_39. Contratación de Consultoría para la elaboración de un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información del sector Salud	195 days	Tue 1/10/19	Mon 29/6/20	\$100.000,00							
316	1.3.1.5.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 1/10/19	Thu 7/11/19	\$0,00							
327	1.3.1.5.2		Etapas de Contratación	79 days	Fri 8/11/19	Wed 26/2/20	\$0,00							
347	1.3.1.5.3		Etapas de ejecución del contrato	88 days	Wed 26/2/20	Mon 29/6/20	\$100.000,00							
351	1.3.2		Hito 2: Desarrollos adicionales del HIS e implementación	1395 days	Tue 26/11/19	Mon 31/3/25	\$3.500.000,00							
352	1.3.2.1		SBCC_40. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de software complementario del Sistema de Información de Salud (HIS), incluye la implementación y gestión del cambio	1395 days	Tue 26/11/19	Mon 31/3/25	\$3.500.000,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
353	1.3.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 26/11/19	Thu 2/1/20	\$0,00													
364	1.3.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 3/1/20	Mon 6/7/20	\$0,00													
394	1.3.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1235 days	Mon 6/7/20	Mon 31/3/25	\$3.500.000,00													
402	1.3.3		Hito 3: Provisión de software y hardware para el HIS	1360 days	Tue 14/1/20	Mon 31/3/25	\$1.900.000,00													
403	1.3.3.1		LPI_5. Adquisición de equipos informáticos y accesorios	1360 days	Tue 14/1/20	Mon 31/3/25	\$1.900.000,00													
404	1.3.3.1.1		Etapa previa	28 days	Tue 14/1/20	Thu 20/2/20	\$0,00													
411	1.3.3.1.2		Etapa de Contratación	99 days	Fri 21/2/20	Wed 8/7/20	\$0,00													
432	1.3.3.1.3		Ejecución del contrato	516 days	Wed 8/7/20	Thu 30/6/22	\$950.000,00													
437	1.3.3.1.4		Procesos de contratación para provisión años 4, 5 y 6	717 days	Fri 1/7/22	Mon 31/3/25	\$950.000,00													
444	1.4	P4	Producto 4: Plan de Mejora de los servicios brindados por el Servicio Nacional de Catastro, implementado	1129 days	Tue 4/2/20	Fri 31/5/24	\$2.270.000,00													
445	1.4.1		Hito 1: Modelo de atención multicanal implementado	367 days	Tue 4/2/20	Wed 30/6/21	\$150.000,00													
446	1.4.1.1		SCC_41. Contratación de Firma Consultora para el diseño, desarrollo e implementación de un modelo de atención multicanal (presencial, digital y telefónico), para el SNC	367 days	Tue 4/2/20	Wed 30/6/21	\$150.000,00													
447	1.4.1.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 4/2/20	Thu 12/3/20	\$0,00													
458	1.4.1.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 13/3/20	Wed 1/7/20	\$0,00													
478	1.4.1.1.3		Etapa de ejecución del contrato	260 days	Wed 1/7/20	Wed 30/6/21	\$150.000,00													
482	1.4.2		Hito 2: Plataforma de hardware y software de base modernizada	556 days	Mon 6/4/20	Mon 23/5/22	\$750.000,00													
483	1.4.2.1		SBCC_42. Contratación de servicios para migración de datos y actualización de la plataforma del Sistema de Explotación Catastral (SIECA)	556 days	Mon 6/4/20	Mon 23/5/22	\$500.000,00													
484	1.4.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Mon 6/4/20	Wed 13/5/20	\$0,00													
495	1.4.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Thu 14/5/20	Fri 13/11/20	\$0,00													
525	1.4.2.1.3		Ejecución del contrato	396 days	Fri 13/11/20	Mon 23/5/22	\$500.000,00													
529	1.4.2.2		LPN_6. Adquisición de servidores y storage para el SNC	369 days	Mon 6/4/20	Thu 2/9/21	\$250.000,00													
530	1.4.2.2.1		Etapa previa	28 days	Mon 6/4/20	Wed 13/5/20	\$0,00													
537	1.4.2.2.2		Proceso de Contratación	77 days	Thu 14/5/20	Fri 28/8/20	\$0,00													
558	1.4.2.2.3		Ejecución del contrato	264 days	Fri 28/8/20	Thu 2/9/21	\$250.000,00													
563	1.4.3		Hito 3: Nuevas sedes regionales, habilitadas	762 days	Thu 1/7/21	Fri 31/5/24	\$720.000,00													
564	1.4.3.1		CP_1. Contratación de Firma Constructora para la instalación y habilitación de cinco nuevas sedes regionales para la atención al público del Sistema Nacional de Catastro	739 days	Thu 1/7/21	Tue 30/4/24	\$684.000,00													
565	1.4.3.1.1		Etapa previa	28 days	Thu 1/7/21	Mon 9/8/21	\$0,00													
572	1.4.3.1.2		Etapa de contratación	65 days	Tue 10/8/21	Mon 8/11/21	\$0,00													
593	1.4.3.1.3		Ejecución del contrato	646 days	Mon 8/11/21	Tue 30/4/24	\$684.000,00													
599	1.4.3.2		SCC_45. Contratación de Firma Consultora para la Supervisión de Obras de habilitación de las sedes del SNC	752 days	Thu 15/7/21	Fri 31/5/24	\$36.000,00													
600	1.4.3.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 15/7/21	Mon 23/8/21	\$0,00													
611	1.4.3.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Tue 24/8/21	Fri 10/12/21	\$0,00													
631	1.4.3.2.3		Etapa de ejecución del contrato	645 days	Fri 10/12/21	Fri 31/5/24	\$36.000,00													

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B E	July M	May B E	March M B
634	1.4.4		Hito 4: Archivos digitalizados y nuevo sistema de gestión catastral, implementado	679 days	Tue 24/11/20	Fri 30/6/23	\$650.000,00							
635	1.4.4.1		SBCC_43. Contratación de servicios de digitalización del archivo del SNC para el acceso en línea los documentos de cuenta corriente y/o padrón.	679 days	Tue 24/11/20	Fri 30/6/23	\$500.000,00							
636	1.4.4.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 24/11/20	Thu 31/12/20	\$0,00							
647	1.4.4.1.2		Etapas de Contratación	132 days	Fri 1/1/21	Mon 5/7/21	\$0,00							
677	1.4.4.1.3		Ejecución del contrato	519 days	Mon 5/7/21	Fri 30/6/23	\$500.000,00							
682	1.4.4.2		SCC_44. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del diseño, el desarrollo y la implementación de un Sistema Integrado de Información catastral y de gestión tributaria	634 days	Tue 24/11/20	Fri 28/4/23	\$150.000,00							
683	1.4.4.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 24/11/20	Thu 31/12/20	\$0,00							
694	1.4.4.2.2		Etapas de Contratación	84 days	Fri 1/1/21	Wed 28/4/21	\$0,00							
714	1.4.4.2.3		Etapas de ejecución del contrato	522 days	Wed 28/4/21	Fri 28/4/23	\$150.000,00							
717	1.5	P5	Producto 5: Aplicaciones transversales de gobierno digital, desarrolladas e implementadas	1438 days	Thu 26/9/19	Mon 31/3/25	\$6.000.000,00							
718	1.5.1		Proyecto 1: Plataforma de autenticación de identidad, firma digital y Notificación Electrónica	378 days	Tue 17/11/20	Thu 28/4/22	\$460.000,00							
719	1.5.1.1		SBCC_46. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de la plataforma de verificación, autenticación de identidad y firma digital, incluye un diagnóstico, el desarrollo, la implementación con gestión del cambio y equipamiento con mantenimiento.	378 days	Tue 17/11/20	Thu 28/4/22	\$460.000,00							
720	1.5.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 17/11/20	Thu 24/12/20	\$0,00							
731	1.5.1.1.2		Etapas de Contratación	137 days	Fri 25/12/20	Mon 5/7/21	\$0,00							
761	1.5.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	213 days	Mon 5/7/21	Thu 28/4/22	\$460.000,00							
765	1.5.2		Proyecto 2: Plataforma para la Gestión de Expediente Electrónico	676 days	Thu 26/9/19	Thu 28/4/22	\$960.000,00							
766	1.5.2.1		SBCC_47. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de la Plataforma para la Gestión de Expediente Electrónico y Notificación Electrónica, incluye un diagnóstico, el desarrollo y la implementación con gestión del cambio	676 days	Thu 26/9/19	Thu 28/4/22	\$960.000,00							
767	1.5.2.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 26/9/19	Mon 4/11/19	\$0,00							
778	1.5.2.1.2		Etapas de Contratación	132 days	Tue 5/11/19	Wed 6/5/20	\$0,00							
808	1.5.2.1.3		Etapas de ejecución del contrato	516 days	Wed 6/5/20	Thu 28/4/22	\$960.000,00							
812	1.5.3		Proyecto 3: Geoportal Nacional	424 days	Tue 14/9/21	Fri 28/4/23	\$560.000,00							
813	1.5.3.1		SBCC_48. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo del Geoportal Nacional, incluye un diagnóstico, el desarrollo y la implementación con gestión del cambio, y el equipamiento con mantenimiento	424 days	Tue 14/9/21	Fri 28/4/23	\$560.000,00							
814	1.5.3.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 14/9/21	Thu 21/10/21	\$0,00							
825	1.5.3.1.2		Etapas de Contratación	132 days	Fri 22/10/21	Mon 25/4/22	\$0,00							
855	1.5.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	264 days	Mon 25/4/22	Fri 28/4/23	\$560.000,00							
859	1.5.4		Proyecto 4: Plataforma de Gestión Administrativa para Municipios	468 days	Tue 14/9/21	Thu 29/6/23	\$300.000,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
860	1.5.4.1		SBCC_49. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de la Plataforma de Gestión Administrativa para Municipios, incluye diagnóstico, desarrollo, implementación con gestión del cambio, su equipamiento con mantenimiento	468 days	Tue 14/9/21	Thu 29/6/23	\$300.000,00							
861	1.5.4.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 14/9/21	Thu 21/10/21	\$0,00							
872	1.5.4.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 22/10/21	Mon 25/4/22	\$0,00							
902	1.5.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	308 days	Mon 25/4/22	Thu 29/6/23	\$300.000,00							
906	1.5.5		Proyecto 5: Nueva Plataforma del Portal Nacional de Trámites y Servicios Transaccionales	424 days	Tue 14/9/21	Fri 28/4/23	\$590.000,00							
907	1.5.5.1		SBCC_50. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de la Nueva Plataforma del Portal Nacional de Trámites y Servicios Transaccionales, incluye diagnóstico, desarrollo, implementación con gestión del cambio, su equipamiento con mantenimiento.	424 days	Tue 14/9/21	Fri 28/4/23	\$590.000,00							
908	1.5.5.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 14/9/21	Thu 21/10/21	\$0,00							
919	1.5.5.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 22/10/21	Mon 25/4/22	\$0,00							
949	1.5.5.1.3		Etapa de ejecución del contrato	264 days	Mon 25/4/22	Fri 28/4/23	\$590.000,00							
953	1.5.6		Proyecto 6: Pasarela de Pago en Línea	426 days	Tue 13/9/22	Tue 30/4/24	\$350.000,00							
954	1.5.6.1		SBCC_51. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de la Pasarela de Pago en Línea, incluye diagnóstico, desarrollo, implementación con gestión del cambio, su equipamiento con mantenimiento.	426 days	Tue 13/9/22	Tue 30/4/24	\$350.000,00							
955	1.5.6.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 13/9/22	Thu 20/10/22	\$0,00							
966	1.5.6.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 21/10/22	Mon 24/4/23	\$0,00							
996	1.5.6.1.3		Etapa de ejecución del contrato	266 days	Mon 24/4/23	Tue 30/4/24	\$350.000,00							
1000	1.5.7		Proyecto 7: Actualización de elementos de la plataforma de interoperabilidad	424 days	Tue 13/9/22	Fri 26/4/24	\$400.000,00							
1001	1.5.7.1		SBCC_52. Contratación de Firma Consultora para la actualización de elementos de la Plataforma de Interoperabilidad, incluye diagnóstico, desarrollo, implementación con gestión del cambio, su equipamiento con mantenimiento.	424 days	Tue 13/9/22	Fri 26/4/24	\$400.000,00							
1002	1.5.7.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 13/9/22	Thu 20/10/22	\$0,00							
1013	1.5.7.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 21/10/22	Mon 24/4/23	\$0,00							
1043	1.5.7.1.3		Etapa de ejecución del contrato	264 days	Mon 24/4/23	Fri 26/4/24	\$400.000,00							
1047	1.5.8		Proyecto 8: Otros proyectos pendientes a definir	505 days	Tue 25/4/23	Mon 31/3/25	\$2.380.000,00							
1048	1.5.8.1		Desarrollo de proyectos	505 days	Tue 25/4/23	Mon 31/3/25	\$2.380.000,00							
1049	1.5.8.2		Aplicaciones transversales de gobierno digital, desarrolladas e implementadas - Año 5 (#3)	0 days	Fri 28/6/24	Fri 28/6/24	\$0,00							
1050	1.5.8.3		Aplicaciones transversales de gobierno digital, desarrolladas e implementadas - Año 6 (#1 y 2)	0 days	Mon 31/3/25	Mon 31/3/25	\$0,00							
1051	1.6	P6	Producto 6: Laboratorio de innovación gubernamental para apoyar el desarrollo de proyectos específicos de gobierno digital, implementado	1543 days	Tue 2/7/19	Thu 29/5/25	\$8.000.000,00							



Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
1052	1.6.1		Hito 1: Modelo del Fondo Concursable diseñado	1301 days	Tue 2/7/19	Tue 25/6/24	\$30.000,00							
1053	1.6.1.1	GRP - Act. # 2.4	Definir una metodología para la operación del GobLab e instrumentos de gestión (criterios de selección e identificación de las propuestas y procedimientos)	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00	Director del Programa						
1054	1.6.1.2		3CV_88. Contratación de consultor para la elaboración del diseño del Reglamento Operativo del Fondo Concursable de Proyectos	157 days	Mon 28/10/19	Tue 2/6/20	\$30.000,00							
1055	1.6.1.2.1		Etapa previa	18 days	Mon 28/10/19	Wed 20/11/19	\$0,00							
1061	1.6.1.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Thu 21/11/19	Thu 30/1/20	\$0,00							
1077	1.6.1.2.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Thu 30/1/20	Tue 2/6/20	\$30.000,00							
1081	1.6.1.3		Elaboración de los proyectos	1060 days	Wed 3/6/20	Tue 25/6/24	\$0,00							
1083	1.6.2		Proyecto 1: Sistema Único de Beneficiarios de Programas Sociales implementado	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$500.000,00							
1084	1.6.2.1		SBCC_60. Contratación de Firma Consultora para la elaboración de un diagnóstico, la integración de la base de datos y gestión de cambio para la implementación del Sistema Único de Beneficiarios de Programas Sociales	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$500.000,00							
1085	1.6.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00							
1096	1.6.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00							
1126	1.6.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$500.000,00							
1130	1.6.3		Proyecto 2: Sistema Único de Productores implementado	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$500.000,00							
1131	1.6.3.1		SBCC_61. Contratación de Firma Consultora para la elaboración de un diagnóstico, la integración de base de datos y gestión de cambio para la implementación del Sistema Único de Productores	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$500.000,00							
1132	1.6.3.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00							
1143	1.6.3.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00							
1173	1.6.3.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$500.000,00							
1177	1.6.4		Proyecto 3: IOT	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$2.000.000,00							
1178	1.6.4.1		SBCC_134. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del Proyecto IOT	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$2.000.000,00							
1179	1.6.4.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00							
1190	1.6.4.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00							
1220	1.6.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$2.000.000,00							
1224	1.6.5		Proyecto 4: Big Data	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$1.000.000,00							
1225	1.6.5.1		SBCC_135. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del Proyecto Big Data	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$1.000.000,00							
1226	1.6.5.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00							
1237	1.6.5.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00							
1267	1.6.5.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$1.000.000,00							
1271	1.6.6		Proyecto 5: Otros proyectos financiados	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$3.575.000,00							
1272	1.6.6.1		SBCC_62. Contratación de Firma Consultora para la elaboración de Proyectos	1366 days	Tue 8/10/19	Tue 31/12/24	\$3.570.000,00							
1273	1.6.6.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 8/10/19	Thu 14/11/19	\$0,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
1284	1.6.6.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/11/19	Mon 18/5/20	\$0,00							
1314	1.6.6.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1206 days	Mon 18/5/20	Tue 31/12/24	\$3.570.000,00							
1318	1.6.6.2		Saldo para redondeo	1 day	Tue 31/12/24	Tue 31/12/24	\$5.000,00							
1319	1.6.7		3CV_89. Contratación de consultor para apoyo al desarrollo de los Proyectos del Fondo Concursable (Líder de Proyecto)	1349 days	Mon 30/3/20	Thu 29/5/25	\$360.000,00							
1320	1.6.7.1		Etapa previa	18 days	Mon 30/3/20	Wed 22/4/20	\$0,00							
1326	1.6.7.2		Etapa de Contratación	51 days	Thu 23/4/20	Thu 2/7/20	\$0,00							
1342	1.6.7.3		Etapa de ejecución del contrato	1280 days	Thu 2/7/20	Thu 29/5/25	\$360.000,00							
1345	1.6.8		3CV_90. Contratación de consultor para realizar la evaluación de los proyectos ejecutados mediante el Fondo Concursable	135 days	Fri 26/4/24	Thu 31/10/24	\$35.000,00							
1346	1.6.8.1		Etapa previa	18 days	Fri 26/4/24	Tue 21/5/24	\$0,00							
1352	1.6.8.2		Etapa de Contratación	51 days	Wed 22/5/24	Wed 31/7/24	\$0,00							
1368	1.6.8.3		Etapa de ejecución del contrato	66 days	Wed 31/7/24	Thu 31/10/24	\$35.000,00							
1371	1.7	P7	Producto 7: Modelo de atención multicanal, implementado	1509 days	Wed 19/6/19	Mon 31/3/25	\$3.330.000,00							
1372	1.7.1		Elaboración del diseño de un modelo de atención multicanal (electrónico, el presencial y el telefónico) referencial para la puesta en marcha de la prestación de los servicios públicos	132 days	Wed 19/6/19	Thu 19/12/19	\$0,00	PR-T1255						
1373	1.7.2	GRP - Act. # 2.5	PR-T1255 diseñará el modelo multicanal y hoja de ruta para su implementacion Se realizará una audiencia pública con el lanzamiento. Someter TdR y/o especificaciones técnicas a una consulta previa donde las empresas afinen las propuestas.	132 days	Wed 19/6/19	Thu 19/12/19	\$0,00	PR-T1255						
1374	1.7.3		SCC_53. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del Plan Nacional de Servicios Ciudadanos	239 days	Fri 4/10/19	Wed 2/9/20	\$100.000,00							
1375	1.7.3.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 4/10/19	Tue 12/11/19	\$0,00							
1386	1.7.3.2		Etapa de Contratación	79 days	Wed 13/11/19	Mon 2/3/20	\$0,00							
1406	1.7.3.3		Etapa de ejecución del contrato	132 days	Mon 2/3/20	Wed 2/9/20	\$100.000,00							
1410	1.7.4		SCC_54. Contratación de Firma para la Socialización del Plan de Servicios Ciudadanos, que incluye la definición de concepto de campaña, identidad de marca y definición de mensajes claves, Mapa de públicos y objetivos de comunicación y desarrollo de materi	1193 days	Thu 3/9/20	Mon 31/3/25	\$165.000,00							
1411	1.7.4.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 3/9/20	Mon 12/10/20	\$0,00							
1422	1.7.4.2		Etapa de Contratación	79 days	Tue 13/10/20	Fri 29/1/21	\$0,00							
1442	1.7.4.3		Etapa de ejecución del contrato	1086 days	Fri 29/1/21	Mon 31/3/25	\$165.000,00							
1447	1.7.5		SBE_18. Contratación de servicios para la realización de campañas presenciales (ferias con servicios) para la difusión del Modelo de Atención Multicanal	1193 days	Thu 3/9/20	Mon 31/3/25	\$90.000,00							
1448	1.7.5.1		Etapa previa	14 days	Thu 3/9/20	Tue 22/9/20	\$0,00							
1453	1.7.5.2		Proceso de Contratación	48 days	Wed 23/9/20	Fri 27/11/20	\$0,00							
1470	1.7.5.3		Ejecución del contrato	1131 days	Fri 27/11/20	Mon 31/3/25	\$90.000,00							
1475	1.7.6		Definición de preguntas relacionadas con comunicación específicas para la Encuesta de Satisfacción de Usuarios	66 days	Thu 3/9/20	Thu 3/12/20	\$0,00	Director Misional						

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
1476	1.7.7		Hito 1: Encuestas de calidad de servicios, realizadas	1069 days	Wed 24/2/21	Mon 31/3/25	\$450.000,00							
1477	1.7.7.1		SCC_55. Contratación de Firma para la Realización de Encuestas de Satisfacción de Usuarios, en las modalidades presencial y telefónica	757 days	Fri 6/5/22	Mon 31/3/25	\$90.000,00							
1478	1.7.7.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 6/5/22	Tue 14/6/22	\$0,00							
1489	1.7.7.1.2		Etapas de Contratación	79 days	Wed 15/6/22	Mon 3/10/22	\$0,00							
1509	1.7.7.1.3		Etapas de ejecución del contrato	650 days	Mon 3/10/22	Mon 31/3/25	\$90.000,00							
1515	1.7.7.2		SCC_56. Contratación de Firma para la realización de Encuesta "Simplificando Vidas"	1069 days	Wed 24/2/21	Mon 31/3/25	\$40.000,00							
1516	1.7.7.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 24/2/21	Fri 2/4/21	\$0,00							
1527	1.7.7.2.2		Etapas de Contratación	79 days	Mon 5/4/21	Thu 22/7/21	\$0,00							
1547	1.7.7.2.3		Etapas de ejecución del contrato	962 days	Thu 22/7/21	Mon 31/3/25	\$40.000,00							
1553	1.7.7.3		3CV_86. Contratación de consultor para la realización de mediciones de costos administrativos de los trámites en instituciones públicas	1031 days	Mon 19/4/21	Mon 31/3/25	\$200.000,00							
1554	1.7.7.3.1		Etapas previas	18 days	Mon 19/4/21	Wed 12/5/21	\$0,00							
1560	1.7.7.3.2		Etapas de Contratación	51 days	Thu 13/5/21	Thu 22/7/21	\$0,00							
1576	1.7.7.3.3		Etapas de ejecución del contrato	962 days	Thu 22/7/21	Mon 31/3/25	\$200.000,00							
1582	1.7.7.4		Monitoreo y análisis de calidad de datos e información de las encuestas de gestión de calidad de servicios	650 days	Tue 4/10/22	Mon 31/3/25	\$120.000,00							
1584	1.7.8		Hito 2: Call center del Estado implementado	651 days	Fri 31/1/20	Fri 29/7/22	\$320.000,00							
1585	1.7.8.1		LPI_19. Contratación de servicios de centro de llamadas para la atención ciudadana en la implementación de servicios públicos	651 days	Fri 31/1/20	Fri 29/7/22	\$320.000,00							
1586	1.7.8.1.1		Etapas previas	28 days	Fri 31/1/20	Tue 10/3/20	\$0,00							
1593	1.7.8.1.2		Etapas de Contratación	99 days	Wed 11/3/20	Mon 27/7/20	\$0,00							
1614	1.7.8.1.3		Ejecución del contrato	524 days	Mon 27/7/20	Fri 29/7/22	\$320.000,00							
1618	1.7.9		Hito 3: Centros de Servicio Integrados, implementados	1313 days	Wed 19/6/19	Fri 28/6/24	\$1.800.000,00							
1619	1.7.9.1		Definición del Modelo de Gestión del Centros de Servicio Integrados con los mecanismos de financiamiento y operación	264 days	Wed 19/6/19	Mon 22/6/20	\$0,00	CT PR-T1255						
1620	1.7.9.2		Instalación de los centros de servicios	1015 days	Mon 11/5/20	Fri 29/3/24	\$600.000,00							
1735	1.7.9.3		LPI_20. Contratación de servicios de apoyo operativo a Centros de Servicios Integrados	647 days	Thu 6/1/22	Fri 28/6/24	\$1.200.000,00							
1736	1.7.9.3.1		Etapas previas	28 days	Thu 6/1/22	Mon 14/2/22	\$0,00							
1743	1.7.9.3.2		Etapas de Contratación	99 days	Tue 15/2/22	Fri 1/7/22	\$0,00							
1764	1.7.9.3.3		Ejecución del contrato	520 days	Fri 1/7/22	Fri 28/6/24	\$1.200.000,00							
1767	1.7.10		Hito 4: Sistema CRM implementado	692 days	Tue 7/4/20	Wed 30/11/22	\$405.000,00							
1768	1.7.10.1		SBCC_57. Contratación de Firma Consultora para la configuración, adaptación e integración de la herramienta CRM, incluye la implementación y gestión del cambio.	692 days	Tue 7/4/20	Wed 30/11/22	\$250.000,00							
1769	1.7.10.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 7/4/20	Thu 14/5/20	\$0,00							



Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B E	July M	May B E	March M B
1780	1.7.10.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/5/20	Mon 16/11/20	\$0,00							
1810	1.7.10.1.3		Etapa de ejecución del contrato	532 days	Mon 16/11/20	Wed 30/11/22	\$250.000,00							
1814	1.7.10.2		SBCC_58. Contratación de Firma Consultora para desarrollo de la Carpeta Ciudadana, incluyendo estudios previos para la definición de la arquitectura y desarrollo de un modelo de carpeta e integración con el CRM	688 days	Tue 7/4/20	Thu 24/11/22	\$150.000,00							
1815	1.7.10.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 7/4/20	Thu 14/5/20	\$0,00							
1826	1.7.10.2.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 15/5/20	Mon 16/11/20	\$0,00							
1856	1.7.10.2.3		Etapa de ejecución del contrato	528 days	Mon 16/11/20	Thu 24/11/22	\$150.000,00							
1860	1.7.10.3		Saldo para redondeo	1 day	Thu 24/11/22	Thu 24/11/22	\$5.000,00							
1861	1.8	P8	Producto 8: Sistema Nacional de Ciberseguridad, fortalecido	1328 days	Tue 1/10/19	Thu 31/10/24	\$4.000.000,00							
1862	1.8.1		Entregable 1: Marco Legal y Regulatorio ajustado	327 days	Tue 1/10/19	Wed 30/12/20	\$200.000,00							
1863	1.8.1.1		SCC_63. Contratación de Firma para la revisión del marco normativo en seguridad cibernética y de la información, del marco regulatorio actual, armonización de los mismos y una propuesta de cambio normativo	327 days	Tue 1/10/19	Wed 30/12/20	\$85.000,00							
1864	1.8.1.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 1/10/19	Thu 7/11/19	\$0,00							
1875	1.8.1.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 8/11/19	Wed 26/2/20	\$0,00							
1895	1.8.1.1.3		Etapa de ejecución del contrato	220 days	Wed 26/2/20	Wed 30/12/20	\$85.000,00							
1899	1.8.1.2		SCC_64. Contratación de Firma para Asesoría en temas relacionados con la administración de seguridad de la información para crear un modelo de política aplicable a instituciones públicas con infraestructura crítica y un código de conducta para operadores	327 days	Tue 1/10/19	Wed 30/12/20	\$115.000,00							
1900	1.8.1.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 1/10/19	Thu 7/11/19	\$0,00							
1911	1.8.1.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 8/11/19	Wed 26/2/20	\$0,00							
1931	1.8.1.2.3		Etapa de ejecución del contrato	220 days	Wed 26/2/20	Wed 30/12/20	\$115.000,00							
1935	1.8.2		Entregable 2: Manejo de Incidentes e Investigaciones a través del SOC	650 days	Fri 3/1/20	Thu 30/6/22	\$3.000.000,00							
1936	1.8.2.1		SBCC_65. Contratación de Firma para la implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para el Manejo de Incidentes e Investigaciones	650 days	Fri 3/1/20	Thu 30/6/22	\$3.000.000,00							
1937	1.8.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 3/1/20	Tue 11/2/20	\$0,00							
1948	1.8.2.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Wed 12/2/20	Thu 13/8/20	\$0,00							
1978	1.8.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	490 days	Thu 13/8/20	Thu 30/6/22	\$3.000.000,00							
1982	1.8.2.2		Provisión de herramientas y mejoramiento de la infraestructura para el CERT-PY en el marco de la implementación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)	22 days	Fri 3/1/20	Mon 3/2/20	\$0,00							
1983	1.8.2.2.1		Actividades y presupuesto a definir	22 days	Fri 3/1/20	Mon 3/2/20	\$0,00							
1984	1.8.3		Entregable 3: Implementación de un equipo de seguridad específico para infraestructuras críticas	367 days	Fri 3/1/20	Mon 31/5/21	\$145.000,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E	M	November B	E	September M	B	E	July M	B	May B	E	March M	B
1985	1.8.3.1		SBE_9. Adquisición de herramientas para infraestructuras críticas, incluye capacitación	324 days	Fri 3/1/20	Wed 31/3/21	\$100.000,00														
1986	1.8.3.1.1		Etapa previa	14 days	Fri 3/1/20	Wed 22/1/20	\$0,00														
1991	1.8.3.1.2		Proceso de Contratación	48 days	Thu 23/1/20	Mon 30/3/20	\$0,00														
2008	1.8.3.1.3		Ejecución del contrato	262 days	Mon 30/3/20	Wed 31/3/21	\$100.000,00														
2012	1.8.3.2		SCC_66. Contratación de Firma Consultora para la creación de una base de datos nacional de infraestructura crítica	367 days	Fri 3/1/20	Mon 31/5/21	\$45.000,00														
2013	1.8.3.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 3/1/20	Tue 11/2/20	\$0,00														
2024	1.8.3.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Wed 12/2/20	Mon 1/6/20	\$0,00														
2044	1.8.3.2.3		Etapa de ejecución del contrato	260 days	Mon 1/6/20	Mon 31/5/21	\$45.000,00														
2048	1.8.4		Entregable 4: Concienciación y Creación de Capacidad en Ciberseguridad	1238 days	Tue 4/2/20	Thu 31/10/24	\$605.000,00														
2049	1.8.4.1		SCC_67. Contratación de Firma para la elaboración de estudios de Ciberseguridad	238 days	Tue 4/2/20	Thu 31/12/20	\$110.000,00														
2050	1.8.4.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 4/2/20	Thu 12/3/20	\$0,00														
2061	1.8.4.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 13/3/20	Wed 1/7/20	\$0,00														
2081	1.8.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	131 days	Wed 1/7/20	Thu 31/12/20	\$110.000,00														
2085	1.8.4.2		SCC_68. Contratación de Firma para la realización de campañas comunicacionales para sensibilizar sobre buenas prácticas y riesgos de seguridad para los ciudadanos	987 days	Mon 4/1/21	Tue 15/10/24	\$195.000,00														
2086	1.8.4.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Mon 4/1/21	Wed 10/2/21	\$0,00														
2097	1.8.4.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Thu 11/2/21	Tue 1/6/21	\$0,00														
2117	1.8.4.2.3		Etapa de ejecución del contrato	880 days	Tue 1/6/21	Tue 15/10/24	\$195.000,00														
2121	1.8.4.3		SBC_126. Realización de capacitaciones y/o actualizaciones sobre ciberseguridad a través de universidades locales	1044 days	Mon 2/11/20	Thu 31/10/24	\$300.000,00														
2122	1.8.4.3.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Mon 2/11/20	Wed 9/12/20	\$0,00														
2133	1.8.4.3.2		Etapa de contratación	142 days	Thu 10/12/20	Mon 28/6/21	\$0,00														
2163	1.8.4.3.3		Ejecución del contrato	874 days	Mon 28/6/21	Thu 31/10/24	\$300.000,00														
2167	1.8.4.4		Realización de eventos de Ciberseguridad	874 days	Mon 28/6/21	Thu 31/10/24	\$0,00														
2168	1.8.4.4.1		Coorganización de congresos, seminarios, talleres de ciberseguridad, o similar	874 days	Mon 28/6/21	Thu 31/10/24	\$0,00														
2169	1.8.5		Actividades sin programar	1 day	Thu 31/10/24	Thu 31/10/24	\$50.000,00														
2170	1.8.5.1		Saldo para redondeo	1 day	Thu 31/10/24	Thu 31/10/24	\$50.000,00														
2171	2		Componente 2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas	1563 days	Tue 2/7/19	Thu 26/6/25	\$29.600.000,00														
2172	2.1	P9	Producto 9: Emprendimientos con Base Digital, financiados con capital semilla	1369 days	Fri 25/10/19	Wed 22/1/25	\$6.000.000,00														
2173	2.1.1		Hito 1: Emprendimientos con Base Digital de la Etapa I, realizados	1109 days	Fri 25/10/19	Wed 24/1/24	\$3.322.500,00														
2174	2.1.1.1		3CV_91. Contratación de consultor para la elaboración de los Reglamentos Operativos para el financiamiento de proyectos de Emprendimientos con Base Digital, Etapa I	113 days	Fri 25/10/19	Tue 31/3/20	\$20.000,00														

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
2175	2.1.1.1.1		Etapa previa	18 days	Fri 25/10/19	Tue 19/11/19	\$0,00							
2181	2.1.1.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Wed 20/11/19	Wed 29/1/20	\$0,00							
2197	2.1.1.1.3		Etapa de ejecución del contrato	44 days	Wed 29/1/20	Tue 31/3/20	\$20.000,00							
2201	2.1.1.2		SCC_69. Contratación de Firma para la elaboración del diseño e implementación de la plataforma de Emprendimientos con Base Digital de la Etapa I	284 days	Thu 26/12/19	Tue 26/1/21	\$22.500,00							
2202	2.1.1.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 26/12/19	Mon 3/2/20	\$0,00							
2213	2.1.1.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Tue 4/2/20	Fri 22/5/20	\$0,00							
2233	2.1.1.2.3		Etapa de ejecución del contrato	132 days	Fri 24/7/20	Tue 26/1/21	\$22.500,00							
2237	2.1.1.3		Difusión de las convocatorias	748 days	Fri 1/5/20	Tue 14/3/23	\$0,00							
2242	2.1.1.4	GRP - Act. # 3.2	Supervisión y monitoreo efectivos y asignación de recursos	132 days	Fri 1/5/20	Mon 2/11/20	\$0,00	Director Misional						
2243	2.1.1.5		Evento de lanzamiento	727 days	Tue 2/6/20	Wed 15/3/23	\$0,00							
2248	2.1.1.6		Apertura de la ventanilla y recepción de EBD	736 days	Wed 3/6/20	Wed 29/3/23	\$0,00							
2253	2.1.1.7		Evaluación de las propuestas	741 days	Wed 17/6/20	Wed 19/4/23	\$0,00							
2258	2.1.1.8		3CV_92. Contratación de consultor para el desarrollo de capacitaciones en modalidad presencial a potenciales beneficiarios de los fondos concursables de la Etapa I	984 days	Fri 17/4/20	Wed 24/1/24	\$120.000,00							
2259	2.1.1.8.1		Etapa previa	18 days	Fri 17/4/20	Tue 12/5/20	\$0,00							
2265	2.1.1.8.2		Etapa de Contratación	51 days	Wed 13/5/20	Wed 22/7/20	\$0,00							
2281	2.1.1.8.3		Etapa de ejecución del contrato	915 days	Wed 22/7/20	Wed 24/1/24	\$120.000,00							
2291	2.1.1.9		SBE_21. Contratación de servicios para la realización de eventos de premiación a proyectos de Emprendimientos con Base Digital	723 days	Mon 20/7/20	Wed 26/4/23	\$160.000,00							
2292	2.1.1.9.1		Etapa previa	14 days	Mon 20/7/20	Thu 6/8/20	\$0,00							
2297	2.1.1.9.2		Etapa de contratación	48 days	Fri 7/8/20	Tue 13/10/20	\$0,00							
2314	2.1.1.9.3		Ejecución del contrato	661 days	Tue 13/10/20	Wed 26/4/23	\$160.000,00							
2324	2.1.1.10		Ejecución de los EBD de la Etapa I	808 days	Wed 21/10/20	Fri 24/11/23	\$3.000.000,00							
2329	2.1.1.11		Cierre de los EBD de la Etapa I	678 days	Fri 21/5/21	Tue 26/12/23	\$0,00							
2334	2.1.2		Hito 2: Emprendimientos con Base Digital de la Etapa II, realizados	1300 days	Wed 29/1/20	Wed 22/1/25	\$2.677.500,00							
2335	2.1.2.1		3CV_91. Contratación de consultor para la elaboración de los Reglamentos Operativos para el financiamiento de proyectos de Emprendimientos con Base Digital, Etapa II	44 days	Wed 29/1/20	Tue 31/3/20	\$20.000,00							
2336	2.1.2.1.1		Etapa de ejecución del contrato	44 days	Wed 29/1/20	Tue 31/3/20	\$20.000,00							
2340	2.1.2.2		SCC_69. Contratación de Firma para la elaboración del diseño e implementación de la plataforma de Emprendimientos con Base Digital de la Etapa II	132 days	Fri 24/7/20	Tue 26/1/21	\$37.500,00							
2341	2.1.2.2.1		Etapa de ejecución del contrato	132 days	Fri 24/7/20	Tue 26/1/21	\$37.500,00							
2345	2.1.2.3		Difusión de las convocatorias	748 days	Mon 3/5/21	Wed 13/3/24	\$0,00							
2350	2.1.2.4	GRP - Act. # 3.2	Supervisión y monitoreo efectivos y asignación de recursos	132 days	Mon 3/5/21	Tue 2/11/21	\$0,00	Director del Programa						
2351	2.1.2.5		Apertura de la ventanilla y recepción de EBD de la Etapa II	736 days	Wed 2/6/21	Wed 27/3/24	\$0,00							
2356	2.1.2.6		Evaluación de las propuestas	729 days	Fri 2/7/21	Wed 17/4/24	\$0,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B E	July M	May B E	March M B
2361	2.1.2.7		3CV_93. Contratación de consultor para el desarrollo de capacitaciones en modalidad presencial a potenciales beneficiarios de los fondos concursables de la Etapa II	980 days	Thu 22/4/21	Wed 22/1/25	\$40.000,00							
2362	2.1.2.7.1		Etapa previa	18 days	Thu 22/4/21	Mon 17/5/21	\$0,00							
2368	2.1.2.7.2		Etapa de Contratación	51 days	Tue 18/5/21	Tue 27/7/21	\$0,00							
2384	2.1.2.7.3		Etapa de ejecución del contrato	911 days	Tue 27/7/21	Wed 22/1/25	\$40.000,00							
2394	2.1.2.8		SBE_20. Contratación de servicios para la realización de eventos de premiación a proyectos de Emprendimientos con Base Digital	727 days	Mon 12/7/21	Wed 24/4/24	\$80.000,00							
2395	2.1.2.8.1		Ejecución del contrato	727 days	Mon 12/7/21	Wed 24/4/24	\$80.000,00							
2405	2.1.2.9		Ejecución de los EBD de la Etapa II	866 days	Fri 30/7/21	Fri 22/11/24	\$2.500.000,00							
2410	2.1.2.10		Cierre de los EBD de la Etapa II	491 days	Wed 4/5/22	Wed 20/3/24	\$0,00							
2415	2.2	P10	Producto 10: Actividades para la promoción del emprendedurismo con BD, realizadas	1328 days	Thu 27/2/20	Mon 31/3/25	\$1.000.000,00							
2416	2.2.1		Hito 1: Emprendimientos con Base Digital en fase de expansión, promocionados	1274 days	Fri 17/4/20	Wed 5/3/25	\$230.000,00							
2417	2.2.1.1		Difusión de las convocatorias	990 days	Fri 1/5/20	Thu 15/2/24	\$0,00							
2423	2.2.1.2		Apertura de la ventanilla y recepción de EBD de la Etapa II	978 days	Tue 2/6/20	Thu 29/2/24	\$0,00							
2429	2.2.1.3		Evaluación de las propuestas	983 days	Tue 16/6/20	Thu 21/3/24	\$0,00							
2435	2.2.1.4		3CV_94. Contratación de consultor para realizar capacitaciones en modalidad presencial a emprendedores de Proyectos con Base Digital en fase de expansión	1225 days	Fri 17/4/20	Thu 26/12/24	\$5.000,00							
2436	2.2.1.4.1		Etapa previa	18 days	Fri 17/4/20	Tue 12/5/20	\$0,00							
2442	2.2.1.4.2		Etapa de Contratación	51 days	Wed 13/5/20	Wed 22/7/20	\$0,00							
2458	2.2.1.4.3		Etapa de ejecución del contrato	1156 days	Wed 22/7/20	Thu 26/12/24	\$5.000,00							
2470	2.2.1.5		SBE_22. Contratación de servicios para la realización de eventos de premiación a proyectos de Emprendimientos con Base Digital en fase de expansión	1164 days	Mon 20/7/20	Thu 2/1/25	\$25.000,00							
2471	2.2.1.5.1		Etapa previa	14 days	Mon 20/7/20	Thu 6/8/20	\$0,00							
2476	2.2.1.5.2		Etapa de contratación	48 days	Fri 7/8/20	Tue 13/10/20	\$0,00							
2493	2.2.1.5.3		Ejecución del contrato	1102 days	Tue 13/10/20	Thu 2/1/25	\$25.000,00							
2505	2.2.1.6		Participación en plataformas internacionales de apoyo y desarrollo de EBD	1000 days	Thu 6/5/21	Wed 5/3/25	\$200.000,00							
2511	2.2.2		Hito 2: Emprendedores, inversores y gestores, capacitados	1328 days	Thu 27/2/20	Mon 31/3/25	\$770.000,00							
2512	2.2.2.1		SBCC_127. Contratación de servicios de capacitación para emprendedores de Proyectos con Base Digital	1292 days	Fri 17/4/20	Mon 31/3/25	\$400.000,00							
2513	2.2.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 17/4/20	Tue 26/5/20	\$0,00							
2524	2.2.2.1.2		Etapa de contratación	132 days	Tue 19/5/20	Wed 18/11/20	\$0,00							
2554	2.2.2.1.3		Ejecución del contrato	1138 days	Wed 18/11/20	Mon 31/3/25	\$400.000,00							
2566	2.2.2.2		SCC_128. Contratación de servicios de capacitación para mentores de Proyectos con Base Digital	1287 days	Thu 27/2/20	Fri 31/1/25	\$90.000,00							
2567	2.2.2.2.4		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 27/2/20	Mon 6/4/20	\$0,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
2578	2.2.2.2.5		Etapa de Contratación	79 days	Tue 7/4/20	Fri 24/7/20	\$0,00							
2598	2.2.2.2.3		Ejecución del contrato	1180 days	Fri 24/7/20	Fri 31/1/25	\$90.000,00							
2610	2.2.2.3		SCC_129. Contratación de servicios de capacitación para inversores	1321 days	Thu 27/2/20	Thu 20/3/25	\$100.000,00							
2611	2.2.2.3.4		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 27/2/20	Mon 6/4/20	\$0,00							
2622	2.2.2.3.5		Etapa de Contratación	79 days	Tue 7/4/20	Fri 24/7/20	\$0,00							
2642	2.2.2.3.3		Ejecución del contrato	1214 days	Fri 24/7/20	Thu 20/3/25	\$100.000,00							
2654	2.2.2.4		SCC_130. Contratación de servicios de capacitación para agentes financieros de Proyectos con Base Digital	1321 days	Thu 27/2/20	Thu 20/3/25	\$180.000,00							
2655	2.2.2.4.4		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 27/2/20	Mon 6/4/20	\$0,00							
2666	2.2.2.4.5		Etapa de Contratación	79 days	Tue 7/4/20	Fri 24/7/20	\$0,00							
2686	2.2.2.4.3		Ejecución del contrato	1214 days	Fri 24/7/20	Thu 20/3/25	\$180.000,00							
2699	2.3	P11	Producto 11: Iniciativas Digitales Extranjeras, captadas	1154 days	Tue 28/1/20	Fri 28/6/24	\$2.500.000,00							
2700	2.3.1		SBCC_70. Contratación de Firma para Asesoría temas legales, laborales, financieros e impositivos para Iniciativas Digitales Extranjeras	1154 days	Tue 28/1/20	Fri 28/6/24	\$2.500.000,00							
2701	2.3.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 28/1/20	Thu 5/3/20	\$0,00							
2712	2.3.1.2		Etapa de Contratación	132 days	Fri 6/3/20	Mon 7/9/20	\$0,00							
2742	2.3.1.3		Etapa de ejecución del contrato	994 days	Mon 7/9/20	Fri 28/6/24	\$2.500.000,00							
2752	2.4	P12	Producto 12: Jóvenes con talento digital identificado	1216 days	Fri 1/11/19	Fri 28/6/24	\$1.000.000,00							
2753	2.4.1		SCC_71. Contratación de Firma para el diseño de Olimpiadas de Talento Digital	173 days	Fri 1/11/19	Tue 30/6/20	\$50.000,00							
2754	2.4.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 1/11/19	Tue 10/12/19	\$0,00							
2765	2.4.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Wed 11/12/19	Mon 30/3/20	\$0,00							
2785	2.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	66 days	Mon 30/3/20	Tue 30/6/20	\$50.000,00							
2789	2.4.2		CD_72. Contratación de entidad para la organización de las Olimpiadas para identificar jóvenes con talento digital	978 days	Wed 1/7/20	Fri 29/3/24	\$720.000,00							
2790	2.4.2.1		Etapa previa	26 days	Wed 1/7/20	Wed 5/8/20	\$0,00							
2798	2.4.2.2		Proceso de Contratación	52 days	Thu 6/8/20	Fri 16/10/20	\$0,00							
2818	2.4.2.3		Ejecución del contrato	900 days	Fri 16/10/20	Fri 29/3/24	\$720.000,00							
2828	2.4.3		3CV_95. Contratación de consultor para la sistematización de los resultados de las Olimpiadas de Talento Digital y lecciones aprendidas.	135 days	Mon 25/12/23	Fri 28/6/24	\$90.000,00							
2829	2.4.3.1		Etapa previa	18 days	Mon 25/12/23	Wed 17/1/24	\$0,00							
2835	2.4.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Thu 18/1/24	Thu 28/3/24	\$0,00							
2851	2.4.3.3		Etapa de ejecución del contrato	66 days	Thu 28/3/24	Fri 28/6/24	\$90.000,00							
2855	2.4.4		SBE_23. Contratación de servicios comunicacionales para difusión de actividades de las Olimpiadas de Talento Digital	1001 days	Wed 1/7/20	Wed 1/5/24	\$140.000,00							
2856	2.4.4.1		Etapa previa	14 days	Wed 1/7/20	Mon 20/7/20	\$0,00							
2861	2.4.4.2		Etapa de contratación	48 days	Tue 21/7/20	Thu 24/9/20	\$0,00							
2878	2.4.4.3		Ejecución del contrato	938 days	Thu 24/9/20	Tue 30/4/24	\$120.000,00							
2882	2.4.4.4		Saldo para redondeo	1 day	Wed 1/5/24	Wed 1/5/24	\$20.000,00							



Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
2883	2.5	P13	Producto 13: Personas formadas en certificaciones de competencias digitales	1195 days	Tue 3/12/19	Mon 1/7/24	\$1.000.000,00							
2884	2.5.1		Funcionamiento de una mesa de diálogo	1173 days	Wed 1/1/20	Fri 28/6/24	\$42.000,00							
2886	2.5.2		Talleres de articulación	1173 days	Wed 1/1/20	Fri 28/6/24	\$60.000,00							
2888	2.5.3		SBCC_131. Contratación de servicios de capacitación para realizar cursos de corta duración en modalidad presencial a través de plataformas digitales	1194 days	Tue 3/12/19	Fri 28/6/24	\$207.000,00							
2889	2.5.3.4		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 3/12/19	Thu 9/1/20	\$0,00							
2900	2.5.3.5		Etapas de contratación	132 days	Thu 2/1/20	Fri 3/7/20	\$0,00							
2930	2.5.3.3		Ejecución del contrato	1040 days	Fri 3/7/20	Fri 28/6/24	\$207.000,00							
2940	2.5.4		SBCC_132. Contratación de servicios de capacitación para realizar cursos de larga duración en modalidad presencial a través de plataformas digitales	1195 days	Tue 3/12/19	Mon 1/7/24	\$691.000,00							
2941	2.5.4.5		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 3/12/19	Thu 9/1/20	\$0,00							
2952	2.5.4.6		Etapas de contratación	132 days	Thu 2/1/20	Fri 3/7/20	\$0,00							
2982	2.5.4.3		Ejecución del contrato	1040 days	Fri 3/7/20	Fri 28/6/24	\$690.000,00							
2992	2.5.4.4		Saldo para redondeo	1 day	Mon 1/7/24	Mon 1/7/24	\$1.000,00							
2993	2.6	P14	Producto 14: Proyectos asociativos para la mejora de programas de formación en tecnologías digitales, ejecutados	1239 days	Wed 1/1/20	Mon 30/9/24	\$1.300.000,00							
2994	2.6.1		Funcionamiento de una mesa de articulación	1173 days	Wed 1/1/20	Fri 28/6/24	\$63.000,00							
2996	2.6.2		Proyectos de mejora	1173 days	Thu 2/4/20	Mon 30/9/24	\$900.000,00							
2998	2.6.3		SBE_24. Contratación de servicios para organización de talleres y eventos	1103 days	Wed 8/4/20	Fri 28/6/24	\$120.000,00							
2999	2.6.3.1		Etapas previas	14 days	Wed 8/4/20	Mon 27/4/20	\$0,00							
3004	2.6.3.2		Proceso de Contratación	48 days	Tue 28/4/20	Thu 2/7/20	\$0,00							
3021	2.6.3.3		Ejecución del contrato	1041 days	Thu 2/7/20	Fri 28/6/24	\$120.000,00							
3031	2.6.4		Consolidación del Observatorio Tecnológico	824 days	Wed 3/2/21	Mon 1/4/24	\$217.000,00							
3032	2.6.4.1		SCC_73. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del mapa de talento humano de TICS en Paraguay	715 days	Wed 3/2/21	Tue 31/10/23	\$120.000,00							
3033	2.6.4.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 3/2/21	Fri 12/3/21	\$0,00							
3044	2.6.4.1.2		Etapas de Contratación	79 days	Mon 15/3/21	Thu 1/7/21	\$0,00							
3064	2.6.4.1.3		Etapas de ejecución del contrato	608 days	Thu 1/7/21	Tue 31/10/23	\$120.000,00							
3070	2.6.4.2		SCC_74. Contratación de Firma para la realización de la Encuesta Nacional de Innovación Empresarial	704 days	Wed 21/7/21	Mon 1/4/24	\$97.000,00							
3071	2.6.4.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Wed 21/7/21	Fri 27/8/21	\$0,00							
3082	2.6.4.2.2		Etapas de Contratación	79 days	Mon 30/8/21	Thu 16/12/21	\$0,00							
3102	2.6.4.2.3		Etapas de ejecución del contrato	597 days	Thu 16/12/21	Mon 1/4/24	\$97.000,00							
3109	2.7	P15	Producto 15: Servicios para la industria de TIC implementados	1106 days	Fri 3/4/20	Fri 28/6/24	\$300.000,00							
3110	2.7.1		Proyectos de servicios para la industria de TIC	1106 days	Fri 3/4/20	Fri 28/6/24	\$300.000,00							
3120	2.8	P16	Producto 16: Proyectos de transformación digital sectorial financiados	1173 days	Wed 3/6/20	Fri 29/11/24	\$7.000.000,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B E	July M	May B E	March M B
3121	2.8.1		Mesa de articulación	1173 days	Wed 3/6/20	Fri 29/11/24	\$600.000,00							
3123	2.8.2		Proyectos de inversión concursados	1041 days	Fri 3/7/20	Fri 28/6/24	\$6.400.000,00							
3132	2.9	P17	Producto 17: Distrito digital operando	1563 days	Tue 2/7/19	Thu 26/6/25	\$9.500.000,00							
3133	2.9.1		Hito 1: Modelo de Gestión Institucional y Financiero del Distrito, elaborado	157 days	Thu 24/10/19	Fri 29/5/20	\$20.000,00							
3134	2.9.1.1		3CV_96. Contratación de Consultor para la elaboración del Estudio del Modelo de Gestión Institucional y Financiero del Distrito Digital	157 days	Thu 24/10/19	Fri 29/5/20	\$20.000,00							
3135	2.9.1.1.1		Etapa previa	18 days	Thu 24/10/19	Mon 18/11/19	\$0,00							
3141	2.9.1.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Tue 19/11/19	Tue 28/1/20	\$0,00							
3157	2.9.1.1.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Tue 28/1/20	Fri 29/5/20	\$20.000,00							
3161	2.9.2		Hito 2: Diseño y proyecto ejecutivo, elaborados	374 days	Tue 2/7/19	Fri 4/12/20	\$220.000,00							
3162	2.9.2.1	GRP - Act. 3.3	Evaluar locaciones alternativas para el distrito digital	132 days	Tue 2/7/19	Wed 1/1/20	\$0,00							
3163	2.9.2.2		SBCC_75. Contratación de Firma para la elaboración del Diseño Ejecutivo de Obras para el Distrito Digital	292 days	Thu 24/10/19	Fri 4/12/20	\$220.000,00							
3164	2.9.2.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Thu 24/10/19	Mon 2/12/19	\$0,00							
3175	2.9.2.2.2		Etapa de Contratación	132 days	Tue 3/12/19	Wed 3/6/20	\$0,00							
3205	2.9.2.2.3		Etapa de ejecución del contrato	132 days	Wed 3/6/20	Fri 4/12/20	\$220.000,00							
3209	2.9.3		Hito 3: Obras del distrito digital, ejecutadas	653 days	Mon 30/11/20	Wed 31/5/23	\$8.708.450,00							
3210	2.9.3.1		LPI_3. Contratación de Firma Constructora para la Construcción de los Edificios del Distrito Digital (SENATICS, Incubadora y co-working, sede del distrito, centro de investigación digital y urbanización)	577 days	Mon 7/12/20	Tue 21/2/23	\$8.312.750,00							
3211	2.9.3.1.1		Etapa previa	28 days	Mon 7/12/20	Wed 13/1/21	\$0,00							
3218	2.9.3.1.2		Etapa de Contratación	99 days	Thu 14/1/21	Tue 1/6/21	\$0,00							
3239	2.9.3.1.3		Ejecución del contrato	450 days	Tue 1/6/21	Tue 21/2/23	\$8.312.750,00							
3243	2.9.3.2		SCC_76. Contratación de Firma para la Supervisión de Obras de la construcción del Edificio de la SENATICS	610 days	Mon 30/11/20	Fri 31/3/23	\$95.700,00							
3244	2.9.3.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Mon 30/11/20	Wed 6/1/21	\$0,00							
3255	2.9.3.2.2		Etapa de Contratación	79 days	Thu 7/1/21	Tue 27/4/21	\$0,00							
3275	2.9.3.2.3		Etapa de ejecución del contrato	503 days	Tue 27/4/21	Fri 31/3/23	\$95.700,00							
3278	2.9.3.3		LPI_10. Adquisición de equipamiento para los edificios del Distrito Digital	263 days	Mon 30/5/22	Wed 31/5/23	\$300.000,00							
3279	2.9.3.3.1		Etapa previa	28 days	Mon 30/5/22	Wed 6/7/22	\$0,00							
3286	2.9.3.3.2		Etapa de contratación	99 days	Thu 7/7/22	Tue 22/11/22	\$0,00							
3307	2.9.3.3.3		Ejecución del contrato	136 days	Wed 23/11/22	Wed 31/5/23	\$300.000,00							
3310	2.9.4		LPI_25. Contratación de servicios para la Administración del Distrito Digital	647 days	Wed 4/1/23	Thu 26/6/25	\$380.000,00							
3311	2.9.4.1		Etapa previa	28 days	Wed 4/1/23	Fri 10/2/23	\$0,00							
3318	2.9.4.2		Etapa de Contratación	99 days	Mon 13/2/23	Thu 29/6/23	\$0,00							
3339	2.9.4.3		Ejecución del contrato	520 days	Thu 29/6/23	Thu 26/6/25	\$380.000,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
3343	2.9.5		Operación	457 days	Fri 30/6/23	Mon 31/3/25	\$144.000,00							
3345	2.9.6		Saldo para redondeo	1 day	Mon 31/3/25	Mon 31/3/25	\$27.550,00							
3346	3		Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$47.900.000,00							
3347	3.1	P18	Producto 18: Sitios y edificios públicos conectados	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$10.400.000,00							
3348	3.1.1		Hito 1: Sitios públicos conectados	1233 days	Tue 1/10/19	Thu 20/6/24	\$2.576.957,00							
3349	3.1.1.1	GRP - Act. # 3.5	Ayuda memoria con plan de ejecución interinstitucional	66 days	Tue 1/10/19	Tue 31/12/19	\$0,00	Director del Programa						
3350	3.1.1.2		LPI_25. Contratación de Servicios de conectividad para el público en espacios públicos abiertos (plazas) - Grupo 1	648 days	Tue 7/1/20	Thu 30/6/22	\$1.191.861,00							
3351	3.1.1.2.1		Etapla previa	28 days	Tue 7/1/20	Thu 13/2/20	\$0,00							
3358	3.1.1.2.2		Etapla de Contratación	99 days	Fri 14/2/20	Wed 1/7/20	\$0,00							
3379	3.1.1.2.3		Ejecución del contrato	521 days	Wed 1/7/20	Thu 30/6/22	\$1.191.861,00							
3384	3.1.1.3		LPI_26. Contratación de Servicios de conectividad para el público en espacios públicos abiertos (plazas) - Grupo 2	637 days	Wed 12/1/22	Thu 20/6/24	\$1.191.861,00							
3385	3.1.1.3.1		Etapla previa	28 days	Wed 12/1/22	Fri 18/2/22	\$0,00							
3392	3.1.1.3.2		Etapla de Contratación	99 days	Mon 21/2/22	Thu 7/7/22	\$0,00							
3413	3.1.1.3.3		Ejecución del contrato	510 days	Thu 7/7/22	Thu 20/6/24	\$1.191.861,00							
3418	3.1.1.4		LPI_11. Adquisición de servidores (nodo central) para soporte de la conectividad de Espacios Públicos (plazas)	215 days	Mon 6/1/20	Fri 30/10/20	\$193.235,00							
3419	3.1.1.4.1		Etapla previa	28 days	Mon 6/1/20	Wed 12/2/20	\$0,00							
3426	3.1.1.4.2		Etapla de Contratación	99 days	Thu 13/2/20	Tue 30/6/20	\$0,00							
3447	3.1.1.4.3		Ejecución del contrato	88 days	Tue 30/6/20	Fri 30/10/20	\$193.235,00							
3451	3.1.2		Hito 2: Sitios públicos del MSPBS conectados	1239 days	Tue 1/10/19	Fri 28/6/24	\$4.351.478,00							
3452	3.1.2.1	GRP - Act. # 3.5	Ayuda memoria con plan de ejecución interinstitucional	66 days	Tue 1/10/19	Tue 31/12/19	\$0,00	Director del Programa						
3453	3.1.2.2		LPI_28. Contratación de Servicios de conectividad para Establecimientos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1164 days	Tue 14/1/20	Fri 28/6/24	\$4.158.243,00							
3454	3.1.2.2.1		Etapla previa	28 days	Tue 14/1/20	Thu 20/2/20	\$0,00							
3461	3.1.2.2.2		Etapla de Contratación	99 days	Fri 21/2/20	Wed 8/7/20	\$0,00							
3482	3.1.2.2.3		Ejecución del contrato	1037 days	Wed 8/7/20	Fri 28/6/24	\$4.158.243,00							
3489	3.1.2.3		LPI_11. Adquisición de servidores (nodo central) para soporte de la conectividad de Establecimientos del MSPBS	88 days	Tue 30/6/20	Fri 30/10/20	\$193.235,00							
3490	3.1.2.3.1		Ejecución del contrato	88 days	Tue 30/6/20	Fri 30/10/20	\$193.235,00							
3494	3.1.3		Hito 3: Antenas de transmisión de señal TDT instaladas y/o repotenciadas	1168 days	Thu 7/1/21	Mon 30/6/25	\$3.071.565,00							
3495	3.1.3.1		LPI 12_Adquisición de antenas, incluye instalación de torres (cuando aplique) y provisión de decodificadores de señal	1168 days	Thu 7/1/21	Mon 30/6/25	\$3.071.565,00							
3496	3.1.3.1.1		Etapla previa	28 days	Thu 7/1/21	Mon 15/2/21	\$0,00							
3503	3.1.3.1.2		Proceso de Contratación	99 days	Tue 16/2/21	Fri 2/7/21	\$0,00							
3524	3.1.3.1.3		Ejecución del contrato	1041 days	Fri 2/7/21	Mon 30/6/25	\$3.071.565,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
3534	3.1.4		SBCC_136. Contratación de Estudios para la instalación del primer Satélite del Paraguay y puesta en marcha de un Programa Nacional de Observación Terrestre	678 days	Tue 26/11/19	Thu 30/6/22	\$400.000,00							
3535	3.1.4.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 26/11/19	Thu 2/1/20	\$0,00							
3546	3.1.4.2		Etapas de Contratación	132 days	Fri 3/1/20	Mon 6/7/20	\$0,00							
3576	3.1.4.3		Etapas de ejecución del contrato	518 days	Mon 6/7/20	Thu 30/6/22	\$400.000,00							
3580	3.2	P19	Producto 19: Data Center operando	1433 days	Wed 1/1/20	Fri 27/6/25	\$23.000.000,00							
3581	3.2.1		Hito 1: Data Center construido	1048 days	Tue 7/1/20	Thu 11/1/24	\$12.427.729,00							
3582	3.2.1.1		SBCC_77. Contratación de Firma Consultora para el desarrollo del Diseño ejecutivo de obras	248 days	Tue 7/1/20	Thu 17/12/20	\$637.500,00							
3583	3.2.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 7/1/20	Thu 13/2/20	\$0,00							
3594	3.2.1.1.2		Etapas de Contratación	132 days	Fri 14/2/20	Mon 17/8/20	\$0,00							
3624	3.2.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	88 days	Mon 17/8/20	Thu 17/12/20	\$637.500,00							
3628	3.2.1.2		LPI_4. Contratación de Firma Constructora para la Construcción del Data Center, incluye trabajos preliminares de obras e Intalaciones	378 days	Fri 1/7/22	Tue 12/12/23	\$11.095.546,00							
3629	3.2.1.2.1		Etapas previas	28 days	Fri 1/7/22	Tue 9/8/22	\$0,00							
3636	3.2.1.2.2		Proceso de Contratación	99 days	Wed 10/8/22	Mon 26/12/22	\$0,00							
3657	3.2.1.2.3		Ejecución del contrato	251 days	Mon 26/12/22	Tue 12/12/23	\$11.095.546,00							
3661	3.2.1.3		SBCC_78. Supervisión obras de construcción del Data Center	455 days	Fri 15/4/22	Thu 11/1/24	\$180.933,00							
3662	3.2.1.3.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 15/4/22	Tue 24/5/22	\$0,00							
3673	3.2.1.3.2		Etapas de Contratación	132 days	Wed 25/5/22	Thu 24/11/22	\$0,00							
3703	3.2.1.3.3		Etapas de ejecución del contrato	295 days	Thu 24/11/22	Thu 11/1/24	\$180.933,00							
3706	3.2.1.4		LPI_29_Contratación de Servicios para Certificación TIER III	215 days	Wed 15/2/23	Tue 12/12/23	\$513.750,00							
3707	3.2.1.4.1		Etapas previas	28 days	Wed 15/2/23	Fri 24/3/23	\$0,00							
3714	3.2.1.4.2		Proceso de Contratación	99 days	Mon 27/3/23	Thu 10/8/23	\$0,00							
3735	3.2.1.4.3		Ejecución del contrato	88 days	Thu 10/8/23	Tue 12/12/23	\$513.750,00							
3738	3.2.2		Hito2: Data Center equipado	261 days	Fri 12/1/24	Fri 10/1/25	\$6.572.271,00							
3739	3.2.2.1		LPI_13. Adquisición de equipamiento para el centro de datos, incluye RACKS, Cerramientos pasillos frios, PDU'S INTELIGENTES, cabina principal de almacenamiento, cabinas back-up, entre otros.	261 days	Fri 12/1/24	Fri 10/1/25	\$6.572.271,00							
3740	3.2.2.1.1		Etapas previas	28 days	Fri 12/1/24	Tue 20/2/24	\$0,00							
3747	3.2.2.1.2		Etapas de Contratación	99 days	Wed 21/2/24	Mon 8/7/24	\$0,00							
3768	3.2.2.1.3		Ejecución del contrato	134 days	Mon 8/7/24	Fri 10/1/25	\$6.572.271,00							
3773	3.2.3		Hito 3: NOC instalado	120 days	Mon 13/1/25	Fri 27/6/25	\$4.000.000,00							
3774	3.2.3.1		Equipamiento para el NOC	120 days	Mon 13/1/25	Fri 27/6/25	\$4.000.000,00							
3776	3.2.4	GRP - Act. # 3.6	En el corto plazo contratar a los recursos humanos y en el largo plazo capacitarlos	130 days	Wed 1/1/20	Tue 30/6/20	\$0,00	Director del Programa						
3777	3.3	P20	Producto 20: Derechos de uso para conectividad internacional, adquiridos	913 days	Wed 1/1/20	Fri 30/6/23	\$14.500.000,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January		November		September		July		May		March	
									E	M	B	E	M	B	E	M	B	E	M	B
3778	3.3.1	GRP - Act. # 3.7	Elaborar un plan de socialización y consulta pública de los pliegos de bases y condiciones	130 days	Wed 1/1/20	Tue 30/6/20	\$0,00	Director del Programa												
3779	3.3.2	GRP - Act. # 3.8	Aprobación del plan de gobernanza y modelos de negocios antes de iniciar la licitación de los derechos de uso de la conectividad internacional	132 days	Wed 1/1/20	Thu 2/7/20	\$0,00	Director del Programa												
3780	3.3.3		LPI_30. Adquisición de Derechos de uso para conectividad internacional vía Argentina	781 days	Fri 3/7/20	Fri 30/6/23	\$13.500.000,00													
3781	3.3.3.1		Etapla previa	28 days	Fri 3/7/20	Tue 11/8/20	\$0,00													
3788	3.3.3.2		Etapla de Contratación	99 days	Wed 12/8/20	Mon 28/12/20	\$0,00													
3809	3.3.3.3		Ejecución del contrato	654 days	Mon 28/12/20	Fri 30/6/23	\$13.500.000,00													
3813	3.3.4		Provisión de IXP	254 days	Fri 10/7/20	Wed 30/6/21	\$1.000.000,00													
3815	4		Componente 4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital	1670 days	Mon 4/2/19	Fri 27/6/25	\$13.400.000,00													
3816	4.1	P21	Producto 21: Nuevo Modelo de Gestión institucional diseñado e implementado	1670 days	Mon 4/2/19	Fri 27/6/25	\$500.000,00													
3817	4.1.1		Hito 1: Diagnóstico situacional en profundidad y propuesta de diseño del Nuevo Modelo elaborado	264 days	Mon 4/2/19	Thu 6/2/20	\$0,00													
3820	4.1.2		Hito 2: Nuevo Plan Estratégico Institucional diseñado	264 days	Mon 4/2/19	Thu 6/2/20	\$0,00													
3823	4.1.3		Hito 3: Instrumentos para la redefinición del Nuevo Modelo de Gestión institucional diseñados	750 days	Fri 7/2/20	Thu 22/12/22	\$0,00													
3829	4.1.4		Hito 4: Instrumentos de Gestión aprobados e implementados	750 days	Fri 5/2/21	Thu 21/12/23	\$0,00													
3834	4.1.5		Hito 5: Estrategia de Gestión del Cambio diseñada e implementada	1406 days	Fri 7/2/20	Fri 27/6/25	\$0,00													
3838	4.1.6		Entregable 6: Diseño final del Nuevo Modelo de Gestión y actividades de implementación (SEGUNDA ETAPA)	980 days	Mon 11/5/20	Fri 9/2/24	\$200.000,00													
3843	4.1.7		Entregable 7: Actividades de consolidación del Nuevo Modelo de Gestión (TERCERA ETAPA)	264 days	Mon 5/6/23	Thu 6/6/24	\$300.000,00													
3847	4.2	P22	Producto 22: Modelos de costeo, esquemas de operación y herramientas de medidas de calidad de servicios corporativos, desarrollados	872 days	Fri 26/11/21	Mon 31/3/25	\$400.000,00													
3848	4.2.1		SBCC_79. Contratación de Firma Consultora para la elaboración de modelos de costeo, esquemas de operación y herramientas de medidas de calidad de servicios para la SENATICS	676 days	Fri 26/11/21	Fri 28/6/24	\$400.000,00													
3849	4.2.1.1		Etapla de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 26/11/21	Tue 4/1/22	\$0,00													
3860	4.2.1.2		Etapla de Contratación	132 days	Wed 5/1/22	Thu 7/7/22	\$0,00													
3890	4.2.1.3		Etapla de ejecución del contrato	516 days	Thu 7/7/22	Fri 28/6/24	\$400.000,00													
3895	4.2.2	GRP - Act. # 2.8	Buscar alternativas de generación de ingresos propios a partir de la venta de servicios a otras instituciones públicas que actualmente SENATICS realiza gratuitamente	462 days	Fri 23/6/23	Mon 31/3/25	\$0,00													
3896	4.3	P23	Producto 23: Sistema Informático Integrado de Gestión implementado	1342 days	Fri 7/2/20	Mon 31/3/25	\$500.000,00													
3897	4.3.1		Hito 1: Sistema Informático Integrado de Gestión diseñado	559 days	Fri 7/2/20	Wed 30/3/22	\$50.000,00													



Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
3898	4.3.1.1		SBCC_80. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del diseño, el desarrollo y la implementación del Sistema Informático Integrado de Gestión de SENATICS	559 days	Fri 7/2/20	Wed 30/3/22	\$50.000,00							
3899	4.3.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 7/2/20	Tue 17/3/20	\$0,00							
3910	4.3.1.1.2		Etapas de Contratación	132 days	Wed 18/3/20	Thu 17/9/20	\$0,00							
3940	4.3.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	399 days	Thu 17/9/20	Wed 30/3/22	\$50.000,00							
3944	4.3.2		Hito 2: Sistema Informático Integrado de Gestión desarrollado	264 days	Thu 31/3/22	Tue 4/4/23	\$225.000,00							
3945	4.3.2.1		SBCC_80. Contratación de Firma Consultora para la elaboración del diseño, el desarrollo y la implementación del Sistema Informático Integrado de Gestión de SENATICS	264 days	Thu 31/3/22	Tue 4/4/23	\$225.000,00							
3946	4.3.2.1.1		Etapas de ejecución del contrato	264 days	Thu 31/3/22	Tue 4/4/23	\$225.000,00							
3949	4.3.3		Actividades para la implementación del SIIG SENATICS	519 days	Wed 5/4/23	Mon 31/3/25	\$225.000,00	Firma Consultora						
3950	4.3.4		Sistema Informático Integrado de Gestión implementado	0 days	Mon 31/3/25	Mon 31/3/25	\$0,00							
3951	4.4	P24	Producto 24: Capacidad técnica y operativa de la SENATICS incrementada	1435 days	Tue 1/10/19	Mon 31/3/25	\$6.000.000,00							
3952	4.4.1		3CV_97. Contratación de profesionales varios - Grupo 1	849 days	Tue 1/10/19	Fri 30/12/22	\$1.800.000,00							
3953	4.4.1.1		Etapas previas	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
3959	4.4.1.2		Etapas de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
3975	4.4.1.3		Etapas de ejecución del contrato	780 days	Fri 3/1/20	Fri 30/12/22	\$1.800.000,00							
3979	4.4.2		3CV_98. Contratación de profesionales varios - Grupo 2	849 days	Tue 31/3/20	Fri 30/6/23	\$1.440.000,00							
3980	4.4.2.1		Etapas previas	18 days	Tue 31/3/20	Thu 23/4/20	\$0,00							
3986	4.4.2.2		Etapas de Contratación	51 days	Fri 24/4/20	Fri 3/7/20	\$0,00							
4002	4.4.2.3		Etapas de ejecución del contrato	780 days	Fri 3/7/20	Fri 30/6/23	\$1.440.000,00							
4006	4.4.3	GRP - Act. # 2.7	Realizar negociaciones con el Ministerio de Hacienda para que el presupuesto del OE a partir del tercer año de ejecución cuente con partidas presupuestarias suficientes para financiar parte del personal ya contratado con recursos del Programa.	1235 days	Fri 3/7/20	Thu 27/3/25	\$0,00	Director del Programa						
4007	4.4.4		3CV_99. Contratación de profesionales varios - Grupo 3	849 days	Tue 30/3/21	Fri 28/6/24	\$1.440.000,00							
4008	4.4.4.1		Etapas previas	18 days	Tue 30/3/21	Thu 22/4/21	\$0,00							
4014	4.4.4.2		Etapas de Contratación	51 days	Fri 23/4/21	Fri 2/7/21	\$0,00							
4030	4.4.4.3		Etapas de ejecución del contrato	780 days	Fri 2/7/21	Fri 28/6/24	\$1.440.000,00							
4034	4.4.5		3CV_100. Contratación de profesionales varios - Grupo 4	785 days	Tue 29/3/22	Mon 31/3/25	\$1.320.000,00							
4035	4.4.5.1		Etapas previas	18 days	Tue 29/3/22	Thu 21/4/22	\$0,00							
4041	4.4.5.2		Etapas de Contratación	51 days	Fri 22/4/22	Fri 1/7/22	\$0,00							
4057	4.4.5.3		Etapas de ejecución del contrato	716 days	Fri 1/7/22	Mon 31/3/25	\$1.320.000,00							
4062	4.5	P25	Producto 25: Personal de las instituciones claves del ecosistema público en TIC, capacitado	1090 days	Tue 19/1/21	Mon 24/3/25	\$1.000.000,00							
4063	4.5.1		SBC_133. Contratación de servicios de capacitación para el desarrollo de Diplomados para el personal de las instituciones claves del ecosistema público en TIC	1090 days	Tue 19/1/21	Mon 24/3/25	\$1.000.000,00							
4064	4.5.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 19/1/21	Thu 25/2/21	\$0,00							
4075	4.5.1.2		Proceso de Contratación	132 days	Fri 26/2/21	Mon 30/8/21	\$0,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B E	July M	May B E	March M B
4105	4.5.1.3		Ejecución del contrato	975 days	Mon 28/6/21	Mon 24/3/25	\$1.000.000,00							
4113	4.6	P26	Producto 26: Actividades de sensibilización dirigidas a los ciudadanos para el uso de los trámites digitalizados, realizadas	1365 days	Tue 7/1/20	Mon 31/3/25	\$5.000.000,00							
4114	4.6.1	GRP - Act. # 2.2	Elaboración del diseño de una estrategia de difusión	125 days	Tue 7/1/20	Mon 29/6/20	\$50.000,00							
4115	4.6.1.1		Actividades de gestión	125 days	Tue 7/1/20	Mon 29/6/20	\$50.000,00							
4116	4.6.2		SBCC_59. Contratación de Firma para la elaboración del diseño e implementación de un Plan de Medios de sensibilización a los ciudadanos en el uso de trámites digitalizados	1310 days	Tue 24/3/20	Mon 31/3/25	\$3.100.000,00							
4117	4.6.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 24/3/20	Thu 30/4/20	\$0,00							
4128	4.6.2.2		Etapas de Contratación	132 days	Fri 1/5/20	Mon 2/11/20	\$0,00							
4158	4.6.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1150 days	Mon 2/11/20	Mon 31/3/25	\$3.100.000,00							
4167	4.6.7		Servicios para organización de eventos	1114 days	Tue 24/3/20	Fri 28/6/24	\$350.000,00							
4169	4.6.4		Definición de preguntas relacionadas con comunicación específicas para la Encuesta de Satisfacción de Usuarios	22 days	Fri 5/3/21	Mon 5/4/21	\$0,00	Coord. Comp. IV						
4170	4.6.5		Capacitación a ciudadanos para acceso a trámites	800 days	Fri 5/3/21	Thu 28/3/24	\$0,00	Coord. Comp. IV						
4171	4.6.6		Plataforma digital del Estado	22 days	Wed 28/2/24	Thu 28/3/24	\$1.500.000,00							
4173	5		Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación	1708 days	Tue 12/2/19	Thu 28/8/25	\$6.500.000,00							
4174	5.1	Adm	Administración del Programa	1649 days	Wed 6/3/19	Mon 30/6/25	\$5.384.000,00							
4175	5.1.1		Equipo de la UEP	1649 days	Wed 6/3/19	Mon 30/6/25	\$4.219.200,00							
4176	5.1.1.1		3CV_101. Contratación del Director del Programa	1649 days	Wed 6/3/19	Mon 30/6/25	\$288.000,00							
4177	5.1.1.1.1		Etapas previas	18 days	Wed 6/3/19	Fri 29/3/19	\$0,00							
4184	5.1.1.1.2		Etapas de Contratación	107 days	Mon 1/4/19	Tue 27/8/19	\$0,00							
4197	5.1.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1587 days	Thu 30/5/19	Mon 30/6/25	\$288.000,00							
4200	5.1.1.2		Equipo Fiduciario	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$1.735.200,00							
4201	5.1.1.2.1		3CV_102. Contratación de Especialista Financiero	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4202	5.1.1.2.1.1		Etapas previas	18 days	Fri 31/5/19	Tue 25/6/19	\$0,00							
4208	5.1.1.2.1.2		Etapas de Contratación	45 days	Wed 26/6/19	Tue 27/8/19	\$0,00							
4221	5.1.1.2.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1525 days	Mon 26/8/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4224	5.1.1.2.2		3CV_103. Contratación de Administrador	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4225	5.1.1.2.2.1		Etapas previas	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4231	5.1.1.2.2.2		Etapas de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4247	5.1.1.2.2.3		Etapas de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4250	5.1.1.2.3		3CV_104. Contratación de Contador	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$180.000,00							
4251	5.1.1.2.3.1		Etapas previas	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4257	5.1.1.2.3.2		Etapas de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4273	5.1.1.2.3.3		Etapas de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$180.000,00							
4276	5.1.1.2.4		3CV_105. Contratación de Especialista en Adquisiciones	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4277	5.1.1.2.4.1		Etapas previas	18 days	Fri 31/5/19	Tue 25/6/19	\$0,00							
4283	5.1.1.2.4.2		Etapas de Contratación	45 days	Wed 26/6/19	Tue 27/8/19	\$0,00							
4296	5.1.1.2.4.3		Etapas de ejecución del contrato	1525 days	Mon 26/8/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4299	5.1.1.2.5		3CV_106. Contratación de Oficial de Adquisiciones	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$144.000,00							
4300	5.1.1.2.5.1		Etapas previas	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
4306	5.1.1.2.5.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4322	5.1.1.2.5.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$144.000,00							
4325	5.1.1.2.6		3CV_107. Contratación de personal de Apoyo Fiduciario	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$324.000,00							
4326	5.1.1.2.6.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4332	5.1.1.2.6.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4348	5.1.1.2.6.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$324.000,00							
4351	5.1.1.2.7		3CV_108. Contratación de Especialistas Jurídicos	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$108.000,00							
4352	5.1.1.2.7.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4358	5.1.1.2.7.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4374	5.1.1.2.7.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$108.000,00							
4377	5.1.1.2.8		3CV_109. Contratación de Especialista en Comunicaciones	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4378	5.1.1.2.8.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4384	5.1.1.2.8.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4400	5.1.1.2.8.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4403	5.1.1.2.9		3CV_110. Contratación de Personal de Apoyo para el Programa	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$115.200,00							
4404	5.1.1.2.9.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4410	5.1.1.2.9.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4426	5.1.1.2.9.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$115.200,00							
4429	5.1.1.3		Componente I	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$540.000,00							
4430	5.1.1.3.1		3CV_111. Contratación de Especialista Técnico 1	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4431	5.1.1.3.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4437	5.1.1.3.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4453	5.1.1.3.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4456	5.1.1.3.2		3CV_112. Contratación de Especialista Técnico 2	1239 days	Tue 1/10/19	Fri 28/6/24	\$180.000,00							
4457	5.1.1.3.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4463	5.1.1.3.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4479	5.1.1.3.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1170 days	Fri 3/1/20	Fri 28/6/24	\$180.000,00							
4482	5.1.1.3.3		3CV_113. Contratación de Técnico de Apoyo	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$144.000,00							
4483	5.1.1.3.3.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4489	5.1.1.3.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4505	5.1.1.3.3.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$144.000,00							
4508	5.1.1.4		Componente II	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$540.000,00							
4509	5.1.1.4.1		3CV_114. Contratación de Especialista Técnico 1	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4510	5.1.1.4.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4516	5.1.1.4.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4532	5.1.1.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4535	5.1.1.4.2		3CV_115. Contratación de Especialista Técnico 2	1239 days	Tue 1/10/19	Fri 28/6/24	\$180.000,00							
4536	5.1.1.4.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4542	5.1.1.4.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4558	5.1.1.4.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1170 days	Fri 3/1/20	Fri 28/6/24	\$180.000,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
4561	5.1.1.4.3		3CV_116. Contratación de Técnico de Apoyo	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$144.000,00							
4562	5.1.1.4.3.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4568	5.1.1.4.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4584	5.1.1.4.3.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$144.000,00							
4587	5.1.1.5		Componente III	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$432.000,00							
4588	5.1.1.5.1		3CV_117. Contratación de Especialista Técnico 1	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4589	5.1.1.5.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4595	5.1.1.5.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4611	5.1.1.5.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4614	5.1.1.5.2		3CV_118. Contratación de Especialista Técnico 2	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4615	5.1.1.5.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4621	5.1.1.5.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4637	5.1.1.5.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4640	5.1.1.6		Componente IV	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$684.000,00							
4641	5.1.1.6.1		3CV_119. Contratación de Coordinador para el Componente IV	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$252.000,00							
4642	5.1.1.6.1.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4648	5.1.1.6.1.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4664	5.1.1.6.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$252.000,00							
4667	5.1.1.6.2		3CV_120. Contratación de Especialista Técnico 1	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4668	5.1.1.6.2.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4674	5.1.1.6.2.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4690	5.1.1.6.2.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4693	5.1.1.6.3		3CV_121. Contratación de Especialista Técnico 2	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4694	5.1.1.6.3.1		Etapa previa	18 days	Tue 1/10/19	Thu 24/10/19	\$0,00							
4700	5.1.1.6.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 25/10/19	Fri 3/1/20	\$0,00							
4716	5.1.1.6.3.3		Etapa de ejecución del contrato	1431 days	Fri 3/1/20	Mon 30/6/25	\$216.000,00							
4719	5.1.2		Servicios Especializados de Apoyo a la UEP	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$120.000,00							
4720	5.1.2.1		SCC_81. Contratación de firma consultora para servicios de Asesoría en Estrategia Comunicacional del Programa	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$120.000,00							
4721	5.1.2.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 1/10/19	Thu 7/11/19	\$0,00							
4732	5.1.2.1.2		Etapa de Contratación	79 days	Fri 8/11/19	Wed 26/2/20	\$0,00							
4752	5.1.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	1393 days	Wed 26/2/20	Mon 30/6/25	\$120.000,00							
4755	5.1.3		Mobiliario y Equipos Informáticos	150 days	Tue 1/10/19	Mon 27/4/20	\$93.000,00							
4756	5.1.3.1		SBE_14. Adquisición de mobiliario para la UEP	150 days	Tue 1/10/19	Mon 27/4/20	\$39.000,00							
4757	5.1.3.1.1		Etapa previa	14 days	Tue 1/10/19	Fri 18/10/19	\$0,00							
4762	5.1.3.1.2		Etapa de contratación	48 days	Mon 21/10/19	Wed 25/12/19	\$0,00							
4779	5.1.3.1.3		Ejecución del contrato	88 days	Wed 25/12/19	Mon 27/4/20	\$39.000,00							
4782	5.1.3.2		SBE_15. Adquisición de equipamiento informático y electrónico para la UEP	150 days	Tue 1/10/19	Mon 27/4/20	\$54.000,00							
4783	5.1.3.2.1		Etapa previa	14 days	Tue 1/10/19	Fri 18/10/19	\$0,00							

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January	November	September	July	May	March			
									E	M	B	E	M	B	E	M	B
4788	5.1.3.2.2		Etapas de contratación	48 days	Mon 21/10/19	Wed 25/12/19	\$0,00										
4805	5.1.3.2.3		Ejecución del contrato	88 days	Wed 25/12/19	Mon 27/4/20	\$54.000,00										
4808	5.1.4		Oficinas de la UEP	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$276.480,00										
4809	5.1.4.1		Alquileres	1500 days	Tue 1/10/19	Mon 30/6/25	\$276.480,00										
4816	5.1.5		Otros Gastos	1499 days	Tue 1/10/19	Fri 27/6/25	\$675.320,00										
4817	5.1.5.1		SBE_16. Adquisición de un Sistema Informático de Gestión para el Programa	128 days	Tue 1/10/19	Thu 26/3/20	\$100.000,00										
4818	5.1.5.1.1		Etapas previas	14 days	Tue 1/10/19	Fri 18/10/19	\$0,00										
4823	5.1.5.1.2		Proceso de Contratación	48 days	Mon 21/10/19	Wed 25/12/19	\$0,00										
4840	5.1.5.1.3		Ejecución del contrato	66 days	Wed 25/12/19	Thu 26/3/20	\$100.000,00										
4843	5.1.5.2		Servicios básicos	1499 days	Tue 1/10/19	Fri 27/6/25	\$72.000,00										
4850	5.1.5.3		CD_32. Contratación de Servicios de conexión a internet para las oficinas de la UEP	1239 days	Tue 1/10/19	Fri 28/6/24	\$21.600,00										
4851	5.1.5.3.1		Etapas previas	20 days	Tue 1/10/19	Mon 28/10/19	\$0,00										
4858	5.1.5.3.2		Etapas de contratación	57 days	Tue 29/10/19	Wed 15/1/20	\$0,00										
4875	5.1.5.3.3		Ejecución del contrato	1162 days	Wed 15/1/20	Fri 28/6/24	\$21.600,00										
4878	5.1.5.4		SBE_17. Adquisición de útiles de oficina para la UEP	1435 days	Tue 1/10/19	Mon 31/3/25	\$57.600,00										
4879	5.1.5.4.1		Etapas previas	14 days	Tue 1/10/19	Fri 18/10/19	\$0,00										
4884	5.1.5.4.2		Etapas de contratación	48 days	Mon 21/10/19	Wed 25/12/19	\$0,00										
4901	5.1.5.4.3		Ejecución del contrato	1373 days	Wed 25/12/19	Mon 31/3/25	\$57.600,00										
4904	5.1.5.5		Gratificaciones por servicios especiales	1499 days	Tue 1/10/19	Fri 27/6/25	\$424.120,00										
4911	5.2	Adm	Monitoreo del Programa	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00										
4912	5.2.1		3CV_119. Contratación de Especialista en Planeación y Monitoreo	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00										
4913	5.2.1.1		Etapas previas	18 days	Fri 31/5/19	Tue 25/6/19	\$0,00										
4919	5.2.1.2		Etapas de Contratación	45 days	Wed 26/6/19	Tue 27/8/19	\$0,00										
4932	5.2.1.3		Etapas de ejecución del contrato	1525 days	Mon 26/8/19	Mon 30/6/25	\$216.000,00										
4935	5.3	Adm	Auditoría Externa del Programa	1338 days	Tue 14/7/20	Thu 28/8/25	\$320.000,00										
4936	5.3.1		SBCC_82. Contratación de servicios de auditoria externa para el programa.	1338 days	Tue 14/7/20	Thu 28/8/25	\$300.000,00										
4937	5.3.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 14/7/20	Thu 20/8/20	\$0,00										
4948	5.3.1.2		Etapas de Contratación	137 days	Fri 21/8/20	Mon 1/3/21	\$0,00										
4978	5.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	920 days	Thu 17/2/22	Thu 28/8/25	\$300.000,00										
4987	5.3.2		3CV_123. Contratación de consultor para realizar la Auditoría de Cumplimiento del Plan Nacional Estratégico de la SENATICS	135 days	Tue 24/9/24	Mon 31/3/25	\$20.000,00										
4988	5.3.2.1		Etapas previas	18 days	Tue 24/9/24	Thu 17/10/24	\$0,00										
4994	5.3.2.2		Etapas de Contratación	51 days	Fri 18/10/24	Fri 27/12/24	\$0,00										
5010	5.3.2.3		Etapas de ejecución del contrato	66 days	Fri 27/12/24	Mon 31/3/25	\$20.000,00										
5013	5.4	Adm	Evaluaciones del Programa	1230 days	Tue 14/7/20	Mon 31/3/25	\$580.000,00										
5014	5.4.1		SBCC_83. Contratación de Consultoría para el Levantamiento línea de base de Evaluación de Impacto y asignación aleatoria de hospitales de tratamiento	253 days	Tue 14/7/20	Thu 1/7/21	\$230.000,00										




Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153







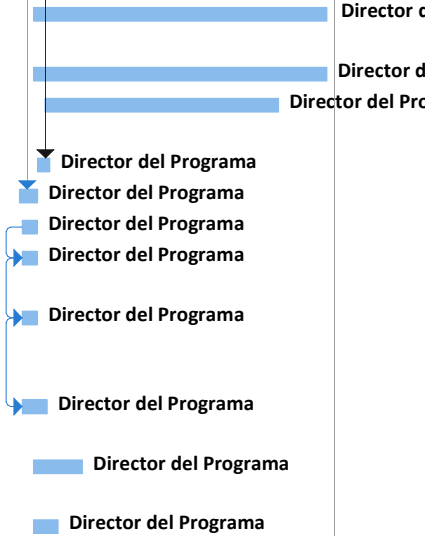











ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
5015	5.4.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Tue 14/7/20	Thu 20/8/20	\$0,00							
5026	5.4.1.2		Etapa de Contratación	137 days	Fri 21/8/20	Mon 1/3/21	\$0,00							
5056	5.4.1.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Mon 1/3/21	Thu 1/7/21	\$230.000,00							
5060	5.4.2		SBCC_84. Contratación de consultoría para el Levantamiento encuesta final de seguimiento de Evaluación de Impacto	253 days	Fri 2/7/21	Tue 21/6/22	\$230.000,00							
5061	5.4.2.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Fri 2/7/21	Tue 10/8/21	\$0,00							
5072	5.4.2.2		Etapa de Contratación	137 days	Wed 11/8/21	Thu 17/2/22	\$0,00							
5102	5.4.2.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Thu 17/2/22	Tue 21/6/22	\$230.000,00							
5106	5.4.3		3CV_124. Contratación de consultor para la Evaluación Intermedia del Programa	135 days	Mon 20/12/21	Fri 24/6/22	\$30.000,00							
5107	5.4.3.1		Etapa previa	18 days	Mon 20/12/21	Wed 12/1/22	\$0,00							
5113	5.4.3.2		Etapa de Contratación	51 days	Thu 13/1/22	Thu 24/3/22	\$0,00							
5129	5.4.3.3		Etapa de ejecución del contrato	66 days	Thu 24/3/22	Fri 24/6/22	\$30.000,00							
5133	5.4.4		SCC_85. Contratación de consultor para la elaboración del Informe Final de Evaluación de Impacto	195 days	Mon 4/7/22	Fri 31/3/23	\$40.000,00							
5134	5.4.4.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	28 days	Mon 4/7/22	Wed 10/8/22	\$0,00							
5145	5.4.4.2		Etapa de Contratación	79 days	Thu 11/8/22	Tue 29/11/22	\$0,00							
5165	5.4.4.3		Etapa de ejecución del contrato	88 days	Tue 29/11/22	Fri 31/3/23	\$40.000,00							
5169	5.4.5		3CV_125. Contratación de consultor para la Evaluación Final del Programa	135 days	Tue 24/9/24	Mon 31/3/25	\$50.000,00							
5170	5.4.5.1		Etapa previa	18 days	Tue 24/9/24	Thu 17/10/24	\$0,00							
5176	5.4.5.2		Etapa de Contratación	51 days	Fri 18/10/24	Fri 27/12/24	\$0,00							
5192	5.4.5.3		Etapa de ejecución del contrato	66 days	Fri 27/12/24	Mon 31/3/25	\$50.000,00							
5196	5.5		Gestión de Riesgos del Programa	1665 days	Tue 12/2/19	Mon 30/6/25	\$0,00							
5197	5.5.1	GRP - Act. # 1.1	Implementar un sistema de información financiera y contable que permita el registro de las transacciones y la emisión de información requeridos por el BID	91 days	Tue 27/8/19	Tue 31/12/19	\$0,00	Director del Programa						
5198	5.5.2	GRP - Act. # 1.2	Se requiere fortalecer el área a cargo de las adquisiciones con la incorporación de personal con experiencia y conocimiento en políticas de organismos multilaterales y a través de cursos y talleres específicos sobre las Políticas de adquisiciones del BID.	221 days	Tue 27/8/19	Tue 30/6/20	\$0,00	Director del Programa						
5199	5.5.3	GRP - Act. # 1.3	Elaboración y difusión de manuales de funciones y procedimientos, socialización del alcance del proyecto con las unidades SENATICs y los beneficiarios, así como el monitoreo de cumplimiento de las funciones y procedimientos	221 days	Tue 27/8/19	Tue 30/6/20	\$0,00	Director del Programa						
5200	5.5.4	GRP - Act. # 1.4	La UEP deberá ser fortalecida con los personales idóneos y por medio de capacitaciones en materia de gestión financiera, así como auditoría.	215 days	Wed 6/3/19	Tue 31/12/19	\$0,00	Director del Programa						
5201	5.5.5	GRP - Act. # 1.5	Realizar actividades de difusión pública abierta e invitaciones a empresas del área para conocer mejor las necesidades del proyecto. Consultas previas a las especificaciones técnicas de manera virtual	1396 days	Tue 27/8/19	Tue 31/12/24	\$0,00	Director del Programa						

Plan de Ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153

ID	EDT	Producto / Req.	Componentes / Productos / Actividades	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL USD	Responsable	January E M	November B E	September M B	July E M	May B E	March M B
5202	5.5.6	GRP - Act. # 1.6	Elaboración, difusión y cumplimiento de manuales de funciones y procedimientos	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$0,00	Director del Programa						Director d
5203	5.5.7	GRP - Act. # 1.7	Socialización del proyecto con los beneficiarios	1587 days	Fri 31/5/19	Mon 30/6/25	\$0,00	Director del Programa						Director d
5204	5.5.8	GRP - Act. # 1.8	Contratación y designación de personal que cumpla con los perfiles profesionales requeridos	1264 days	Tue 27/8/19	Fri 28/6/24	\$0,00	Director del Programa						Director del Pro
5205	5.5.9	GRP - Act. # 1.9	Designación oportuna del personal de la UEP	65 days	Tue 2/7/19	Mon 30/9/19	\$0,00	Director del Programa						
5206	5.5.10	GRP - Act. # 1.10	Involucrar a las áreas administrativas y técnicas	100 days	Tue 12/2/19	Mon 1/7/19	\$0,00	Director del Programa						
5207	5.5.11	GRP - Act. # 1.11	Contratar al personal fiscalizador necesario	83 days	Wed 6/3/19	Fri 28/6/19	\$0,00	Director del Programa						
5208	5.5.14	GRP - Act. # 1.12	Asegurarse de que en el ROP se incluyan las funciones y procedimientos internos en forma clara	83 days	Wed 6/3/19	Fri 28/6/19	\$0,00	Director del Programa						
5209	5.5.15	GRP - Act. # 1.13	Hacer un seguimiento coordinado con el gobierno para promover el Programa y lograr su aprobación en la Asamblea Legislativa	83 days	Wed 6/3/19	Fri 28/6/19	\$0,00	Director del Programa						
5210	5.5.16	GRP - Act. # 1.14	Designación oportuna del personal necesario para conformar la UEP	135 days	Wed 6/3/19	Tue 10/9/19	\$0,00	Director del Programa						
5211	5.5.12	GRP - Act. # 3.1	Creación de una SUAF en el marco de la dirección de la UEP y mejorar la gestión financiera	264 days	Fri 31/5/19	Wed 3/6/20	\$0,00	Director del Programa						
5212	5.5.13	GRP - Act. # 3.4	Acto administrativo o reglamento de la función y personal asignado a esas funciones	132 days	Fri 31/5/19	Mon 2/12/19	\$0,00	Director del Programa						
5213	6		Fin	0 days	Thu 28/8/25	Thu 28/8/25	\$0,00							28/8



Proyecto: Plan de Ejecución del Pr  
Fecha: Mon 10/9/18

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
