



Operation Number: **AR-L1068**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**  
Last Update: **6/19/2014**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/04/2014**  
Division Chief validation date: **07/07/2014**  
Country Representative validation date: **07/08/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Program for Rural Development and Family Agriculture, PRODAF	Loan Number:	2740/OC-AR
Executing Agency (EA):	Ministerio de Agricultura, Ganadería y P esca		
Team Leader:	Alva Hart,Viviana del Carmen	Sector/Subsector:	SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1068	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$41,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1068	\$30,000,000.00	\$3,300,000.00	11.00%	\$26,700,000.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

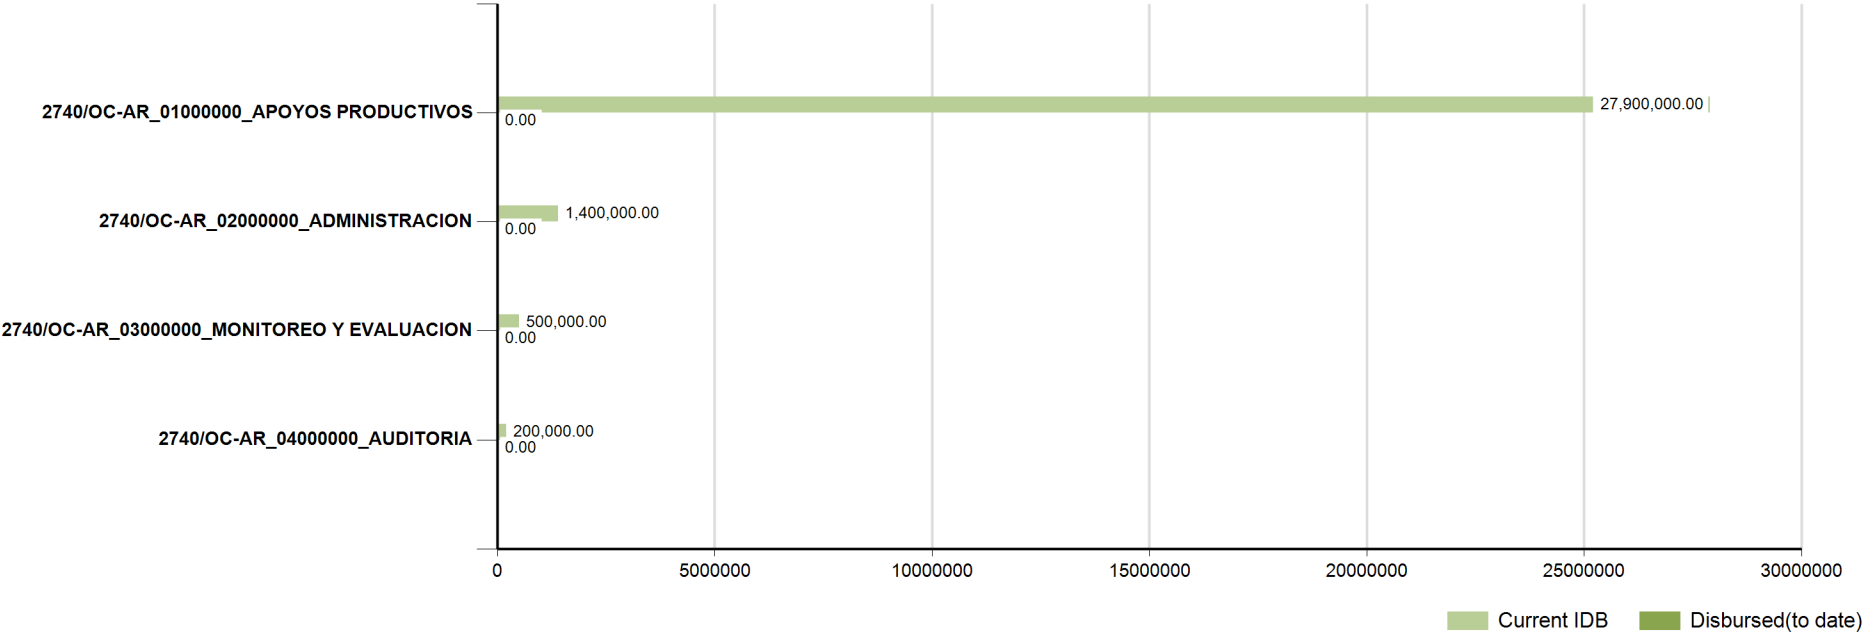

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Incremento de los ingresos netos agropecuarios promedio de los productores beneficiarios con respecto a los no beneficiarios en el Chaco y Entre Ríos.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.		Porcentaje (%)	0.00	2013	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.	El indicador es 0 en la LB por construcción. El grupo de control será construido de manera que tenga características observables claves iguales al grupo de beneficiarios en la LB (ver plan monitoreo y evaluación). Supuestos:a)Situación económica nacional	P	15.00
							P(a)	15.00
							A	

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Incremento de la productividad (rendimientos) de rubros representativos en planes de negocios
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.			Porcentaje (%)	0.00	2013	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017	Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza a una diferencia inicial de 0.	P	15.00
								P(a)	15.00
								A	
Outcome:	2 Incremento en la adopción de tecnologías promovidas por el Programa								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Diferencia entre las tasas de adopción de tecnologías entre beneficiarios y no beneficiarios			Porcentaje (%)	0.00	2013	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.	Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza a una diferencia inicial de 0.	P	50.00
								P(a)	50.00
								A	
Outcome:	3 Incremento al acceso de crédito de los beneficiarios del Programa								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Diferencia entre las tasas de acceso al crédito entre beneficiarios y no beneficiarios.		Porcentaje (%)	0.00	2013	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.	Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.	P	20.00
							P(a)	20.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Apoyo a las Capacidades de Preparación de Planes de Negocios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Planes de Trabajo a nivel de cada provincia ejecutados	Planes	P		2.00	P		792,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		605,000.00
		A			A		
Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Personas	P		71.00	P		126,000.00
		P(a)		71.00	P(a)		96,000.00
		A			A		
Planes de difusión ejecutados	Planes	P		4.00	P		282,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		216,000.00
		A			A		
Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema financiero	Grupos	P		100.00	P		190,000.00
		P(a)		100.00	P(a)		144,000.00
		A			A		
Planes de Negocios formulados	Planes	P		360.00	P		282,000.00
		P(a)		360.00	P(a)		216,000.00
		A			A		
Estudios para la selección futura de provincias y tecnologías adicionales realizados	Estudios	P		8.00	P		528,000.00
		P(a)		8.00	P(a)		400,000.00
		A			A		
Apoyo a la Implantación de Planes de Negocios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Fondo de garantía constituido y transferido	Fondo	P		1.00	P		9,950,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		9,950,000.00
		A			A		
Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Planes	P		300.00	P		23,000,000.00
		P(a)		300.00	P(a)		23,000,000.00
		A			A		
Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Agricultores	P		2,060.00	P		3,350,000.00
		P(a)		2,060.00	P(a)		3,393,000.00
		A			A		
Coordinación y administración del proyecto							

Other Cost		2013	Cost
Coordinación y administración del proyecto	P	\$497,000.00	\$1,800,000.00
	P(a)	\$497,000.00	\$2,305,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	P	\$175,000.00	\$500,000.00
	P(a)	\$175,000.00	\$475,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Gastos financieros	P		\$200,000.00
	P(a)		\$200,000.00
	A		

Total Cost		2013	Total Cost
	P	\$672,000.00	\$41,000,000.00
	P(a)	\$672,000.00	\$14,818,000.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
