



Operation Number: **AR-L1068**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**  
Last Update: **4/2/2015**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **05/04/2015**  
Division Chief validation date: **05/05/2015**  
Country Representative validation date: **05/07/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Program for Rural Development and Family Agriculture, PRODAF	Loan Number:	2740/OC-AR
Executing Agency (EA):	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca		
Team Leader:	Alva Hart,Viviana del Carmen	Sector/Subsector:	SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1068	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$41,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1068	\$30,000,000.00	\$7,900,000.00	26.33%	\$22,100,000.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

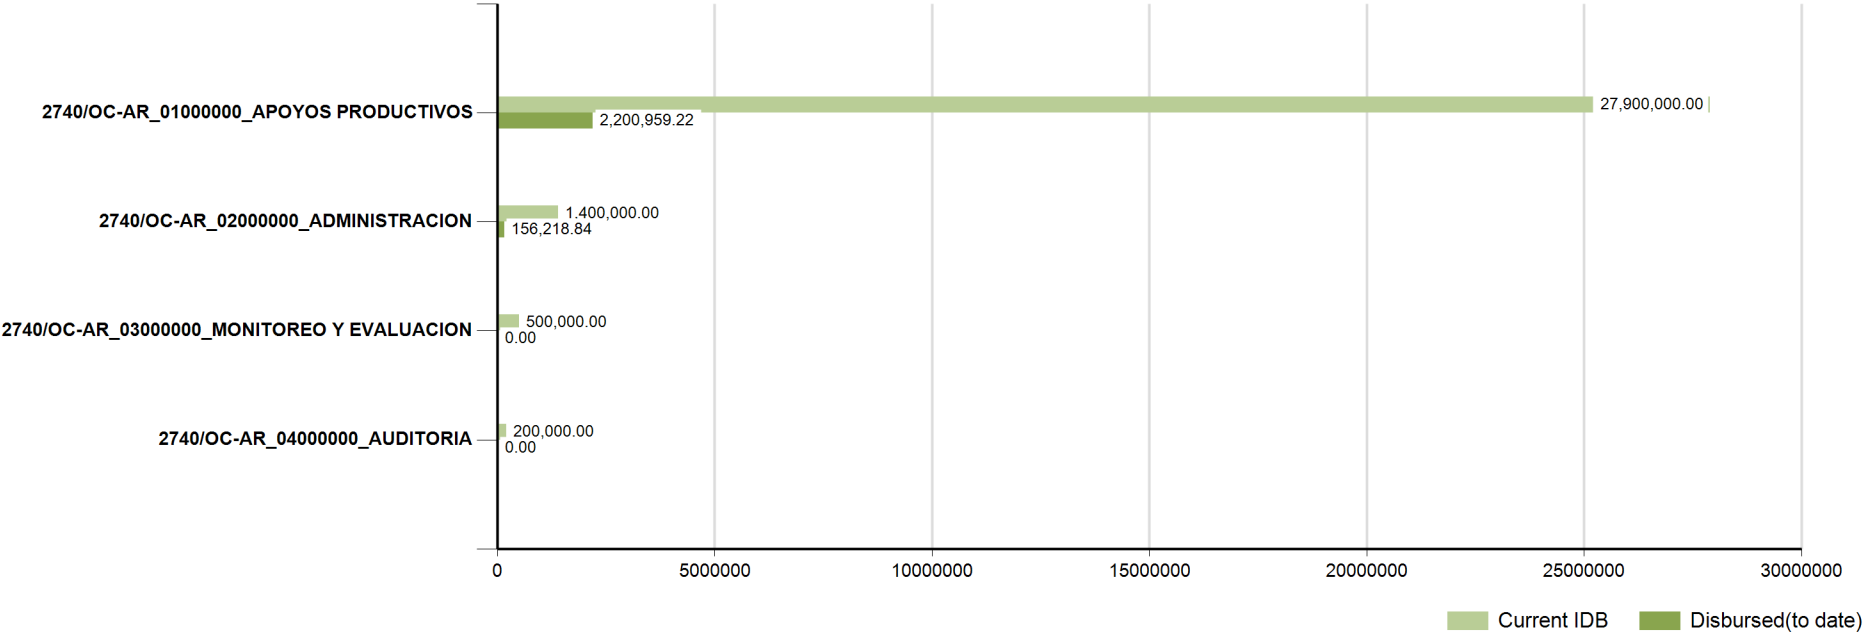

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Incremento de los ingresos netos agropecuarios promedio de los productores beneficiarios con respecto a los no beneficiarios en el Chaco y Entre Ríos.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.		Porcentaje (%)	0.00	2013	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.	El indicador es 0 en la LB por construcción. El grupo de control será construido de manera que tenga características observables claves iguales al grupo de beneficiarios en la LB (ver plan monitoreo y evaluación). Supuestos:a)Situación económica nacional	P	15.00
							P(a)	15.00
							A	0.00

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Incremento de la productividad (rendimientos) de rubros representativos en planes de negocios
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia entre el cambio porcentual del ingreso neto agropecuario promedio por productor de los beneficiarios y el ingreso promedio agropecuario por productor de no beneficiarios.		Porcentaje (%)	0.00	2013	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017	Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.	P	15.00
							P(a)	15.00
							A	0.00
Outcome:	2 Incremento en la adopción de tecnologías promovidas por el Programa							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Diferencia entre las tasas de adopción de tecnologías entre beneficiarios y no beneficiarios		Porcentaje (%)	0.00	2013	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.	Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.	P	50.00
							P(a)	50.00
							A	0.00
Outcome:	3 Incremento al acceso de crédito de los beneficiarios del Programa							
Observation:								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Diferencia entre las tasas de acceso al crédito entre beneficiarios y no beneficiarios.		Porcentaje (%)	0.00	2013	Encuestas realizadas a hogares agropecuarios beneficiarios y no beneficiarios al inicio y en 2017.	Los grupos de beneficiarios y control se han construido de manera que tienen características observables semejantes a nivel de LB, lo cual garantiza una diferencia inicial de 0.	P	20.00
							P(a)	20.00
							A	0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Apoyo a las Capacidades de Preparación de Planes de Negocios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Planes de Trabajo a nivel de cada provincia ejecutados	Planes	P	2.00	2.00	P	792,000.00	792,000.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	240,000.00	605,000.00
		A	2.00	2.00	A	208,262.00	208,262.00
Asesores técnicos y extensionistas capacitados y habilitados	Personas	P	71.00	71.00	P	126,000.00	126,000.00
		P(a)	71.00	71.00	P(a)	66,000.00	96,000.00
		A	26.00	26.00	A	3,000.00	3,000.00
Planes de difusión ejecutados	Planes	P	4.00	4.00	P	282,000.00	282,000.00
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	216,000.00	216,000.00
		A	2.00	2.00	A	14,000.00	14,000.00
Grupos asociativos fortalecidos en materia técnica y legal, para el acceso a los recursos del programa, la participación en instancias de negociación, y el acceso a recursos del sistema financiero	Grupos	P	35.00	100.00	P	67,000.00	190,000.00
		P(a)	25.00	100.00	P(a)	36,000.00	144,000.00
		A	3.00	3.00	A	0.00	0.00
Planes de Negocios formulados	Planes	P	150.00	360.00	P	118,000.00	282,000.00
		P(a)	360.00	778.00	P(a)	216,000.00	216,000.00
		A	478.00	478.00	A	17,000.00	17,000.00
Estudios para la selección futura de provincias y tecnologías adicionales realizados	Estudios	P		8.00	P		528,000.00
		P(a)		8.00	P(a)		400,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Apoyo a la Implantación de Planes de Negocios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Fondo de garantía constituido y transferido	Fondo	P	1.00	1.00	P	2,000,000.00	9,950,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	857,000.00	9,950,000.00
		A	1.00	1.00	A	750,000.00	750,000.00
Planes de negocio para la adopción de tecnologías con apoyos (ANRs) entregados	Planes	P	130.00	300.00	P	9,967,000.00	23,000,000.00
		P(a)	300.00	555.00	P(a)	4,066,000.00	23,000,000.00
		A	295.00	295.00	A	2,285,000.00	2,285,000.00
Productores/as atendidos con asistencia técnica para la adopción de las tecnologías promovidas por el Programa	Agricultores	P	893.00	2,060.00	P	1,420,000.00	3,350,000.00
		P(a)	460.00	2,060.00	P(a)	778,000.00	3,350,000.00
		A	578.00	578.00	A	58,000.00	58,000.00
Coordinación y administración del proyecto							

Other Cost		2014	Cost
Coordinación y administración del proyecto	P	\$360,000.00	\$1,800,000.00
	P(a)	\$948,000.00	\$2,323,000.00
	A	\$292,000.00	\$292,000.00
Seguimiento, evaluación de impacto y evaluación intermedia y final del programa	P	\$30,000.00	\$500,000.00
	P(a)	\$227,000.00	\$500,000.00
	A	\$67,000.00	\$67,000.00
Gastos financieros	P		\$200,000.00
	P(a)		\$200,000.00
	A	\$0.00	\$0.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$15,162,000.00	\$41,000,000.00
	P(a)	\$7,650,000.00	\$34,607,000.00
	A	\$3,694,262.00	\$3,694,262.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
