



Operation Number: **BR-L1343**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **2/1/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/13/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **11/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programs of Opportunities and Rights in the state of Rio Grande do Sul	Loan Number:	3241/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS		
Team Leader:	Capriolo,Dino	Sector/Subsector:	CITIZEN SAFETY
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1343	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$56,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1343	\$50,000,000.00	\$9,430,000.00	18.86%	\$40,570,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information


Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

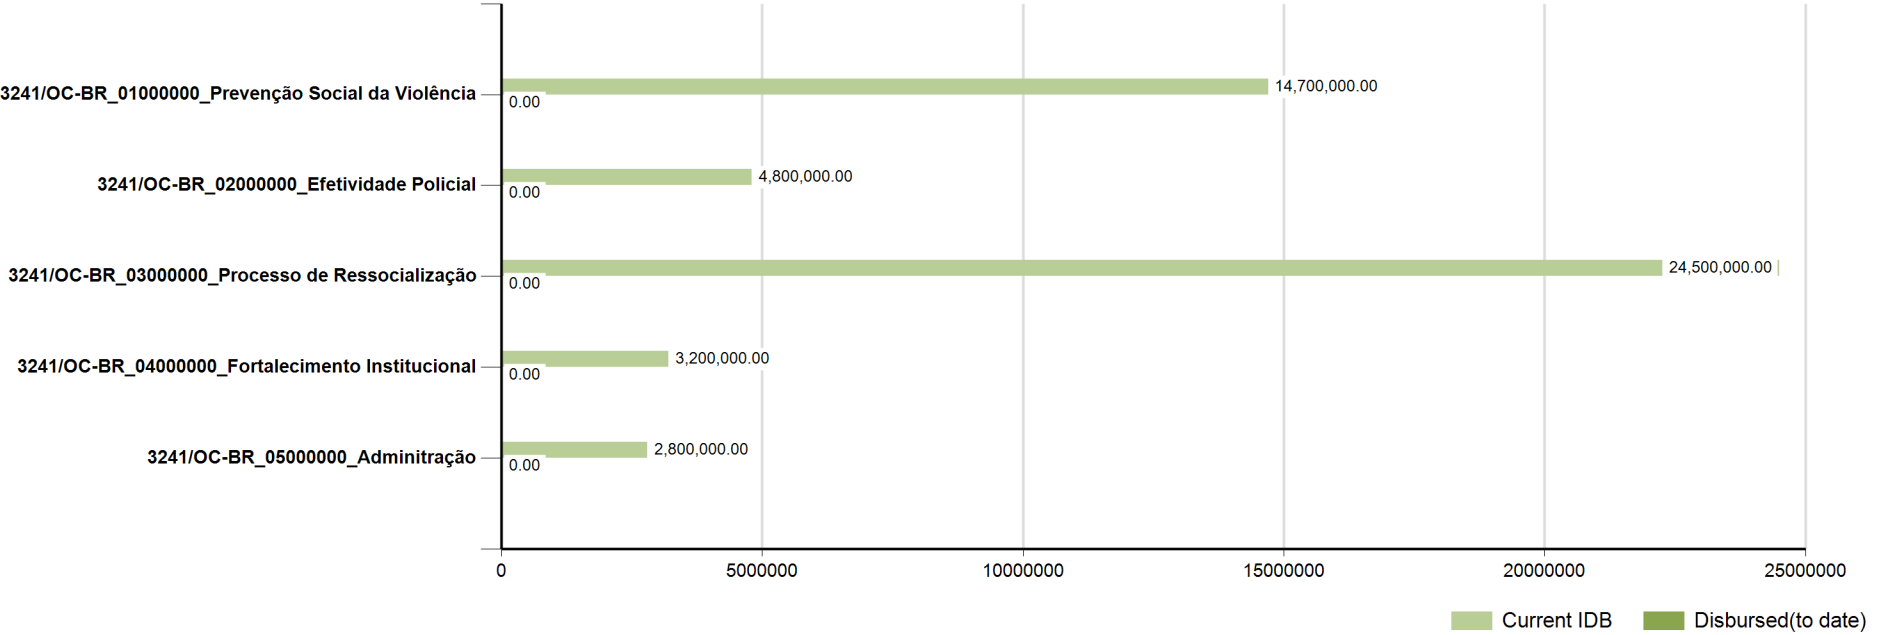

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
1.0 Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã		 RF	Cities	0.00	2010			P		
								P(a)		3.00
								A		
Impact:	1 Contribuir para a redução dos índices de criminalidade violenta entre jovens de 15 a 24 anos nos municípios de Alvorada, Porto Alegre e Viamão									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
1.1 Homicídios de jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA			taxa anual pcmh	88.80	2010	Ministério da Saúde: Datasus; Ministério da Justiça: Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública (SINESP)	O monitorament o deste e outros indicadores será realizado como parte da execução do Programa	P	84.00	75.50
								P(a)	84.00	75.50
								A		
1.3 Roubos cometidos por jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA			percentage m	62.00	2010	SSP-RS, por meio de relatórios da DEC/DGEO	A proporção se refere aos roubos cometido spor jovens de 15 a 24 anos e que tiveram sua autoria esclarecida. Em 2010, houve um total de 1602 roubos.	P	56.00	50.00
								P(a)	56.00	50.00
								A		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Melhorar a inserção de jovens em situação de risco ao sistema educacional e ao mercado de trabalho
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
							P	8,900.00	13,500.00
0.1 Jovens cursando o Ensino Médio que não abandonam a escola, nos territórios onde os professores são capacitados		Número	0.00	2010	SJDH-RS	Este indicado r refere-se aos jovens que ainda não abandonaram a escola. A meta será alcançada por meio da capacitação de 216 professores por ano. Cada professor trabalhará com a média de 30 alunos por ano, com a meta de que nenhum deles abandone a escola.	P(a)		
	A								
0.2 Jovens que completam o Ensino Fundamental por meio do programa de aceleração		Número	0.00	2010	SJDH-RS	Este indicado r se refere aos jovens que já abandonaram a escola. Participação 1.000 jovens por centro a partir do segundo ano.	P	1,200.00	4,800.00
	P(a)								
	A								

0.3 Jovens participantes do Programa em sua primeira experiência de trabalho formal			Número	0.00	2010	SJDH-RS	Os beneficiários são jovens em situação de risco para os quais a experiência de trabalho reduzirá a possibilidade de se vincular em atividades criminosas. Para facilitar a inserção ao mercado de trabalho, 2.000 jovens dos Centros POD Juventude por ano r	P	800.00	3,200.00
								P(a)		
								A		
Outcome:	1 Incrementar a efetividade da polícia no âmbito local									
Observation:										

2.1 Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE durante pelo menos um ano e meio e que completaram o Ensino Fundamental						Em 2010 existiam 880 adolescentes na FASE, dos quais 15% tinham o Ensino Fundamental concluído. Jovens só podem entrar na FASE até os 18 anos, mas podem cumprir medidas até os 21 anos.	P	70.00	100.00
							P(a)		
							A		
		%	15.00	2010	FASE				
2.2 Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE e completaram o curso de capacitação de jovem aprendiz						Ainda não existe o programa de jovem aprendiz na FASE.	P	60.00	80.00
							P(a)		
							A		
		%	0.00	2010	FASE				
Outcome:	3 Melhorar a articulação dos serviços de prevenção e controle do crime destinados aos jovens em situação de alto risco								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
							P		
3.1 Formulação por parte da SJDH-RS de políticas públicas de prevenção da violência juvenil usando dados do sistema integrado de distintos serviços de prevenção e controle do crime		número	0.00	2012	SJDH-RS	As novas políticas serão formuladas tendo em conta os resultados do trabalho multidisciplinário, coordenado e articulado pelas distintas entidades que desenvolvem atividades nos territórios do Programa e que compartilham informação num sistema integrado. O P	P(a)		2.00
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Prevenção social e situacional da violência		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Centros POD Juventude construídos, equipados e funcionando com uma oferta de serviços socioeducativos, de formação para o trabalho e de cultura, esportes e recreação para jovens de 15 a 24 anos	centros	P	0.00	6.00	P	520,000.00	9,000,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	520,000.00	9,000,000.00
		A	1.00	1.00	A	357,100.64	357,100.64
Professores das escolas nos territórios capacitados em ações destinadas à conclusão escolar do Ensino Médio	professores	P	356.00	1,780.00	P	300,000.00	1,000,000.00
		P(a)	356.00	1,780.00	P(a)	300,000.00	1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa de capacitação de jovens aprendizes e primeira experiência de trabalho formal	programas	P		21.00	P		1,600,000.00
		P(a)	0.00	21.00	P(a)	0.00	1,600,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa de aceleração para completar o Ensino Fundamental	programas	P		21.00	P		3,300,000.00
		P(a)	0.00	21.00	P(a)	0.00	3,300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	bolsas	P	100.00	1,700.00	P	200,000.00	1,800,000.00
		P(a)	100.00	1,700.00	P(a)	200,000.00	1,800,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Foros estabelecidos para coordenar e gestionar as redes sociais de atenção aos jovens de 15 a 24 anos no território	foros	P	1.00	6.00	P	40,000.00	900,000.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	40,000.00	900,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Espaços públicos reformados para permitir a acessibilidade a jovens com deficiências físicas nas comunidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão	espaços	P	1.00	6.00	P	200,000.00	1,000,000.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	200,000.00	1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Eficácia policial		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Formação de efetivos policiais que atuarão em serviços de polícia comunitária em Alvorada, Porto Aelgre e Viamão	efetivos	P		1,200.00	P	130,000.00	850,000.00
		P(a)	0.00	1,200.00	P(a)	130,000.00	850,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema modernizado e integrado de gestão para a polícia, incluindo capacitação e formação para seu uso e em análise criminológica	sistema	P		1.00	P	300,000.00	1,400,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	300,000.00	1,400,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Bases comunitárias integradas com Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Conselhos Comunitários	bases	P		6.00	P	1,100,000.00	3,500,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	500,000.00	3,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Certificação do adequado funcionamento do controle interno da polícia nos territórios do Programa	certificação	P	1.00	9.00	P	50,000.00	250,000.00
		P(a)	1.00	9.00	P(a)	50,000.00	250,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Modernização do processo de ressocialização		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Construção e implementação de novos centros socioeducativos e reforma do centro de capacitação Padre Cacique em Porto Alegre	centros	P		4.00	P	1,000,000.00	21,700,000.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	1,000,000.00	21,700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de planejamento estratégico e de gestão administrativa, orçamentária e financeira integrada em função de resultados	sistema	P		1.00	P	250,000.00	500,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	250,000.00	500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Capacitação de servidores da FASE para preencher as lacunas de conhecimento e competências requeridas para o desenho e implementação dos Planos Individuais de Atenção	servidores	P		1,200.00	P	100,000.00	1,100,000.00
		P(a)	0.00	1,200.00	P(a)	100,000.00	1,100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	processo	P		1.00	P	100,000.00	700,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	100,000.00	700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistemas de vídeo-monitoramento em unidades da FASE	sistema	P	1.00	1.00	P	1,000,000.00	1,000,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	1,000,000.00	1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimento institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Elaboração de planos estratégicos e operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do Programa	planos	P		5.00	P	300,000.00	650,000.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	300,000.00	650,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Elaboração e implementação de um sistema de gestão de processos e monitoramento de atividades e produtos do Programa	sistema	P		1.00	P	700,000.00	1,400,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	700,000.00	1,400,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Elaboração e implementação de um sistema de monitoramento dos serviços de proteção aos direitos, por meio da implementação de uma central de denúncias (observatório)	sistema	P		1.00	P		650,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	650,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Seminários de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes do Programa	seminários	P	1.00	17.00	P	30,000.00	500,000.00
		P(a)	1.00	17.00	P(a)	30,000.00	500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestão do Programa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	Relatório	P	2.00	10.00	P	640,000.00	3,200,000.00
		P(a)	2.00	10.00	P(a)	640,000.00	3,200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Total Cost					2015	Total Cost	
				P	\$6,960,000.00	\$56,000,000.00	
				P(a)	\$6,360,000.00	\$49,997,100.64	
				A	\$357,100.64	\$357,100.64	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
