



Operation Number: **ME-L1091**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/10/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/29/2016**
Division Chief validation date: **04/01/2016**
Country Representative validation date: **04/01/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support to the "Oportunidades" Human Development Program	Loan Number:	2970/OC-ME
Executing Agency (EA):	Coordinación Nacional de PROSPERA		
Team Leader:	Araujo,Maria Caridad	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1091	\$600,000,000.00	\$600,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1091	\$600,000,000.00	\$572,696,593.94	95.45%	\$27,303,406.06


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information


Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

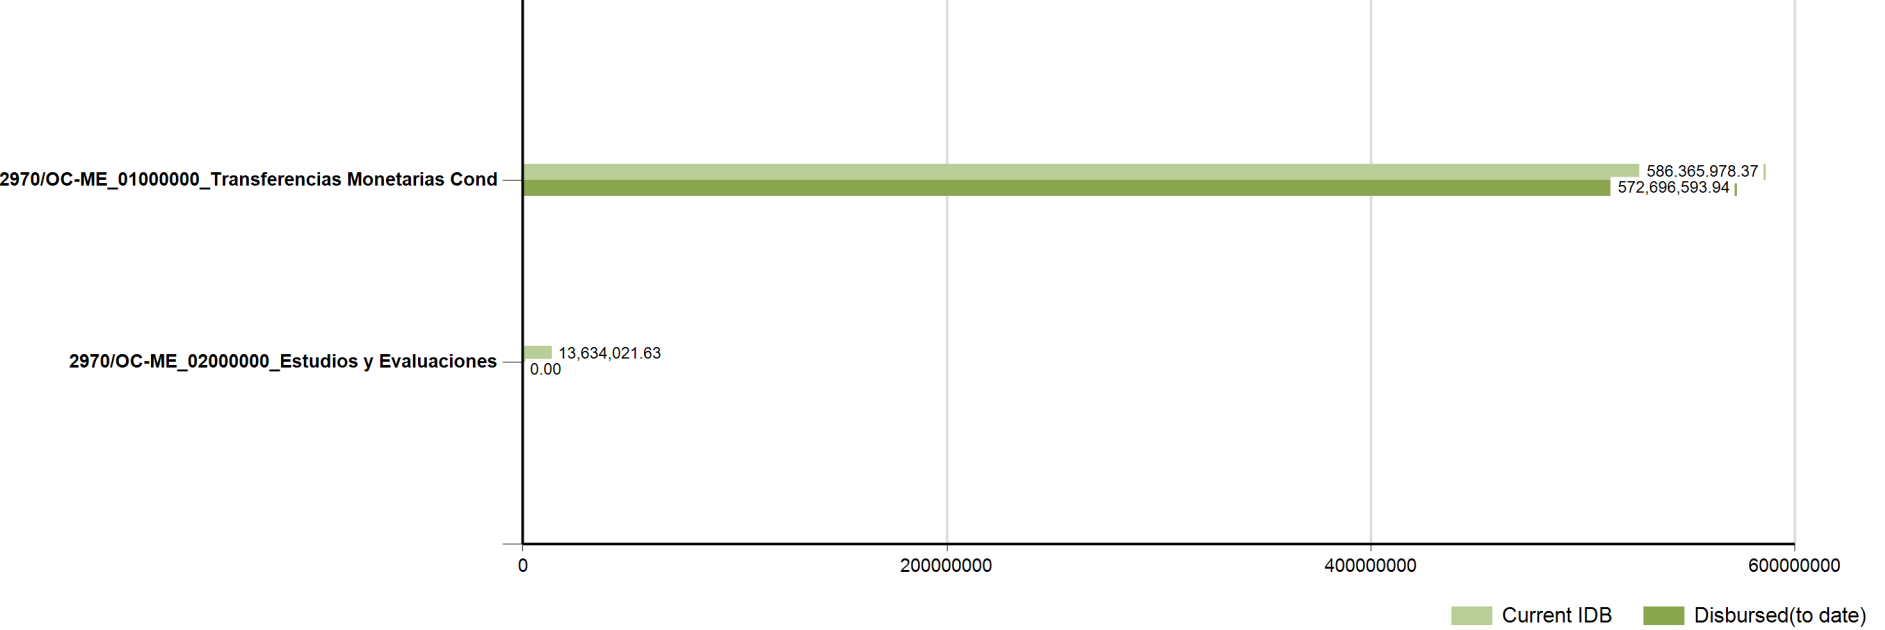


Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observations	2013		2014	2015	2016	EOP
0.0 Nueva estructura de apoyos escolares de Prospera sometida a la aprobación del Comité Técnico, a partir de los resultados de la evaluación del programa piloto de referencia.		Propuesta	0.00	2012	Acuerdo certificado del Comité Técnico		P	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
							P(a)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
							A	0.00	0.00	0.00		
0.1 Mejoras al esquema de capacitación y comunicación de la EslAN sometidas a aprobación del Comité Técnico para su expansión a toda la población beneficiaria de Prospera, con base en la evaluación de esquemas alternativos.		Propuesta	0.00	2012	Acuerdo certificado del Comité Técnico		P	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
							A	0.00	0.00	0.00		
0.3 Porcentaje de becarios activos de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después		Porcentaje	76.76	2012	Padrón de beneficiarios de Oportunidades		P	75.52			80.60	80.60
							P(a)	75.52			80.60	80.60
							A	75.52	72.25	79.40		


Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarios activos de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después - LOCALIDADES URBANAS	P						69.13				74.80
	P(a)						69.13				74.80
	A						69.13	66.56	75.52		
Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarios activos de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después - LOCALIDADES SEMI URBANAS	P						77.58				82.15
	P(a)						77.58				82.15
	A						77.58	68.00	77.23		
Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarios activos de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después - LOCALIDADES RURALES	P						76.91				81.70
	P(a)						76.91				81.70
	A						76.91	75.78	81.51		
Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP

Porcentaje de becarios activos de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después - MODALIDAD URBANA						P	59.01				65.40
<div>0.4 Porcentaje de becarias activas de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después</div> <div><div><div></div><div>P-G</div></div><div>Porcentaje</div><div>82.12</div><div>2012</div><div>Padrón de beneficiarios de Oportunidades</div></div>						P(a)	59.01				65.40
						A	59.01	62.40	72.78		
						P	80.86				86.20
						P(a)	80.86				86.20
						A	80.86	80.84	82.68		

Disaggregation Categories		2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarias activas de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después - LOCALIDADES URBANAS	P	78.90				85.90
	P(a)	78.90				85.90
	A	78.90	75.98	81.64		
Disaggregation Categories		2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarias activas de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después - LOCALIDADES SEMI URBANAS	P	84.49				89.60
	P(a)	84.49				89.60
	A	84.49	74.80	81.40		
Disaggregation Categories		2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarias activas de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después - LOCALIDADES RURALES	P	80.46				85.40
	P(a)	80.46				85.40
	A	80.46	79.33	83.56		
Disaggregation Categories		2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarias activas de Prospera con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación básica tres años después - MODALIDAD URBANA	P	66.19				74.40
	P(a)	66.19				74.40
	A	66.19	69.39	78.63		

0.5 Porcentaje de becarios activos de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después		Porcentaje	55.98	2012	Padrón de beneficiarios de Oportunidades	P	56.68			58.80	58.80
						P(a)	56.68			58.80	58.80
						A	56.68	59.38	59.53		

Disaggregation Categories		2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarios activos de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después - LOCALIDADES URBANAS	P	49.84				50.20
	P(a)	49.84				50.20
	A	49.84	51.54	51.44		
Disaggregation Categories		2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarios activos de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después - LOCALIDADES SEMI URBANAS	P	61.26				60.60
	P(a)	61.26				60.60
	A	61.26	62.34	60.50		
Disaggregation Categories		2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarios activos de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después - LOCALIDADES RURALES	P	60.66				60.60
	P(a)	60.66				60.60
	A	60.66	61.20	62.38		

Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP
0.6 Porcentaje de becarias activas de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después - MODALIDAD URBANA		Porcentaje	61.36	2012	Padrón de beneficiarios de Oportunidades		P	38.90			39.60
							P(a)	38.90			39.60
							A	38.90	40.21	45.27	
							P	63.64			64.40
							P(a)	63.64			64.40
							A	63.64	64.58	66.65	

Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarias activas de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después - LOCALIDADES URBANAS							P	58.20			59.10
							P(a)	58.20			59.10
							A	58.20	59.99	60.58	
Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarias activas de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después - LOCALIDADES SEMI URBANAS							P	66.59			67.80
							P(a)	66.59			67.80
							A	66.59	59.84	66.50	
Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarias activas de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después - LOCALIDADES RURALES							P	64.63			64.90
							P(a)	64.63			64.90
							A	64.63	65.11	69.39	
Disaggregation Categories							2013	2014	2015	2016	EOP
Porcentaje de becarias activas de Prospera con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel de educación media tres años después - MODALIDAD URBANA							P	46.86			46.60
							P(a)	46.86			46.60
							A	46.86	47.41	52.46	
0.7 Porcentaje de los beneficiarios activos de Prospera que padecen desnutrición crónica		Porcentaje	21.42	2012	Encuestas nacionales de salud y nutrición		P			16.00	16.00
							P(a)			16.00	16.00
							A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Estudios y evaluaciones		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 cuenta con representatividad para la población de Prospera, según evaluación externa	Encuesta representativa	P	1.00	1.00	P	0.00	195,869.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Informe de evaluación de alternativas de esquemas de capacitación de la EslAN aprobado por el CONEVAL.	Informe	P	1.00	1.00	P	566,769.00	1,133,538.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	566,769.00	566,169.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Informe de evaluación de esquema piloto de estimulación del desarrollo infantil temprano de beneficiarios de Oportunidades aprobado por el CONEVAL.	Informe	P	1.00	1.00	P	1,677,627.00	1,677,627.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	1,677,627.00	0.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Informe de evaluación cualitativa de nueva estructura de apoyos escolares de Prospera aprobado para publicación.	Informe	P	1.00	1.00	P	402,305.00	402,305.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	402,305.00	402,305.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Informe de evaluación de nueva estructura de apoyos escolares de Oportunidades aprobado por el CONEVAL	Informe	P	1.00	1.00	P	2,858,502.00	2,858,502.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	2,858,502.00	2,858,502.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Apoyos condicionados		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Número anualizado equivalente de personas que recibieron apoyos condicionados al cumplimiento de sus corresponsabilidades en educación, salud y nutrición.	Individuals	P	1,219,116.00	3,088,427.00	P	273,732,159.00	593,732,159.00
		P(a)	346,507.00	2,882,328.00	P(a)	141,377,195.00	596,173,024.00
		A	596,792.00	3,132,613.00	A	71,277,647.00	523,767,186.00
Total Cost					2015	Total Cost	
				P	\$279,237,362.00	\$600,000,000.00	
				P(a)	\$146,882,398.00	\$600,000,000.00	
				A	\$71,277,647.00	\$523,767,186.00	

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Número anualizado equivalente de personas que recibieron apoyos condicionados al cumplimiento de sus corresponsabilidades en educación, salud y nutrición.	Modify Financial P(a) value	Estos fueron los datos entregados por el programa en el reporte semestral de Marzo de 2015.	3/10/2016	3/1/2015
Output	Informe de evaluación de alternativas de esquemas de capacitación de la EslAN aprobado por el CONEVAL.	Modify Financial P(a) value	Esta actividad no pudo realizarse durante 2015 pues el Programa no contó con el presupuesto aprobado para el rubro de evaluaciones.	3/10/2016	6/17/2015
Outcome	Nivel de desarrollo promedio de niños de 0-5 años beneficiarios de Prospera del grupo de tratamiento del piloto de desarrollo infantil temprano	Delete Outcome Indicator	Como fue acordado con el ejecutor y se refleja en la ayuda memoria del 4 de noviembre de 2015, este tema salió del ámbito del presente proyecto por la escasa factibilidad técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital Infantil de México a Prospera.	3/9/2016	11/4/2015
Output	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 cuenta con representatividad para la población de Prospera, según evaluación externa	Inactivate Output	Como fue reflejado en el informe semestral previo al PMR de marzo de 2015, este proyecto salió del ámbito del proyecto financiado por el BID dado que no fue posible alcanzar un acuerdo con INEGI para el sobremuestreo de la población Prospera de manera oportuna antes del operativo de la ENIGH 2014.	3/9/2016	3/1/2015

Outcome	Esquema de estimulación del desarrollo infantil temprano para beneficiarios de Prospera, sometido a aprobación del Comité Técnico, como resultado de la evaluación del programa pilot de referencia.	Delete Outcome Indicator	Como fue acordado con el ejecutor y se refleja en la ayuda memoria del 4 de noviembre de 2015, este tema salió del ámbito del presente proyecto por la escasa factibilidad técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital Infantil de México a Prospera.	3/9/2016	11/4/2015
Output	Informe de evaluación de esquema piloto de estimulación del desarrollo infantil temprano de beneficiarios de Oportunidades aprobado por el CONEVAL.	Inactivate Output	Como fue acordado con el ejecutor y se refleja en la ayuda memoria del 4 de noviembre de 2015, este tema salió del ámbito del presente proyecto por la escasa factibilidad técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital Infantil de México a Prospera.	3/9/2016	11/4/2015
Output	Informe de evaluación de esquema piloto de estimulación del desarrollo infantil temprano de beneficiarios de Oportunidades aprobado por el CONEVAL.	Modify Physical P(a) value	Como fue acordado con el ejecutor y se refleja en la ayuda memoria del 4 de noviembre de 2015, este tema salió del ámbito del presente proyecto por la escasa factibilidad técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital Infantil de México a Prospera.	3/7/2016	11/4/2015
Output	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 cuenta con representatividad para la población de Prospera, según evaluación externa	Modify Physical P(a) value	Como fue reflejado en el informe semestral previo al PMR de marzo de 2015, este proyecto salió del ámbito del proyecto financiado por el BID dado que no fue posible alcanzar un acuerdo con INEGI para el sobremuestreo de la población Prospera de manera oportuna antes del operativo de la ENIGH 2014.	3/7/2016	3/1/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
