



Fondo Multilateral de Inversiones  
Miembro del Grupo BID

# PSRDEF

JULIO 2016 - DICIEMBRE 2016

## SECTION 1: PROJECTSUMMARY

**PROJECTNAME:** Recuperación de Adolescentes y Jóvenes con Adicción a las Drogas

ProjectNum: AR-M1070 - OperationNum: ATN/ME-14796-AR

**Purpose:** El resultado del proyecto es la sistematización y el fortalecimiento organizacional del modelo de abordaje del Obispado de San Isidro para la inclusión social—y eventualmente laboral—de jóvenes adictos y en riesgo que habitan en villas.

**CountryAdmin**

ARGENTINA

**CountryBeneficiary**


ARGENTINA

**EA:** OBISPADO DE SAN ISIDRO


**DesignTeamLeader:** MARIO SANCHEZ

**SupervisionTeamLeader:** MARIEL SABRA


## PROJECTCYCLE



## PSRRESOURCEDISBURSED

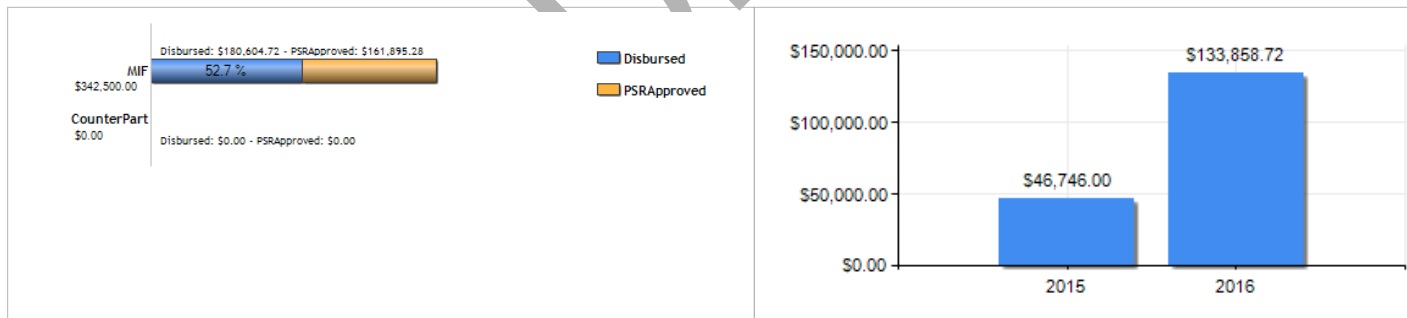

## PERFORMANCERATINGS

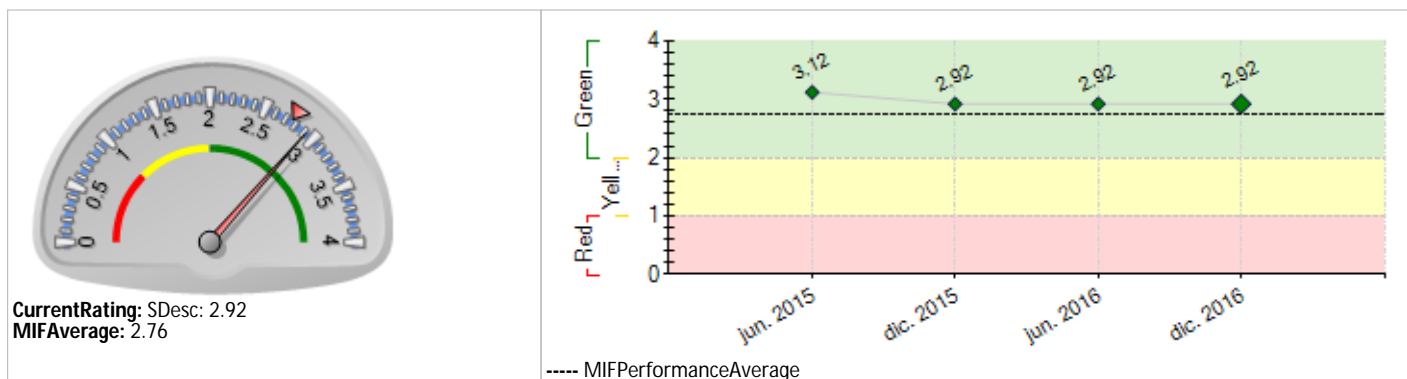

## EXTERNALRISK


## INSTITUTIONALCAPACITY

**Risk**

**FinancialMngt:** Low

**Procurement:** Low

**TechnicalCapacity:** High

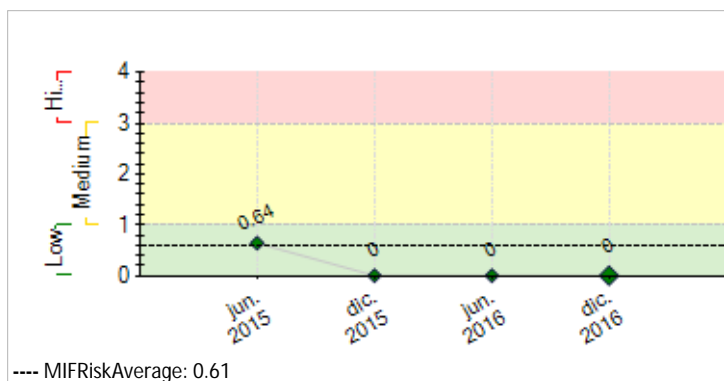

## SECTION 2: PERFORMANCE

### PSRReportCumulative

C.1 – validación de la metodología de intervención en los 4 Centros Barriales (CBD);

C.1. - 930 jóvenes contactados a la fecha, de los cuales fueron atendidos más de 220.

C.1. – transferencia al municipio de San Isidro de los equipos de 2 CBD.

C.2 – llegada a audiencias objetivo para presentar los resultados del proyecto (Washington, Santiago de Chile, autoridades nacionales), en alianza con actores clave (UCA).

C.2 –paneles de expertos para definir perfiles por competencias en los ámbitos educativo, laboral y comunitario realizados.

C.3 – puesta en funcionamiento en los Centros del Sistema Único de Registro

C.3 – perfiles de las investigaciones en el ámbito judicial; género e inserción laboral realizados.

### Retrasos

C.2 – el evento a realizarse tentativamente en mayo se está repensando como instancia de articulación del Proyecto en relación a su futura sustentabilidad; y también como un nexo con actividades educativas.

C.3.- la sistematización del modelo de intervención precisa de mayor recolección de datos, por lo cual esta acción se seguirá implementando hasta obtener la información necesaria.

### Acciones críticas:

Terminar la transferencia de equipos de CBD a Municipios.

Ejecución de la consultoría en Formación por Competencias y actividad de implementación de experiencia piloto en 30 escuelas.

Desarrollo de las investigaciones propuestas para el componente de Monitoreo.

### PSRCommentsMIFSpecialist

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto tiene un desarrollo muy adecuado, logrando resultados no sólo en términos de cantidad de jóvenes atendidos, sino también en desarrollo metodológico, estudios y proyección de actividades preventivas.

## PSRReportSemester

En agosto se hizo una visita a Santiago de Chile, donde una delegación de nuestro proyecto pudo ponerse en contacto con otras organizaciones. Participaron integrantes de los CBD que consideraron a la experiencia como muy positiva y fructífera, con el compromiso además de continuar este diálogo en 2017 en un nuevo encuentro a realizarse en Montevideo.

Los paneles de expertos (hechos entre septiembre y noviembre) permitieron avanzar en el armado de perfiles de formación por competencias. Entre los expertos del ámbito educativo surgió una propuesta para implementar en 2017, en escuelas del ámbito de la diócesis.

En octubre se realizó un evento institucional, que contó con la presencia de autoridades del BID, atrayendo también a varias autoridades (incluyendo las carteras de Desarrollo Social y Trabajo de la Nación) y reforzando el compromiso de continuar el trabajo con los Centros.

A lo largo del semestre se ha continuado consolidando el trabajo conjunto entre los equipos de los Centros Barriales y se continúan obteniendo buenos resultados. En este caso destaca la realización de un curso para operadores barriales, realizado íntegramente por los equipos de nuestros Centros, así como en el marco de La Cava, lo cual fue considerado como una experiencia enriquecedora para todos los involucrados.

Finalmente, y en relación a la sustentabilidad del proyecto, se logró avanzar en la transición de los equipos a los municipios, habiendo ya comenzado en diciembre el traspaso.

## PSRCommentsMIFSpecialist

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo. Los avances en materia técnica y de sostenibilidad de este semestre son alentadores para el proyecto. Asimismo, su capacidad de transmitir a otras operaciones de la región la experiencia y la metodología cobran relevancia.

## SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators		Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
<b>Purpose:</b>  El resultado del proyecto es la sistematización y el fortalecimiento organizacional del modelo de abordaje del Obispado de San Isidro para la inclusión social—y eventualmente laboral—de jóvenes adictos y en riesgo que habitan en villas.	R.1 Metodología de atención a jóvenes en situación de dependencia de sustancias en villas sistematizada.	0				1 Sep. 2016	1 Jun. 2016	
	R.2 Procesos operativos evaluados y mejorados.	0				1 Sep. 2016	1 Jun. 2016	
	R.3 Jóvenes atendidos. Desagregar por sexo y ubicación	0				220 Jun. 2017	287 Dic. 2016	
	R.4 Red de Instituciones multisectoriales de asistencia a jóvenes operando (nacionales y/o subnacionales) en la Diócesis de San Isidro.	0				1 Jun. 2017	0	
<b>Component 1:</b> Fortalecimiento de Centros Barriales de asistencia y recuperación de jóvenes adictos  <b>Weight:</b> 30% <b>Classification:</b> Satisfactorio	C1.1 Cuatro centros operando.	0				4 Sep. 2016	4 Jun. 2015	Finished
	C1.2 Jóvenes contactados por los operadores barriales. Desagregar por sexo y ubicación	0				600 Jun. 2017	930 Dic. 2016	OnCourse
	C1.3 Mapeo de instituciones e instructivos de derivación por centro realizado	0				4 Sep. 2016		Delayed
<b>Component 2:</b> Comunicación/Prevención  <b>Weight:</b> 30% <b>Classification:</b> Satisfactorio	C2.1 Operadores Barriales formados. Desagregar por sexo y ubicación	0				80 Sep. 2016	76 Dic. 2015	OnCourse
	C2.12 Educadores para prevención de adicciones capacitados. Desagregar por sexo y ubicación	0				100 Jun. 2017	76 Dic. 2015	OnCourse
	C2.13 Materiales para formación de operadores y de educadores editados y publicados	0				2 Sep. 2016		Delayed
	C2.14 Eventos de difusión del programa, sus productos y resultados a audiencias estratégicas	0	1 Dic. 2015	1 Dic. 2016	1 Jun. 2017	3 Jun. 2017	2 Oct. 2016	OnCourse
	C2.15 Definición de perfiles requeridos para el trabajo con adicciones y trayecto formativo por competencias según el ámbito de acción (barrial, educativo y laboral)	0				1 Jun. 2017		
	C2.16 Instituciones educativas certificadas como preventoras de adicciones.	0				20 Jun. 2017		
<b>Component 3:</b> Monitoreo y evaluación  <b>Weight:</b> 40% <b>Classification:</b> Satisfactorio	C3.1 Sistema de monitoreo diseñado y funcionando.	0				1 Mar. 2016	1 Dic. 2016	Finished
	C3.12 Línea de base construida.	0				1 Nov. 2015	1 Mar. 2016	Finished
	C3.13 Encuesta de caracterización de consumo realizada.	0				1 Mar. 2016	1 Mar. 2016	Finished
	C3.14 Encuesta de caracterización de consumo	0				1 Sep. 2016	1 Mar. 2016	Finished
	C3.15 Estudio diagnóstico sobre la problemática de adicción en mujeres.	0				1 Jun. 2017	0.3 Dic. 2016	OnCourse
	C3.16 Estudio sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en inserción laboral de jóvenes en situación de consumo de	0				1	0.3	OnCourse

	drogas.					Jun. 2017	Dic. 2016	
C3.17	Estudio sobre jóvenes en conflicto con la ley	0				1	0.6	OnCourse
						Jun. 2017	Dic. 2016	

Milestones	Planned	DueDate	Achieved	DateAchieved	Status
H0 Condiciones previas	6	Sep. 2015	6	Abr. 2015	Achieved
H1 Elaboración de 9 (nueve) paneles de expertos, distribuidos en 3 (tres) paneles según el ámbito de acción: barrial, educativo y laboral.	1	Dic. 2016	1	Nov. 2016	Achieved
H2 4 (cuatro) Centros operando con monitoreo implementado	1	Jul. 2017			
H3 Estudio diagnóstico sobre la problemática de adicción en mujeres.	1	Sep. 2017			
H4 Sistema de monitoreo y registro implementado en su totalidad	1	Dic. 2017			

PSRCRITICALISSUETITLE

[NoneReportedFactors]

## SECTION 4: RISKS

PSRRISKTITLE

OVERALLPROJECTRISK: Low NRORISKS: 2 INEFFECTRISK: 0 NOTINEFFECTRISK: 0 MITIGATEDRISKS: 2

## SECTION 5: SUSTAINABILITY

PSRSustainabilityScore: P - Probable

PSRCRITICALISSUESSUSTAINABILITYTITLE

[NoneReportedFactors]

RelativeActions:

En el presente periodo de reporte se han tomado importantes pasos en pos de la sustentabilidad del Proyecto. Lo más saliente es que las negociaciones que se venían manteniendo al nivel de los municipios se intensificaron y finalmente comenzaron a dar sus frutos, con el traspaso efectivo de dos de los cuatro equipos de operadores (al municipio de San Isidro), y con el compromiso de Tigre y Vicente López de resolver el traspaso de sus correspondientes equipos durante el primer cuatrimestre de 2017. Asimismo se incorporó SEDRONAR como un interlocutor clave para garantizar la continuidad de las actividades que se realizan en los centros.

## SECTION 6: PRACTICALLESSONS

1. Al considerar la posibilidad de dejar capacidad instalada en el área de influencia del Proyecto, es preciso tener en cuenta que la estructura que permanezca en términos de recursos humanos sea sostenible en el tiempo. En el transcurso del trabajo con nuestros Centros Barriales hemos llegado a apreciar que el rol que puede jugar la figura de un psiquiatra debe pensarse de manera transitoria y no como una figura permanente, ya que implica un costo añadido a una estructura que de por sí tracciona una cantidad significativa de recursos. En la medida en que el desarrollo del proyecto lo avale, siempre se priorizará el trabajo con redes ya existentes, que permitan entonces optimizar los recursos que se pretendan obtener para sostener en el tiempo las capacidades instaladas.

RelativeTo  
SustainabilityAuthor  
Slep, Melisa
