
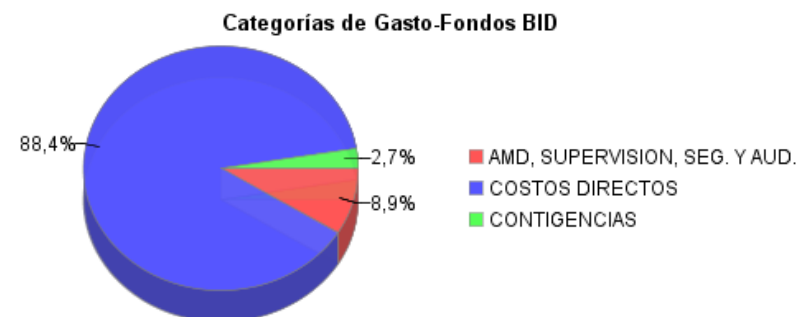
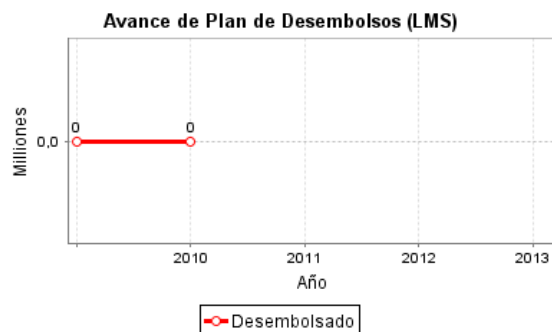


Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-NATURAL DISASTERS PREVENTION RELIEF				
Número(s) de Préstamo:	2152/BL-HO	Monto Aprobado Actual:	19.000.000,00	BID Original:	19.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	19.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	
Operación(es) Relacionada(s):	HO-P1010, HO-X1013	Saldo:	19.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	19.000.000,00
				Periodo de Amortización (meses):	282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 17, 2011 Validado por Representante de País: Apr 15, 2011

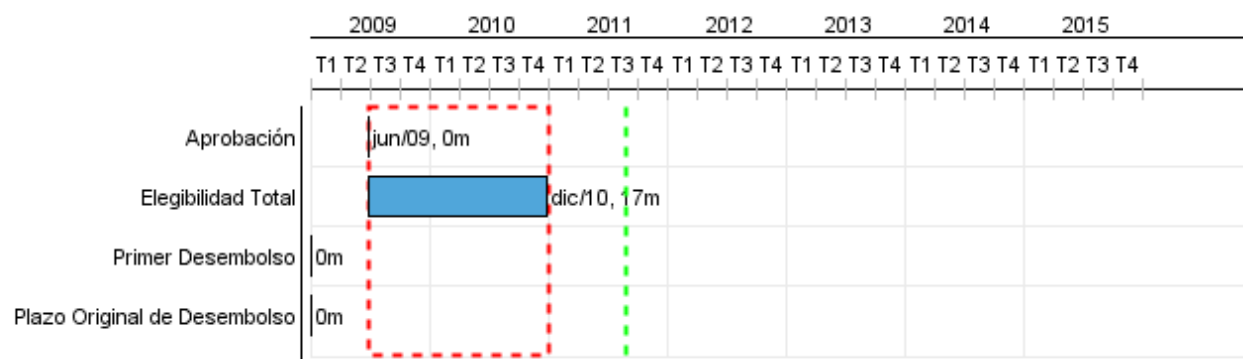

Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado

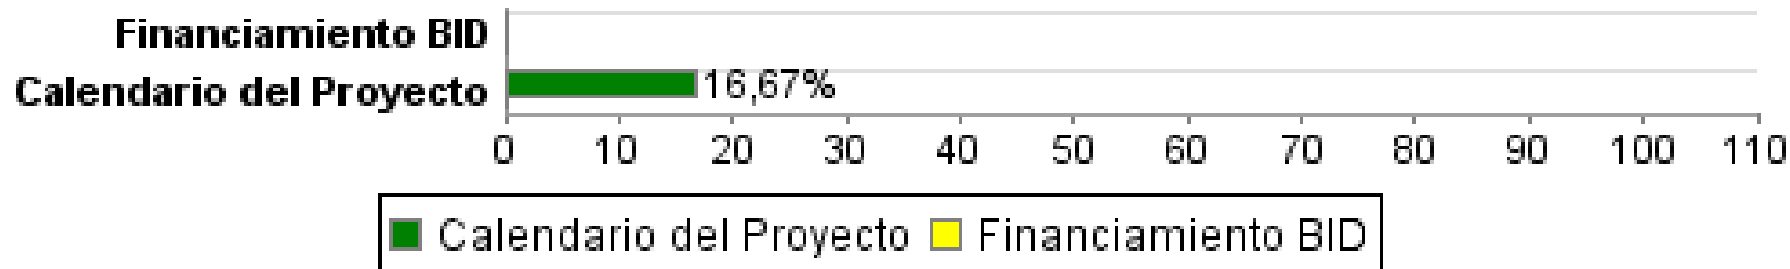

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

HO-L1031 - Proyecto de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 11/03/2011

Resultados

Resultado:	Gestión de riesgos en los municipios (IGR-m) intervenidos por el Programa mejorada.
Supuestos:	Dadas las intervenciones del proyecto a nivel municipal, el IGR-m será adaptado para calcular el desempeño en la gestión de riesgos a nivel municipal.
Observaciones:	El IGR-m en los municipios a ser intervenidos por el proyecto será calculado en el marco de la preparación de los planes de prevención y mitigación de desastres.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2015	Fin de Proyecto
Índice de Gestión de Riesgo Municipal (IGR-m) incrementado.	IGR-m		2011	P A	40,00	40,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Prevención y mitigación a nivel municipal									
Producto 1.1: Obras estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas.	obras				45,00				9.000.000,00
Producto 1.2: Obras no estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas	obras				10,00				2.000.000,00
Producto 1.3: Planes de gestión de riesgo a nivel municipal formulados.	planes				20,00				1.640.000,00
Producto 1.4: Sistema Integral de Gestión del Riesgos SIGRET/CAPRA finalizado.	sistema				1,00				367.900,00
Fortalecimiento de la capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel comunitario y municipal									
Producto 2.1: Medidas de gestión integral de riesgos a desastres a nivel municipal implementadas	Municipios				10,00				712.800,00
Producto 2.2: Medidas prioritarias de gestión de riesgos a desastres a nivel comunitario implementadas	Comunidades				10,00				2.787.200,00
Fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres									
Producto 3.1: Plan estratégico nacional para la gestión integral de riesgos de desastres elaborado	Plan				1,00				100.000,00
Producto 3.2: Gestión integral de riesgos de desastres incorporada a los planes estratégicos sectoriales	Plan				2,00				390.000,00
Producto 3.3: Plan de fortalecimiento Institucional de Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) Implementado	Plan				1,00				930.000,00
Educación e información para la gestión del riesgo									
Producto 4.1: Estrategia de socialización de información de riesgo desarrollada.	Estrategia				1,00				250.000,00
Producto 4.2: Curricula relacionada a la gestión integral de riesgos de desastres implementada en escuelas primarias y secundarias	Municipios				20,00				300.000,00
Producto 4.3: Curricula de gestión integral de riesgos de desastres incorporada a carreras universitarias	Carreras universitarias				5,00				330.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

HO-L1031 - Proyecto de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 11/03/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Producto 4.4: Funcionarios municipales capacitados sobre la nueva reglamentación y normas técnicas de construcción impartida.	Funcionarios				200,00				
Administración del Programa									
Monitoreo y Evaluación									
Contingencias									
TOTAL									18.807.900,00
