
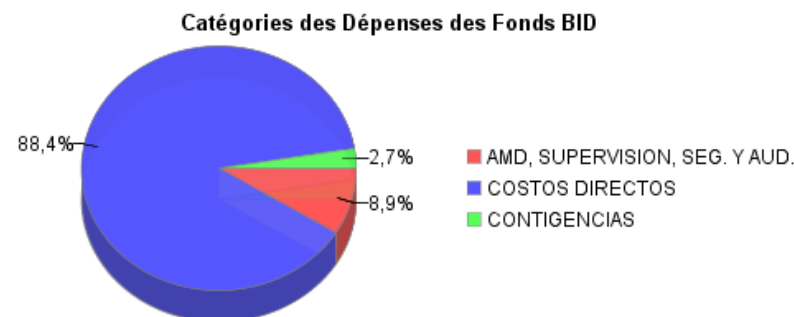
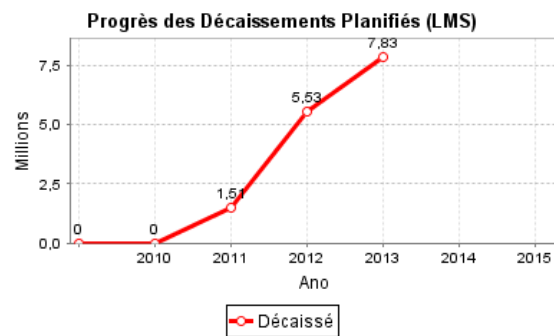



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS		
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT		
Numéro(s) de Prêt(s):	2152/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	19.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	7.834.363,25
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	41,23
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1010, HO-X1013	Solde:	11.165.636,75
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	19.000.000,00
		Courant BID:	19.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	19.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 03-abr-2013
		Validé par le Représentant: 16-abr-2013

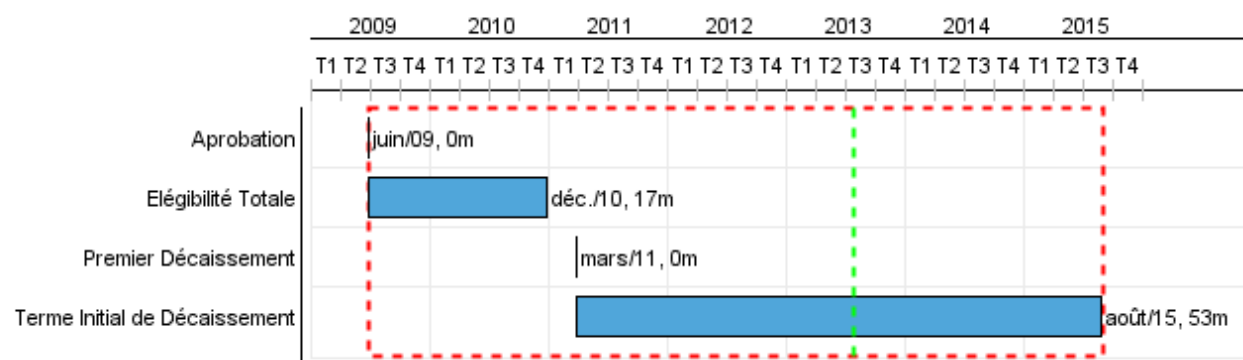

Progrès Cumulé à 2012

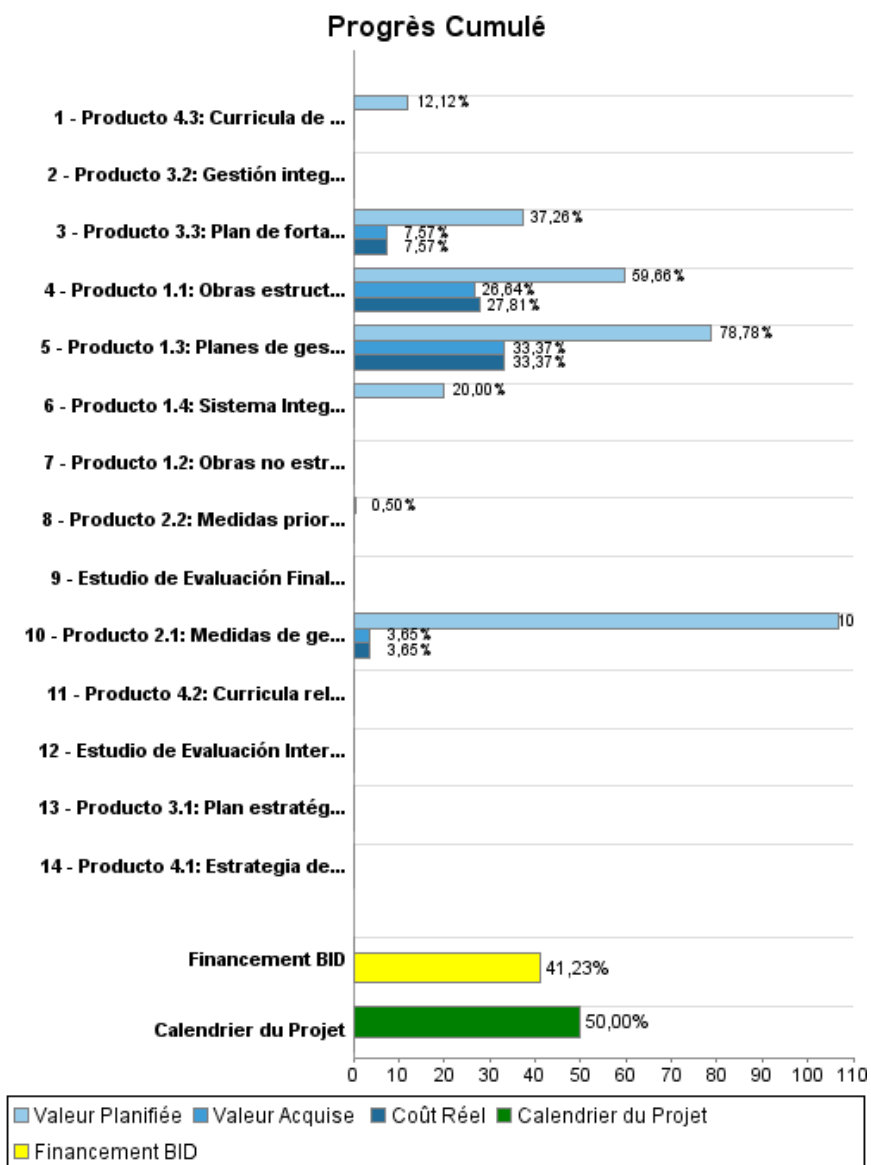

Résultats

Résultat:	Gestión de Riesgos mejorada en los municipios intervenidos por el Programa.
Suposições:	Dadas las intervenciones del proyecto a nivel municipal, el IGR-m será adaptado para calcular el desempeño en la gestión de riesgos a nivel municipal.
Observações:	El IGR-m en los municipios a ser intervenidos por el proyecto será calculado en el marco de la preparación de los planes de prevención y mitigación de desastres.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2015	Fin du Projet
Gestión Integral del Riesgo incorporada en los Planes de Desarrollo Municipal de los Municipios Intervenidos.	municipios		2011	P A	3,00	10,00	10,00
Ordenanzas municipales en respuesta al Plan de Gestión de Riesgos aprobadas e implementadas.	ordenanzas municipales		2011	P A	5,00	10,00	10,00
Gestión Integral del Riesgo incorporada en los Planes Estratégicos de Sectores Gubernamentales.	sectores		2011	P A		2,00	2,00
Gestion Integral del Riesgo incorporada a la Curricula Educativa Nacional	curricula		2011	P A		1,00	1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Prevención y mitigación a nivel municipal									
Producto 1.1: Obras estructurales de mitigación de riesgo construidas.	obras	6,00	5,00		45,00	1.900.000,00	1.700.000,00		9.998.694,52
Producto 1.2: Obras no estructurales de mitigación de riesgo ejecutadas	obras				10,00				150.000,00
Producto 1.3: Planes de gestión de riesgo a nivel municipal formulados.	Governments				20,00	558.000,00	560.000,00		1.678.000,00
Producto 1.4: Sistema Integral de Gestión del Riesgos SIGRET/CAPRA finalizado.	sistema				1,00	30.000,00			350.000,00
Fortalecimiento de la capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel comunitario y municipal									
Producto 2.1: Medidas de gestión integral de riesgos a desastres a nivel municipal implementadas	Municipios				10,00	150.000,00			320.000,00
Producto 2.2: Medidas prioritarias de gestión de riesgos a desastres a nivel comunitario implementadas	Comunidades				8,00				2.003.305,48
Fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres									
Producto 3.1: Plan estratégico nacional para la gestión integral de riesgos de desastres elaborado	Plan				1,00				100.000,00
Producto 3.2: Gestión integral de riesgos de desastres incorporada a los planes estratégicos sectoriales	Plan				2,00				390.000,00
Producto 3.3: Plan de fortalecimiento Institucional de Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) Implementado	Plan				2,00	100.000,00	50.000,00		930.000,00
Educación e información para la gestión del riesgo									
Producto 4.1: Estrategia de socialización de información de riesgo desarrollada	estrategia				1,00				250.000,00
Producto 4.2: Curricula relacionada a la gestión integral de riesgos de desastres implementada en escuelas primarias y secundarias de los Municipios Intervenido.	Municipios				10,00				300.000,00
Producto 4.3: Curricula de gestión integral de riesgos de desastres incorporada a carreras universitarias	Carreras universitarias				5,00				330.000,00
Administración del Programa									

RAPPORT DE SUIVI

HO-L1031 - Disaster Risk Prevention and Mitigation Project
2012 2^o período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 03/04/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Unidad Coordinadora	N/A					421.519,21	320.000,00		1.434.855,60
Auditoría Financiera Externa	N/A					12.000,00	20.000,00		85.144,40
Monitoreo y Evaluación									
Estudio de Evaluación Intermedia del Programa Realizada	Estudio				1,00				75.000,00
Estudio de Evaluación Final del Programa Realizada	estudio				1,00				100.000,00
Contingencias									
Contingencias e Imprevistos	N/A								505.000,00
TOTAL						3.171.519,21	2.650.000,00		19.000.000,00
