



Operation Number: **HO-L1093**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **4/1/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**
Division Chief validation date: **04/03/2016**
Country Representative validation date: **04/05/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Social Protection System Support Program I	Loan Number:	3371/BL-HO
Executing Agency (EA):	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		
Team Leader:	Tejerina,Luis R.	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HONDURAS
Borrower:	REPUBLICA DE HONDURAS	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HO-L1093	\$109,870,000.00	\$109,870,000.00	\$10,987,000.00	\$0.00	\$120,857,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HO-L1093	\$109,870,000.00	\$20,000,000.00	18.20%	\$89,870,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

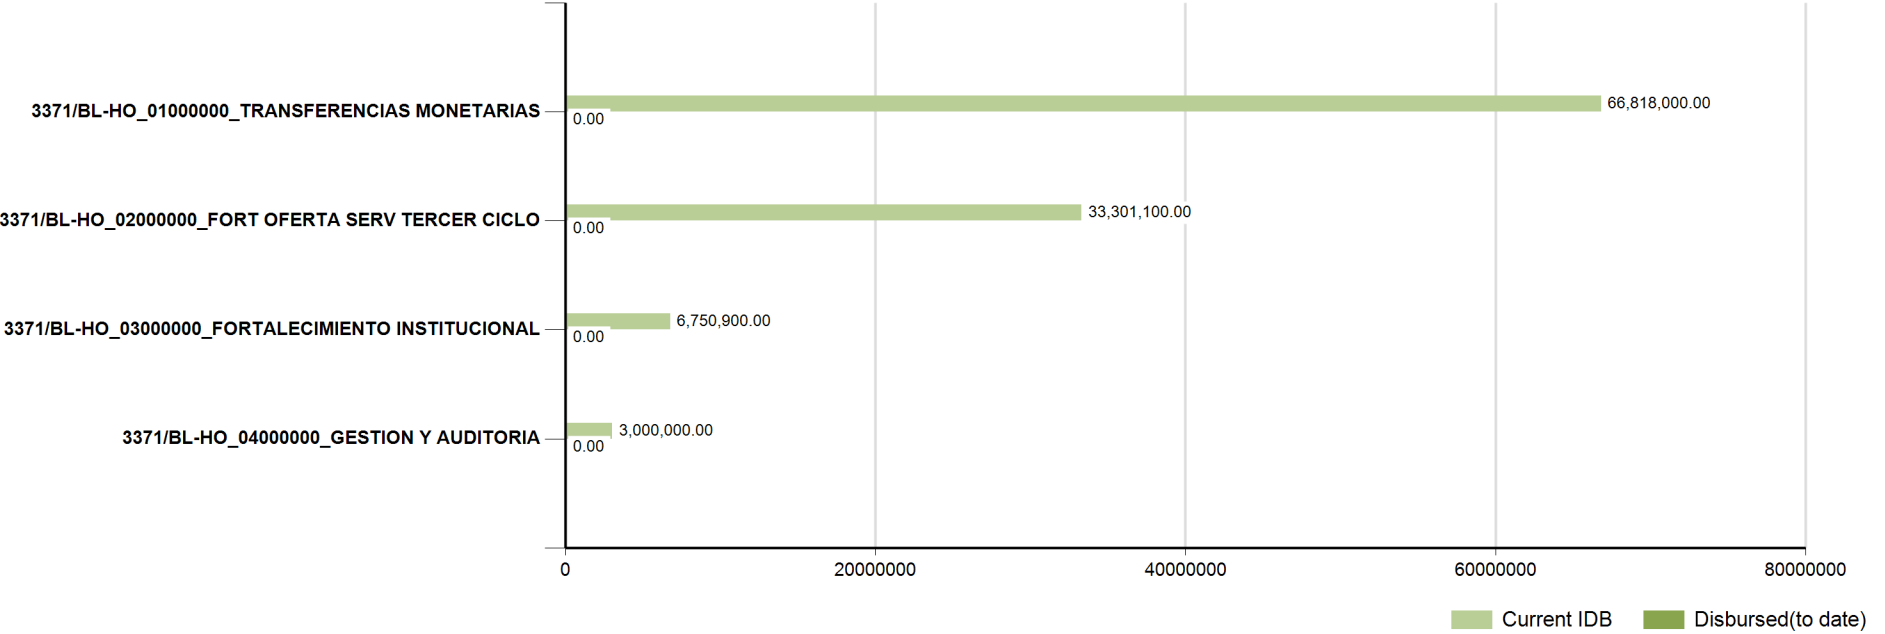

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Acumulación de capital humano y reducción en la intensidad de la pobreza en familias beneficiarias que viven en situación de pobreza										
Observation:	Las metas de los indicadores para “Fin de Proyecto” se determinaron con base en los cambios observados entre la línea de base y el seguimiento de la evaluación de impacto (EDH 2012 y EDH 2013), así como en las mejoras propuestas tales como pago por niño, mejora de corresponsabilidades, y mejor calidad en la atención a familias beneficiarias. De igual forma, el componente educativo apoyará los indicadores de cobertura en tercer ciclo de básica.										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP			
0.0 Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa			%	49.62	2013	Encuesta Nacional de Hogares		P	455.00		
								P(a)			
								A			
0.1 Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica			%	71.12	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	82.00		
								P(a)			
								A			
Disaggregation Categories								EOP			
		Hombres						P	80.00		
								P(a)			
								A			
		Disaggregation Categories								EOP	
				mujeres						P	83.00
P(a)											
A											
0.2 Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9º)					%	23.41	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	31.00
										P(a)	
		A									
Disaggregation Categories								EOP			
		Hombres						P	27.00		
								P(a)			
								A			
		Disaggregation Categories								EOP	
				Mujeres						P	32.00
P(a)											
A											
0.3 Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo					%	65.35	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	73.00
										P(a)	
		A									
0.4 Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa			%	44.07	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono Vida Mejor		P	34.00		
								P(a)			
								A			

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Educacion							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Tasa neta de matrícula del primer y segundo ciclo de educación básica.		%	84.51	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	88.00
							P(a)	88.00
	A							
Disaggregation Categories							EOP	
Hombres							P	88.00
							P(a)	88.00
							A	
Disaggregation Categories							EOP	
Mujeres							P	87.00
							P(a)	87.00
							A	
0.1 Tasa neta de matrícula del tercer ciclo de educación básica.		%	30.51	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	37.00
							P(a)	37.00
	A							
Disaggregation Categories							EOP	
Hombres							P	35.00
							P(a)	35.00
							A	
Disaggregation Categories							EOP	
Mujeres							P	40.00
							P(a)	40.00
							A	
0.2 Tasa de asistencia escolar de educación básica.		%	78.20	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	85.00
							P(a)	85.00
	A							
Disaggregation Categories							EOP	
Hombres							P	85.00
							P(a)	85.00
							A	
Disaggregation Categories							EOP	
Mujeres							P	85.00
							P(a)	85.00
							A	

0.3 Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.		%	51.70	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	64.00
							P(a)	
							A	

Disaggregation Categories							EOP	
Hombres							P	54.00
							P(a)	54.00
							A	
Disaggregation Categories							EOP	
Mujeres							P	76.00
							P(a)	
							A	

0.4 Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas		Numero de alumnos	0.00	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	22,500.00
							P(a)	22,500.00
							A	

Disaggregation Categories							EOP	
Hombres							P	10,250.00
							P(a)	10,250.00
							A	
Disaggregation Categories							EOP	
Mujeres							P	14,250.00
							P(a)	14,250.00
							A	

Outcome:	1 Salud
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Porcentaje de mujeres beneficiarias (15-49 años de edad) que recibieron por lo menos cuatro atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.		%	77.02	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	82.00
							P(a)	82.00
							A	

1.1 Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.		%	56.38	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	66.00
							P(a)	
							A	
1.2 Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.		numero de niños	44.18	2013	Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM		P	50.00
							P(a)	
							A	
Outcome:	2 Eficacia y efectividad del Programa Bono 10,000							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.0 Porcentaje de hogares participantes que son pobres extremos.		%	72.64	2013	Encuesta Permanente de Hogares		P	80.00
							P(a)	80.00
							A	
2.1 Porcentaje de hogares en pobreza extrema en zonas rurales que reciben el BVM.		%	31.76	2015	Encuesta Permanente de Hogares		P	45.00
							P(a)	45.00
							A	
2.2 Antigüedad de la base de datos de beneficiarios. (número de años de rezago=año actual –año en el que fue capturada la información).		años	5.30	2015	Sistema de Información Gerencial		P	3.30
							P(a)	3.30
							A	
2.3 Porcentaje de hogares participantes rurales que han recibido al menos una transferencia a través de un mecanismo alternativo de pago.		%	15.00	2015	Sistema de Información Gerencial		P	30.00
							P(a)	30.00
							A	

2.4 Número de pagos realizado en el año calendario a hogares participantes.		pagos	3.00	2015	Sistema de Informació n Gerencial		P	4.00
							P(a)	4.00
							A	
2.5 Pertinencia de la información de corresponsabilidades en salud (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).		meses	10.00	2015	Sistema de Informació n Gerencial		P	6.00
							P(a)	6.00
							A	
2.6 Pertinencia de la información de corresponsabilidades en educación (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).		meses	8.00	2015	Sistema de Informació n Gerencial		P	4.00
							P(a)	4.00
							A	
2.7 Porcentaje de hogares que recibe el primer pago del año que recibe todos los pagos.		%	75.60	2015	Sistema de Informació n Gerencial		P	85.00
							P(a)	85.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE 1. Transferencias Monetarias Condicionadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	Individuals	P	469,000.00	938,000.00	P	14,808,385.00	78,319,423.00
		P(a)	469,000.00	938,000.00	P(a)	14,808,385.00	85,209,192.50
		A	234,500.00	0.00	A	7,404,192.50	7,404,192.50
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Número de facilitadores capacitados por el IHER prestando servicios educativos de tercer ciclo en centros escolares seleccionados.	Número de facilitadores	P	250.00	1,100.00	P		8,000,000.00
		P(a)	250.00	1,100.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Número de Escuelas	P	27.00	150.00	P		18,500,000.00
		P(a)	27.00	150.00	P(a)		17,445,358.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario y Tecnología Educativa	Número de Escuelas	P	50.00	150.00	P		3,260,000.00
		P(a)	50.00	401.00	P(a)		1,324,890.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Paneles solares instalados en Centros de Educación Básica Ampliados	Número de Paneles instalados	P	0.00	30.00	P		1,000,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Número de Centros	P	150.00	450.00	P	134,429.00	1,035,570.00
		P(a)	150.00	450.00	P(a)	134,429.00	12,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Número de centros educativos	P	2,000.00	6,500.00	P		757,680.00
		P(a)	2,000.00	6,500.00	P(a)		2,455,852.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estrategia de Expansión del Tercer Ciclo	Informes de evaluacion	P	1.00	3.00	P		300,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)		75,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
COMPONENTE 3. Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Número de niños menores de dos años que reciben micronutrientes y desparasitantes	Número de niños	P	15,000.00	45,000.00	P		1,000,000.00
		P(a)	15,000.00	30,000.00	P(a)		735,546.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Número de fichas del RUP levantadas.	Número de fichas	P	0.00	50,000.00	P	500,000.00	500,000.00
		P(a)	0.00	50,000.00	P(a)	500,000.00	670,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Número de consultorias	P	2.00	4.00	P	5,000.00	50,000.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	5,000.00	70,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Número de centros de salud	P	237.00	857.00	P		92,426.00
		P(a)	237.00	857.00	P(a)		569,729.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Guías de Familia contratados y capacitados para la atención a los hogares participantes.	Número de guías de familia	P	50.00	150.00	P		2,517,000.00
		P(a)	50.00	657.00	P(a)		3,540,999.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Número de mancomunidades	P	2.00	10.00	P		460,000.00
		P(a)	2.00	10.00	P(a)		305,724.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Talleres de capacitación en temas de género.	Número de talleres	P	10.00	30.00	P		150,000.00
		P(a)	10.00	10.00	P(a)		76,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Número de informes	P	1.00	3.00	P		505,974.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)		288,064.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Número de informes	P	0.00	2.00	P		1,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2015	Cost
Gestion de la operacion	P	\$483,345.00	\$3,408,927.00
	P(a)	\$483,345.00	\$2,494,838.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$15,931,159.00	\$120,857,000.00
	P(a)	\$15,931,159.00	\$128,261,192.50
	A	\$7,404,192.50	\$7,404,192.50

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
