
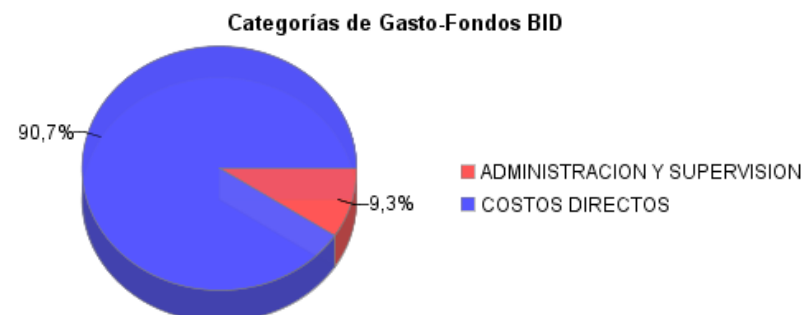
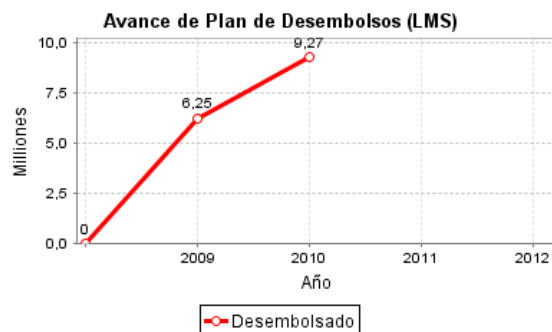



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Ministerio de la Presidencia				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-EMPLOYMENT AND THE WORKFORCE				
Número(s) de Préstamo:	1768/OC-PN	Monto Aprobado Actual:	27.000.000,00	BID Original:	27.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	14.684.564,28	Actual BID:	27.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	54,39	Pari-passu:	83,64
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	12.315.435,72	Co-financiamiento/País:	300.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples			Estimado Original:	27.300.000,00
				Período de Amortización (meses):	174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B (X) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 24, 2011 Validado por Representante de País: Mar 31, 2011

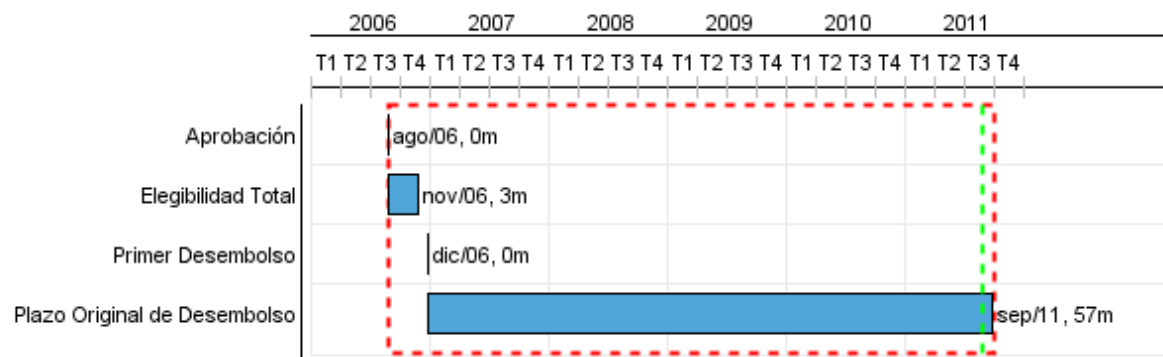

Progreso Acumulado al 2010

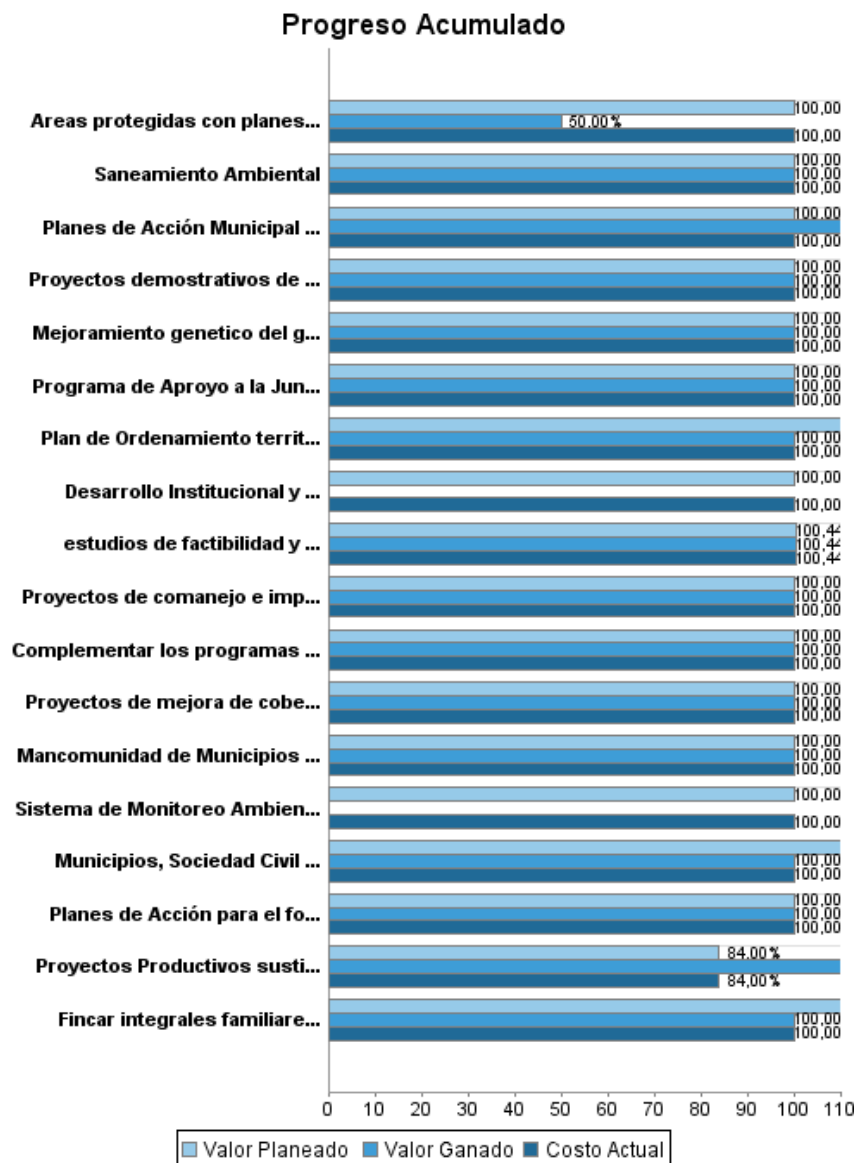


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1005 - Desarrollo Sostenible para la Provincia de Chiriquí. Fase I
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 23/03/2011

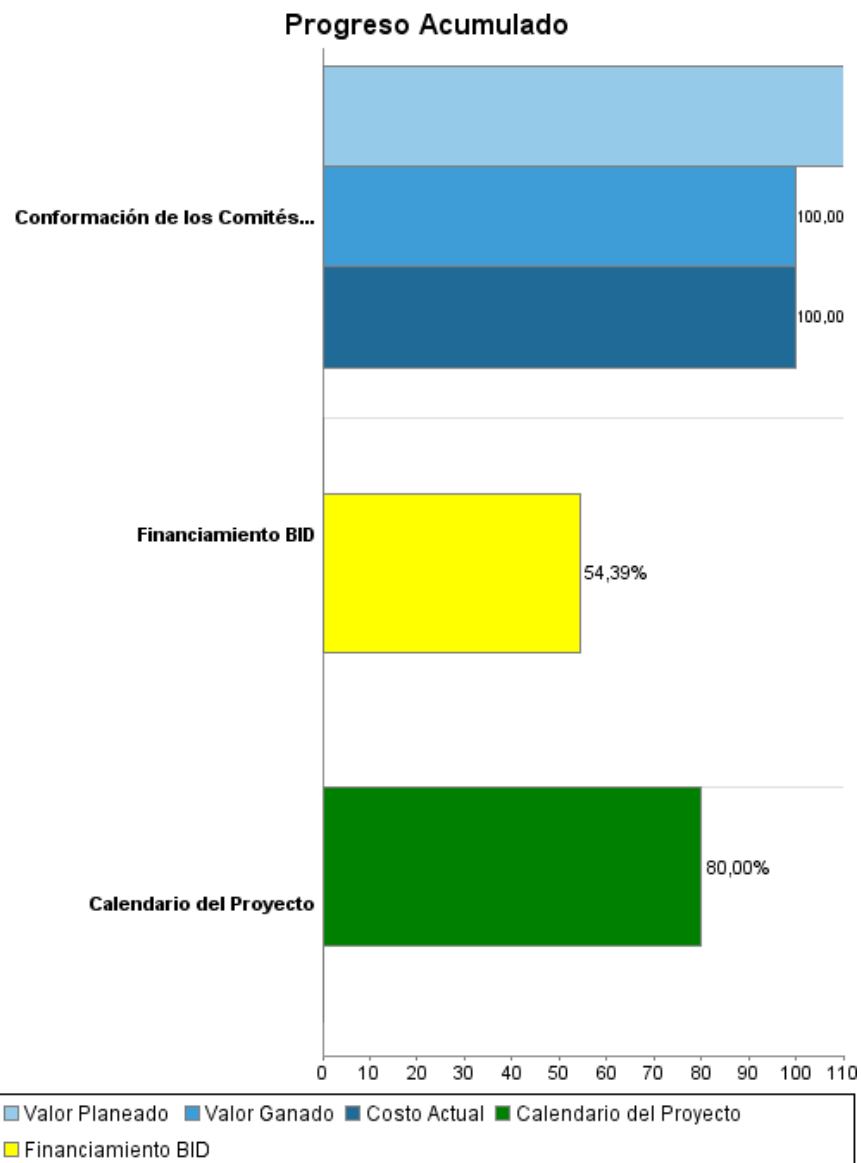

Resultados

Resultado:	Capacidad de gestión de los agentes públicos, privados y comunitarios fortalecida, a fin de impulsar la implementación y gestión descentralizada de la Estrategia de Desarrollo y su Plan de Acción.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
5 municipios de Chiriquí con Planes de mejoras administrativas y financieras implementados en un 50% y con aumento de ingresos municipales de 15% al tercer año de ejecución del Programa.	% de Ingreso tributario (Rango entre 33% - 73% de Recaudación)	33,00		P A	15,00		20,00	15,00

Resultado:	Generar las oportunidades para diversificar y dinamizar la base económica productiva, integrando actividades productivas con infraestructura de apoyo al desarrollo socioeconómico sostenible de la Provincia.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Disminuir el índice de pobreza en áreas críticas de Barú (53%), Alanje (56%), Tolé (74%), Remedios (56%), San Félix (42%) y San Lorenzo (56%).	% de pobreza en Tolé y otras áreas críticas	74,00		P A			50,00	50,00

Resultado:	Dotar y/o implementar de instrumentos de gestión ambiental para aumentar las capacidades de las instituciones claves en el manejo de los recursos naturales y el ambiente.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Mantener el % de Cobertura Boscosa en la Provincia de Chiriquí (19% en el año 2000)	% de cobertura boscosa en la Provincia	19,00		P A		19,00		19,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento de Gobiernos Locales									
Planes de Acción Municipal Elaborados y Aprobados	planes elaborados	6,00	10,00		10,00	1.819.243,00	1.819.243,00		1.819.243,00
Mancomunidad de Municipios del Oriente Chiricano creada	mancomunida d creada	1,00	1,00		1,00	108.011,00	108.011,00		108.011,00
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión de COOSEMUPAR	Capacitada	1,00			1,00	432.233,00	432.233,00		432.233,00
Municipios, Sociedad Civil y Asociaciones Capacitadas	organizaciones capacitadas		6,00		6,00		93.234,00		93.234,00
Conformación de los Comités Subregionales y Plan de Acción Elaborado	Comités conformados		4,00		4,00		28.942,00		28.942,00
Capacidades de Gestión de las Oficinas Regionales de las Instituciones Claves de Gobierno Fortalecidas									
Programa de Apoyo a la Junta Técnica Provincial	JTP Fortalecida	1,00	1,00		1,00	58.888,00	58.888,00		58.888,00
Planes de Acción para el fortalecimiento de las oficinas regionales	Oficinas regionales con planes de acción	4,00	4,00		4,00	31.688,00	31.688,00		31.688,00
Infraestructura y Servicios de Apoyo a la Competitividad ejecutados									
Proyectos de mejora de cobertura de agua potable y servicios básicos	No. de acueductos rehabilitados	9,00	9,00		9,00	2.647.745,00	2.647.745,00		2.647.745,00
Complementar los programas de inversión del gobierno en infraestructura básica orientada al sector productivo	Proyectos Ejecutados	6,00	6,00		6,00	4.205.880,00	4.205.880,00		4.205.880,00
Aumento del Empleo en Areas Críticas y Modernización de la base productiva del Sector Primario									
Proyectos Productivos sustitutivos del Banano en las áreas críticas	No. de proyectos implementados	1,00	2,00		2,00	562.465,00	562.465,00		669.602,00
Pescadores artesanales capacitados y con nuevas artes de pesca	pescadores	28,00	28,00		120,00	275.194,00	275.194,00		1.196.498,00
Fincar integrales familiares como alternativa en oriente chiricano y barú	No. Fincas		5,00		5,00		4.472,00		4.472,00
Mejoramiento genetico del ganado vacuno	No. Fincas beneficiadas	34,00	34,00		34,00	575.400,00	575.400,00		575.400,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1005 - Desarrollo Sostenible para la Provincia de Chiriquí. Fase I
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 23/03/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Proyectos productivos sustitutivos de productos no tradicionales en sectores claves	No. de proyectos implementados	2,00	2,00		3,00	329.896,00	329.896,00		494.844,00
estudios de factibilidad y diseño de proyectos de modernización del sector primario	No. de Estudios de Factibilidad	3,00	3,00		3,00	110.485,00	110.485,00		110.000,00
Instrumentos de Gestión para la Mitigación y Prevención del Deterioro Ambiental Implementado									
Plan de Ordenamiento territorial y ambiental de boquete	plan aprobado		1,00		1,00		353.946,00		353.946,00
Sistema de Monitoreo Ambiental y de Calidad del Agua	Sistema establecido	1,00			1,00	201.081,00	201.081,00		201.081,00
Proyectos demostrativos de Mitigación de la contaminación	No. de proyectos	2,00	2,00		2,00	79.000,00	79.000,00		79.000,00
Áreas protegidas con planes de manejo elaborados	No. de áreas protegidas	2,00	1,00		4,00	98.077,00	98.077,00		98.077,00
Proyectos de manejo e impulso del turismo ecológico en áreas protegidas	No. proyectos	2,00	2,00		2,00	525.402,00	525.402,00		525.402,00
Saneamiento Ambiental	No. de proyectos de saneamiento	5,00	5,00		5,00	503.680,00	503.680,00		503.680,00
Administración y Supervisión									
TOTAL						12.564.368,00	13.044.962,00		14.237.866,00
