



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO ENERO 2015 - JUNIO 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: EcoMicro FSF - Financiamiento Verde para la Adaptación al Cambio Climático

Nro. Proyecto: DR-M1048 - Proyecto No.: ATN/ME-14609-DR

Propósito: Estabilidad de los rendimientos agrícolas de los pequeños productores rurales a través de financiamiento y asistencia técnica para la inversión en medidas de adaptación al cambio climático

País Administrador

REPÚBLICA DOMINICANA

País Beneficiario

REPÚBLICA DOMINICANA

Agencia Ejecutora:

Fundación Sur Futuro, Inc.


Líder equipo de diseño:

GREG WATSON


Líder equipo de supervisión:

MARIANA WETTSTEIN


CICLO DEL PROYECTO




RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO

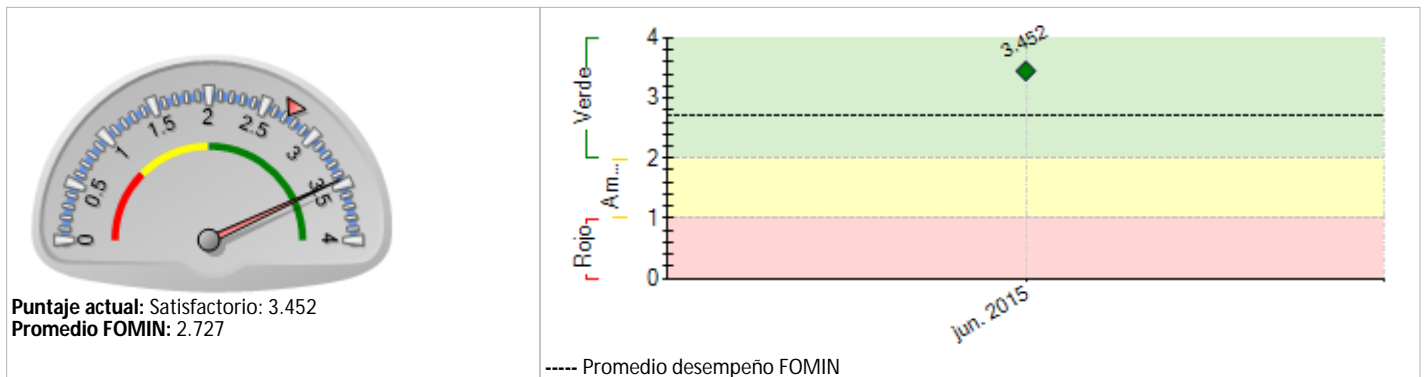

RIESGOS EXTERNOS

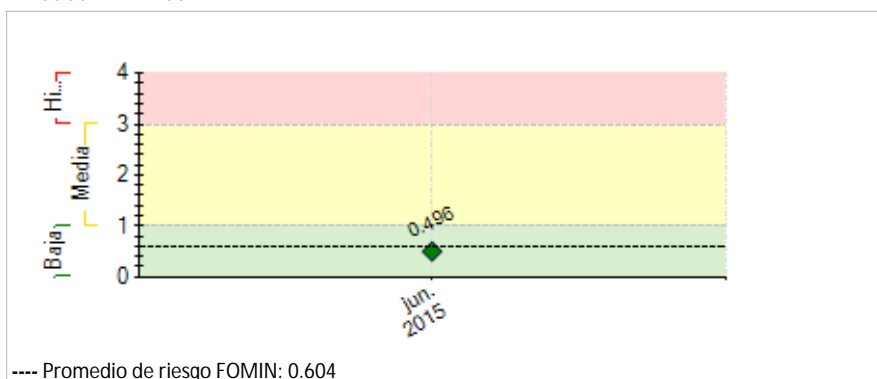

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Baja
Adquisiciones: Baja
Capacidad Técnica: Baja

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales logros alcanzados durante el semestre fueron: (i) el cumplimiento de las condiciones previas; y (ii) la contratación de la consultoría para los componentes del 2 al 5 a cargo de la firma FS.; (ii) la conformación de la lista corta en el proceso de selección para el componente de Fortalecimiento de Microcrédito. Por otro lado, se presentaron retrasos en la contratación de la firma FS por la definición de dos modalidades distintas de contratación. La razón de dicho retraso fue un proceso nuevo de implementación desde el Fomin y la definición de los productos y/o entregables que serían cubiertos con el contrato de FS-Sur Futuro y cuáles serían cubiertos desde el contrato Fomin-FS. Se hicieron varias reuniones de revisión de presupuesto, el POA y el PA y se realizaron las distribuciones de productos y componentes de acuerdo con el presupuesto a ser cubierto por cada una de las partes involucradas. Los principales obstáculos encontrados durante el semestre fueron: (i) el retraso en encontrar firmas consultoras especializadas en fortalecimiento institucional. Para solucionar estos obstáculos se realizó una publicación en el UNDB y varias firmas manifestaron interés para realizar la consultoría. El próximo semestre, la unidad coordinadora del proyecto espera lograr lo siguiente: (i) iniciar la consultoría de fortalecimiento institucional; (ii) ajustar el cronograma y los entregables con la firma FS y dar inicio a las actividades del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El inicio de las actividades sufrieron un retraso significativo de por lo menos 6 meses, ya que la contratación para la realización de los componentes 2-5 fue realizada desde el Banco, utilizando el sistema E-sourcing con la participación de Jefe de Unidad, el Especialista de Adquisiciones local, el Sector Administrativo y el equipo de supervisión FOMIN. Para el próximo semestre se espera readecuar el plan de ejecución con la firma seleccionada para acompañar a Surfuturo hasta el final de la operación e iniciar con las actividades del proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores | | Linea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planificado | Logrado | Estado |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| Propósito: Estabilidad de los rendimientos agrícolas de los pequeños productores rurales a través de financiamiento y asistencia técnica para la inversión en medidas de adaptación al cambio climático | R.1 Número de pequeños productores agrícolas que tienen acceso al producto financiero verde de adaptación al cambio climático | 0 Dic. 2014 | 20 Jun. 2015 | 60 Dic. 2015 | 140 May. 2016 | 220 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.2 Número de pequeños productores agrícolas que mantienen su rendimiento agrícola estable | 0 Dic. 2014 | | | | 220 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.3 Valor total de productos financieros verdes colocados para pequeños productores agrícolas por Fundación Sur Futuro | 0 Dic. 2014 | 17500 Jun. 2015 | 53000 Dic. 2015 | 125000 May. 2016 | 196864 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.4 Porcentaje del portafolio de créditos de Fundación Sur Futuro representado por créditos verdes | 0 Dic. 2014 | 2 Jun. 2015 | 5 Dic. 2015 | 12 May. 2016 | 18 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.5 Número de pequeños productores agrícolas que adoptan métodos productivos adaptados a los cambios de las condiciones climáticas | 0 Dic. 2014 | 20 Jun. 2015 | 60 Dic. 2015 | 140 May. 2016 | 220 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.6 Número de pequeños productores agrícolas que tienen acceso al producto financiero verde de adaptación al cambio climático | 0 Dic. 2014 | 20 Jun. 2015 | 60 Dic. 2015 | 140 May. 2016 | 220 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.7 Número de pequeños productores agrícolas que mantienen su rendimiento agrícola estable | 0 Dic. 2014 | | | | 220 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.8 Valor total de productos financieros verdes colocados para pequeños productores agrícolas por Fundación Sur Futuro | 0 Dic. 2014 | 17500 Jun. 2015 | 53000 Dic. 2015 | 125000 May. 2016 | 196864 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.9 Porcentaje del portafolio de créditos de Fundación Sur Futuro representado por créditos verdes | 0 Dic. 2014 | 2 Jun. 2015 | 5 Dic. 2015 | 12 May. 2016 | 18 Dic. 2016 | 0 | |
| | R.10 Número de pequeños productores agrícolas que adoptan métodos productivos adaptados a los cambios en las condiciones climáticas | 0 Dic. 2014 | 20 Jun. 2015 | 60 Dic. 2015 | 140 May. 2016 | 220 Dic. 2016 | 0 | |
| Componente 1: Fortalecimiento del área de microcréditos | C1.1 Diagnóstico de las necesidades de fortalecimiento institucional del área de microfinanzas de Fundación Sur Futuro. | 0 Dic. 2014 | | | | 1 Jun. 2015 | | Atrasado |
| Peso: 14% | C1.2 Reporte de implementación de ajustes necesarios en el área de microfinanzas. | 0 Dic. 2014 | | | | 1 Jun. 2015 | | Atrasado |
| Clasificación: | C1.3 Sistema de seguimiento de la cartera implementado. | 0 Dic. 2014 | | | | 1 Dic. 2015 | | |
| | C1.4 Número de empleados capacitados en los ajustes realizados al área de microfinanzas. | 0 Dic. 2014 | | | | 12 Dic. 2015 | | |
| Componente 2: Desarrollo de una política ambiental y reducción de gases de efecto invernadero | C2.1 Política ambiental institucional desarrollada | 0 Dic. 2014 | | | | 1 Jun. 2015 | | Atrasado |
| Peso: 9% | C2.2 Número de empleados de Fundación Sur Futuro capacitados en el cumplimiento de la política ambiental | 0 | | | | 88 Dic. 2015 | | |
| Clasificación: | C2.3 Diagnóstico de la eficiencia energética en las oficinas centrales (rubros aplicables) y las sucursales de Padre de las Casas y Tamayo. | 0 | | | | 1 Jun. 2015 | | Atrasado |
| Componente 3: Incorporación de la gestión del riesgo asociado al cambio climático en la cartera de préstamos | C3.1 Número de empresas que llevan a cabo una evaluación de su vulnerabilidad | 0 Dic. 2014 | | | | 1 Jun. 2015 | | Atrasado |
| Peso: 8% | C3.2 Número de instituciones microfinancieras con modelos de gestión de riesgo que incorporan el riesgo por cambio climático | 0 Dic. 2014 | | | | 1 Dic. 2015 | | |
| Clasificación: | C3.3 Número de personal de Fundación Sur Futuro capacitado en la aplicación de la herramienta de gestión de riesgo. | 0 Dic. 2014 | | | | 16 Dic. 2015 | | |
| Componente 4: Desarrollo de un producto financiero verde para la adaptación al cambio climático | C4.1 Estudio de mercado desarrollado | 0 Dic. 2014 | | | | 1 Jun. 2015 | | Atrasado |
| Peso: 66% | C4.2 Número de nuevos productos generados para beneficiar a pequeños productores agrícolas | 0 Dic. 2014 | | | | 3 Dic. 2015 | | |
| Clasificación: | C4.3 Número de pequeños productores agrícolas en el área de intervención que han sido sensibilizados sobre la necesidad de adoptar medidas de adaptación al cambio climático. | 0 Dic. 2014 | 27 Jun. 2015 | 82 Dic. 2015 | 191 May. 2016 | 300 Dic. 2016 | | Atrasado |
| | C4.4 Plan de la prueba piloto para la implementación del producto financiero verde EcoMicro. | 0 Dic. 2014 | | | | 1 Jun. 2015 | | Atrasado |
| | C4.5 Número de empleados de las agencias de Padre de las Casas | 0 | | | | 16 | | Atrasado |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|
| | y Tamayo capacitados para la prueba piloto. | Dic. 2014 | | | | Jun. 2015 | | |
| C4.16 | Reportes de ajuste intermedio y final de la prueba piloto de implementación del producto financiero verde EcoMicro. | 0 | 1 | | | 2 | | |
| | | Dic. 2014 | Dic. 2015 | | | Dic. 2016 | | |
| C4.17 | Plan de masificación finalizado. | 0 | | | | 1 | | |
| | | Dic. 2014 | | | | Dic. 2016 | | |

Componente 5: Gestión del conocimiento y comunicación estratégica

Peso: 3%

Clasificación:

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------|--|--|-----------|--|--|
| C5.11 | Estudio de caso desarrollado | 0 | | | | 1 | | |
| | | | | | | Nov. 2016 | | |
| C5.12 | Hoja de proyecto publicada | 0 | | | | 1 | | |
| | | | | | | Nov. 2015 | | |
| C5.13 | Número de talleres de difusión | 0 | 1 | | | 2 | | |
| | | | Nov. 2015 | | | Nov. 2016 | | |
| C5.14 | Número de instituciones microfinancieras a nivel nacional que participan en las actividades de difusión | 0 | | | | 20 | | |
| | | | | | | Nov. 2015 | | |
| C5.15 | Taller de cierre y sostenibilidad del proyecto | 0 | | | | 1 | | |
| | | | | | | Nov. 2016 | | |

| Hitos | Planificado | Fecha Vencimiento | Logrado | Fecha en que se logró | Estado | |
|-------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|
| H1 | Condiciones previas | 9 | Jun. 2015 | 9 | Jun. 2015 | Logrado |
| H1 | Ajustes realizados como parte del fortalecimiento institucional | 1 | Ago. 2015 | | | |
| H2 | Colocación de 20 créditos | 20 | Sep. 2015 | | | |
| H3 | Herramienta de gestión de riesgo climático | 1 | Sep. 2015 | | | |
| H5 | Ajustes intermedios al producto financiero verde | 1 | Dic. 2015 | | | |
| H4 | Colocación de 140 créditos | 140 | Jun. 2016 | | | |

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|------------------------------------|-------|---|---------------|
| 1. Programas similares subsidiados | Media | Existe también el riesgo de que el gobierno puede ofertar programas subsidiados de apoyo a los pequeños agricultores en la zona, que puede reducir la demanda para el proyecto. La probabilidad de este riesgo es bajo, y se puede mitigar, parcialmente, con una buena coordinación con el Consejo Nacional de Cambio Climático, con quien Fundación Sur Futuro tiene un acuerdo de colaboración. | Project Guest |
| 2. Baja demanda del producto | Baja | Debido a la falta de conocimiento de los beneficiarios sobre los impactos del cambio climático en sus cultivos y sobre las medidas de adaptación que pueden mitigar estos impactos, existe el riesgo de que no haya demanda suficiente para el producto financiero a desarrollar. Para minimizar este riesgo, como parte del componente IV se incluyen: (i) un análisis de la demanda de los tres productos financieros pre-identificados por la Fundación que permitirá evaluar la factibilidad de la colocación de dichos productos y (ii) actividades de sensibilización a los pequeños productores agrícolas del área de intervención en colaboración con aliados estratégicos y otras áreas de la Fundación que tienen estrecha relación con las asociaciones de productores agrícolas de la zona de intervención y que al mismo tiempo cuentan con experiencia en participación comunitaria para la identificación de vulnerabilidades al cambio climático. | Project Guest |

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El proyecto Ecomicro contempla la capacitación técnica del personal tanto en temas de cambio climático como en el sistema crediticio y producto financiero verde a utilizar. Se proveerá de acompañamiento técnico y seguimiento a los productores rurales beneficiarios de la intervención lo que garantiza la implementación adecuada de las medidas de adaptación al cambio climático y la continuidad en el uso de las mismas. Asimismo, dado que la Fundación Sur Futuro tiene presencia en la zona geográfica de la intervención, facilita la continuidad en la ejecución de las medidas de adaptación.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]
