



Operation Number: **DR-L1047**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/23/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/23/2015**
Division Chief validation date: **10/26/2015**
Country Representative validation date: **11/03/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support to the Social Protection Program - Third Fase	Loan Number:	2623/OC-DR
Executing Agency (EA):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA		
Team Leader:	Parodi,Sandro	Sector/Subsector:	IS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1047	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1047	\$80,000,000.00	\$47,751,000.00	59.69%	\$32,249,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

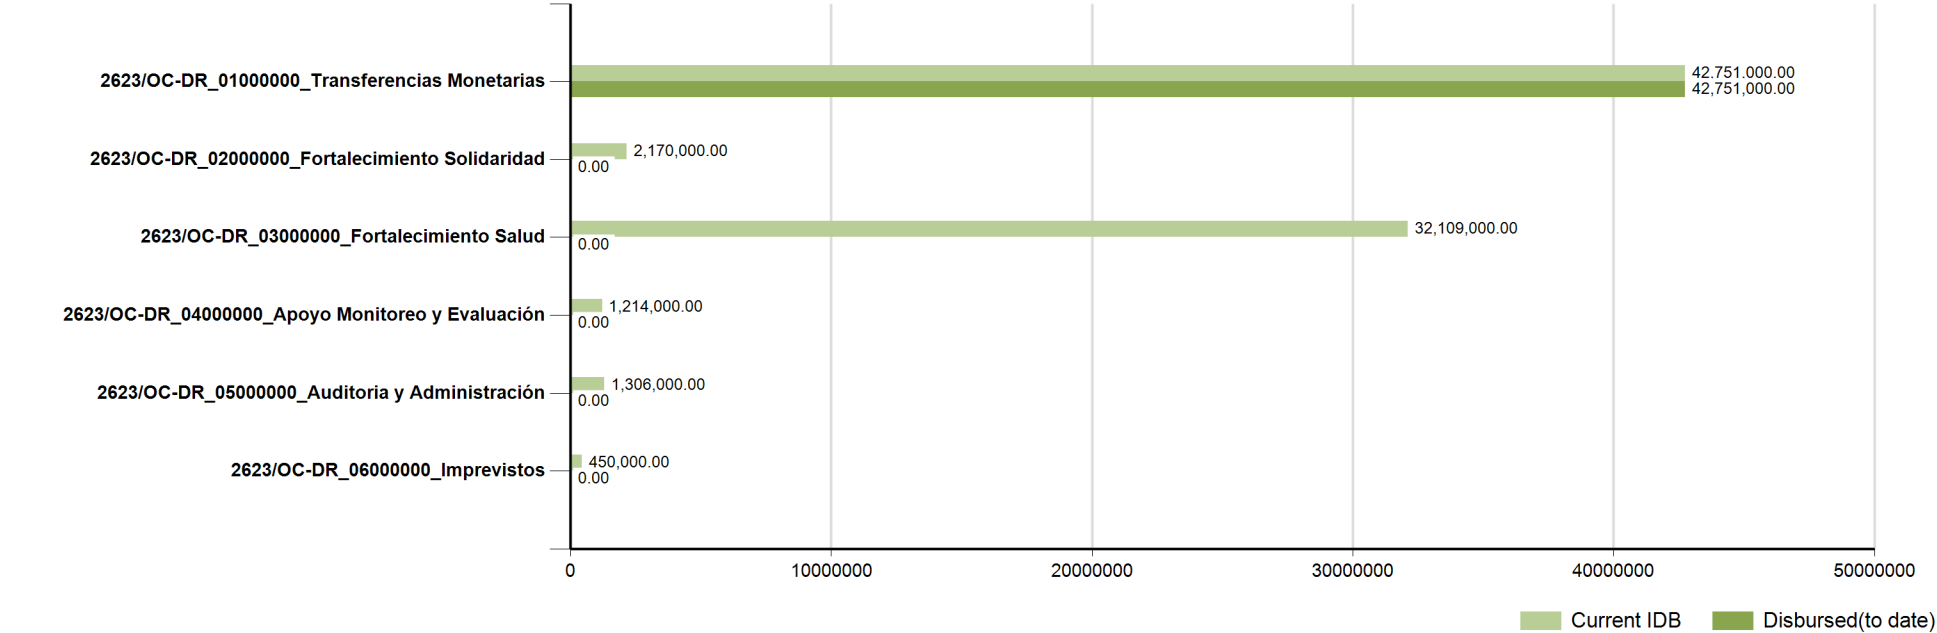

Impacts

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Output:	1 Los hogares beneficiarios del programa Solidaridad incrementan su demanda por los servicios de nutrición, salud y educación
----------------	---

[illegible]

1.4 Porcentaje de mujeres que durante su último embarazo tomaron pastillas de ácido fólico, hierro y vitaminas o suplementos y no pagaron por ellas		Porcentaje	10.80	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P		20.00
							P(a)		20.00
							A		
Outcome:	2 Mejora el seguimiento que hace Solidaridad a los hogares beneficiarios para propiciar el cumplimiento de las condicionalidades								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		
2.1 Proporción de hogares que conocen las corresponsabilidades de Solidaridad		Porcentaje	0.00	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	90.00	
							P(a)	90.00	
							A		
Outcome:	3 Mejora la calidad de los servicios de salud a los que acceden los beneficiarios de Solidaridad								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		
3.1 Porcentaje de beneficiarios de Solidaridad que asiste a UNAPs habilitadas		Porcentaje	21.80	2011	Informes Semestrales		P	55.00	
							P(a)	55.00	
							A		
3.2 Porcentaje de médicos que proveen servicios de salud siguiendo las guías y protocolos de atención materno-infantil		Porcentaje	8.00	2011	Informes Semestrales		P	50.00	
							P(a)	50.00	
							A		
3.3 Porcentaje del personal de salud del primer nivel que conoce al menos un 80% de los contenidos de las guías y protocolos de atención materno-infantil		Porcentaje	13.20	2011	Informe Semestral		P	60.00	
							P(a)	60.00	
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Transferencias condicionadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Número de personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación.	Personas	P		755,998.20	P		47,501,000.00
		P(a)	0.00	755,998.20	P(a)	0.00	42,750,000.00
		A	0.00	755,998.20	A	0.00	42,750,000.00
Fortalecimiento institucional de Solidaridad		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Estrategia de comunicación dirigida a mejorar el conocimiento de las corresponsabilidades implementada	Estrategia	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	113,001.00	638,001.00
		A	0.00	0.00	A	194.66	50,509.10
Sistema automatizado de planificación, seguimiento y supervisión efectiva de los enlaces comunitarios implementado	Sistema	P		1.00	P		520,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	525,000.00	1,545,000.00
		A	0.00	0.00	A	840.36	20,840.36
Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Personal del nivel gerencial y de coordinación de los Sistemas Regionales de Salud (SRS) capacitado en Sistemas de Gestión	personas	P		240.00	P		1,000,000.00
		P(a)	0.00	230.00	P(a)	171,150.00	518,150.00
		A	0.00	230.00	A	0.00	347,000.00
Personal del primer nivel de atención capacitados en protocolos	personas	P		1,545.00	P		473,000.00
		P(a)	1,026.00	1,026.00	P(a)	10,000.00	285,000.00
		A	2,230.00	2,230.00	A	129,617.15	404,617.15
Déficits en equipamientos médicos cubiertos	Equipamiento	P		1.00	P		4,000,000.00
		P(a)	20.00	105.00	P(a)	1,900,000.00	8,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Centros de atención primaria con infraestructura rehabilitada	Centros	P		1.00	P		0.00
		P(a)	20.00	105.00	P(a)	1,973,475.04	9,134,240.71
		A	0.00	0.00	A	42,345.41	42,345.41
Modelo de atención primaria implementado	Implementacion	P		1.00	P		12,230,558.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	1,730,677.68	4,782,438.68
		A	0.00	0.00	A	488,351.26	540,112.26
Laboratorios del Primer Nivel de Atención Fortalecidos	Laboratorios	P		1.00	P		3,009,100.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Banco Nacional de Sangre fortalecido	Banco de sangre	P		1.00	P		3,722,125.00
		P(a)		0.00	P(a)	500,000.00	7,827,260.04
		A	0.00	0.00	A	0.00	105,135.04
Ente Gestor de los servicios de salud consolidado	Proyecto	P		1.00	P		2,964,656.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Intervención de prevención del embarazo adolescente implementado	Intervención	P		1.00	P		250,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	271,000.00	1,335,674.17
		A	0.00	0.00	A	52,378.13	117,052.30
Personal de atención (Enfermeras) del nivel primario capacitado en sistemas de gestión en salud	Personas	P		1.00	P		1,457,220.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	45,477.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	45,477.00

Sistema de Gestion Clinica Ampliado	sistema	P		1.00	P		1,006,633.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		168,759.40
		A	0.00	0.00	A	0.00	168,759.40
Evaluaciones		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Evaluación de Impacto: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social (EEPS) realizada	Evaluación	P		1.00	P		1,000,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación del sistema de gestión clínica y hospitalaria realizada	Evaluación	P		1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación del sistema georeferenciado del mapa de oferta de servicios de salud realizada	Evaluación	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	50,000.00
Evaluación de la capacitación de niveles gerenciales de los Sistemas Regionales de Salud realizada	Evaluación	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	30,000.00	380,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación de la implementación del diplomado a nivel nacional realizada	Evaluación	P		1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		434,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación del Plan Piloto de intervención de la prevención del embarazo realizada	Evaluación	P		1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	350,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Auditorías							
Imprevistos							

Other Cost		2015	Cost
Auditoría Financiera y Gastos Administrativos	P		\$555,708.00
	P(a)	\$350,000.00	\$1,103,740.69
	A	\$0.00	\$112,338.16
Consultorías y adquisiciones varias	P		\$0.00
	P(a)	\$0.00	\$442,393.10
	A	\$0.00	\$442,393.10
Auditoría recurrente	P		\$200,000.00
	P(a)	\$0.00	\$209,865.21
	A	\$0.00	\$209,865.21
Total Cost		2015	Total Cost
	P		\$80,000,000.00
	P(a)	\$7,574,303.72	\$73,139,423.25
	A	\$713,726.97	\$45,406,444.49

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Ente Gestor de los servicios de salud consolidado	Inactivate Output	Se acordo con el gobierno inactivar este producto debido a los retrasos que hubo para la aprobacion de la ley que creaba el Ente Gestor.	10/16/2015	2/16/2015

Output	Laboratorios del Primer Nivel de Atención Fortalecidos	Inactivate Output	Se acuerdo con el gobierno inactivar este producto para dar prioridad al fortalecimiento de la cadena de frio a nivel nacional.	10/16/2015	2/16/2015
--------	--	-------------------	---	------------	-----------

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
