



Operation Number: **DR-L1047**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/17/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support to the Social Protection Program - Third Fase	Loan Number:	2623/OC-DR
Executing Agency (EA):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA		
Team Leader:	Parodi,Sandro	Sector/Subsector:	IS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	DOMINICAN REPUBLIC
Borrower:	REPUBLICA DOMINICANA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
DR-L1047	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$0.00		\$80,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
DR-L1047	\$80,000,000.00	\$76,823,382.44	96.03%	\$3,176,617.56


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

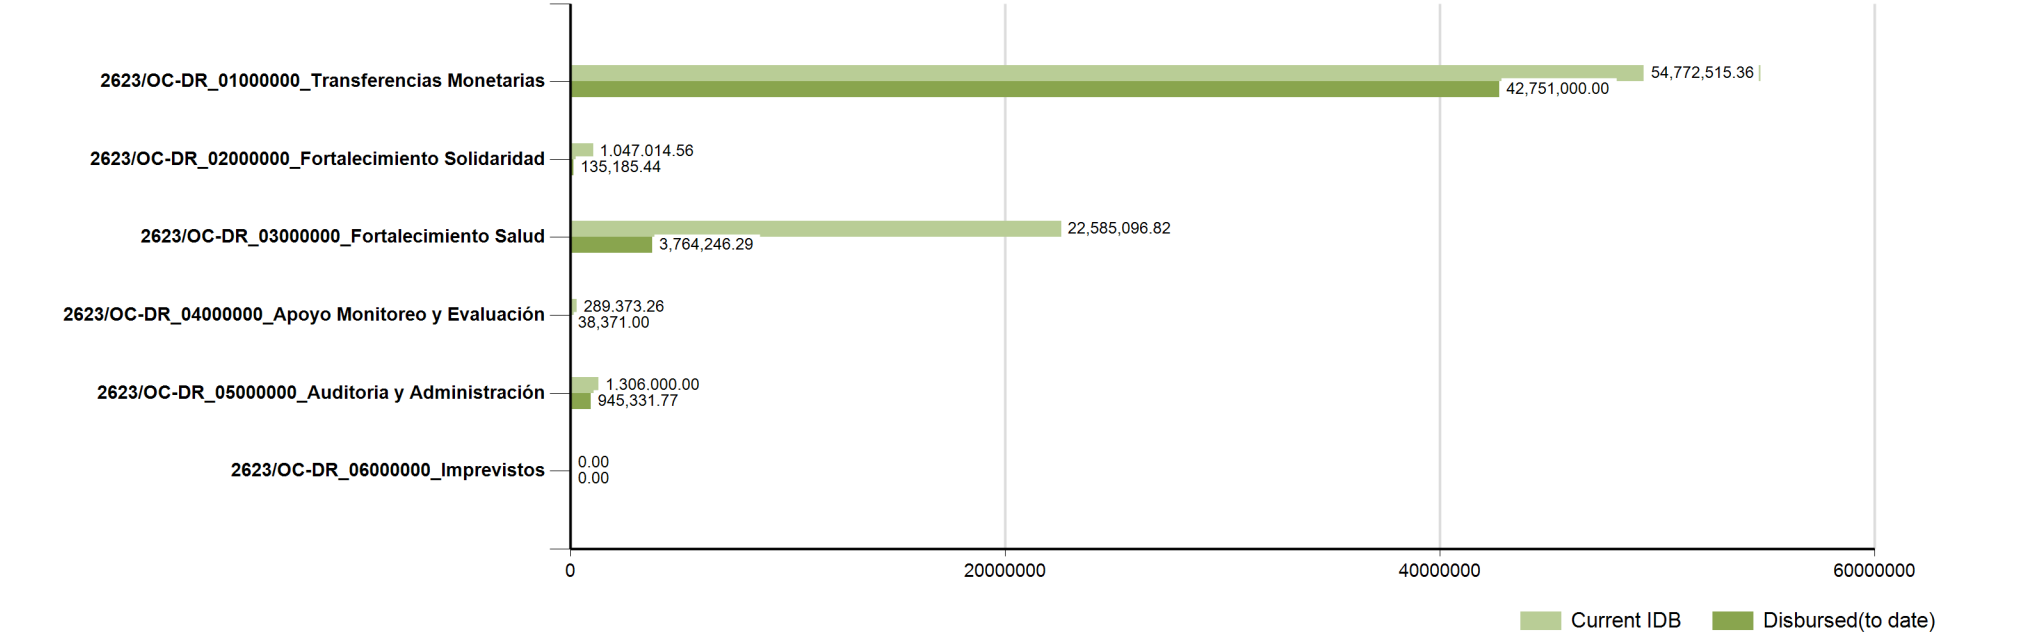

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Niños y niñas beneficiarios de Solidaridad tienen menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Prevalencia de desnutrición crónica de niños(as) de 0-2 años en hogares beneficiarios de Solidaridad		Porcentaje	10.10	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	9.80
							P(a)	9.80
							A	
1.2 Estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad		Centímetros	101.10	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	102.00
							P(a)	102.00
							A	
1.3 Niños(as) de entre 18 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunación completa		Porcentaje	28.50	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	35.00
							P(a)	35.00
							A	
1.4 Niños(as) de entre 14 y 16 años en hogares Solidaridad que terminaron al menos seis grados de educación básica		Porcentaje	73.93	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	76.00
							P(a)	76.00
							A	



RF - Alignment



 RF - Strategic Alignment



 RF - Strategic Alignment during Execution



 CI - Country Indicator



 PE - Pro-Ethnicity



Outcomes

Outcome:	1 Los hogares beneficiarios del programa Solidaridad incrementan su demanda por los servicios de nutrición, salud y educación							
Observation:	El seguimiento a las condicionalidades ha sido una de las debilidades del programa desde su inicio. El banco ha incluido acciones destinadas a superar esta debilidad en el componente 2 de la segunda fase de este préstamo multifase (desarrollo del sistema)							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Porcentaje de mujeres que llevaron al niño al menos a un control en el centro de salud		Porcentaje	56.80	2011	EEPS 2012, EEPS2013		P	69.00
							P(a)	69.00
							A	
1.2 Porcentaje de mujeres que se les recetó y tomaron vitaminas o micronutrientes en las seis semanas siguientes al parto		Porcentaje	44.00	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	55.00
							P(a)	55.00
							A	

1.3 Porcentaje de mujeres con un hijo de 0 a 5 años que acudieron a un control en las seis semanas siguientes al parto		Porcentaje	44.60	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	55.00
							P(a)	55.00
							A	
1.4 Porcentaje de mujeres que durante su último embarazo tomaron pastillas de ácido fólico, hierro y vitaminas o suplementos y no pagaron por ellas		Porcentaje	10.80	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	20.00
							P(a)	20.00
							A	

Outcome: [2 Mejora el seguimiento que hace Solidaridad a los hogares beneficiarios para propiciar el cumplimiento de las condicionalidades](#)

Observation:




Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Proporción de hogares que conocen las responsabilidades de Solidaridad		Porcentaje	0.00	2011	EEPS 2012, EEPS 2013		P	90.00
							P(a)	90.00
							A	

Outcome: [3 Mejora la calidad de los servicios de salud a los que acceden los beneficiarios de Solidaridad](#)

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Porcentaje de beneficiarios de Solidaridad que asiste a UNAPs habilitadas		Porcentaje	21.80	2011	Informes Semestrales		P	55.00
							P(a)	55.00
							A	
3.2 Porcentaje de médicos que proveen servicios de salud siguiendo las guías y protocolos de atención materno-infantil		Porcentaje	8.00	2011	Informes Semestrales		P	50.00
							P(a)	50.00
							A	

3.3 Porcentaje del personal de salud del primer nivel que conoce al menos un 80% de los contenidos de las guías y protocolos de atención materno-infantil							P	60.00
							P(a)	60.00
							A	
		Porcentaje	13.20	2011	Informe Semestral			

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Transferencias condicionadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Número de personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación.	Beneficiaries (#)	P		755,998.20	P		47,501,000.00
		P(a)	159,716.41	915,714.61	P(a)	12,022,515.36	54,772,515.36
		A	0.00	755,998.20	A	0.00	42,750,000.00
Fortalecimiento institucional de Solidaridad		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Estrategia de comunicación dirigida a mejorar el conocimiento de las corresponsabilidades implementada	Estrategia	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	446,854.01	836,467.00
		A	0.00	0.00	A	772.34	104,385.33
Sistema automatizado de planificación, seguimiento y supervisión efectiva de los enlaces comunitarios implementado	Sistema	P		1.00	P		520,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	11,987.39	210,547.56
		A	0.00	0.00	A	19,606.63	104,813.99
Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Personal del nivel gerencial y de coordinación de los Sistemas Regionales de Salud (SRS) capacitado en Sistemas de Gestión	personas	P		240.00	P		1,000,000.00
		P(a)		230.00	P(a)	0.00	575,768.99
		A	0.00	230.00	A	0.00	575,768.99
Personal del primer nivel de atención capacitados en protocolos	personas	P		1,545.00	P		473,000.00
		P(a)		1,056.00	P(a)	49,048.76	442,005.48
		A	0.00	1,056.00	A	24,032.66	416,989.38
Déficits en equipamientos médicos cubiertos	Equipamiento	P		1.00	P		4,000,000.00
		P(a)	105.00	105.00	P(a)	3,179,360.40	3,830,227.84
		A	0.00	0.00	A	42,006.29	692,873.73
Centros de atención primaria con infraestructura rehabilitada	Centros	P		1.00	P		0.00
		P(a)	105.00	105.00	P(a)	4,368,206.82	7,562,790.80
		A	52.00	52.00	A	1,392,020.79	4,586,604.77
Modelo de atención primaria implementado	Implementacion	P		1.00	P		12,230,558.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,540,466.37	2,872,662.35
		A	0.00	0.00	A	0.00	775,617.54
Laboratorios del Primer Nivel de Atención Fortalecidos	Laboratorios	P		1.00	P		3,009,100.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Banco Nacional de Sangre fortalecido	Banco de sangre	P		1.00	P		3,722,125.00
		P(a)		1.00	P(a)	2,325,546.00	6,386,027.92
		A	0.00	0.00	A	903,839.30	1,016,778.03
Ente Gestor de los servicios de salud consolidado	Proyecto	P		1.00	P		2,964,656.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Intervención de prevención del embarazo adolescente implementado	Intervención	P		1.00	P		250,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	468,322.46	668,298.47
		A	0.00	0.00	A	55,866.21	239,929.89
Personal de atención (Enfermeras) del nivel primario capacitado en sistemas de gestión en salud	Personas	P		1.00	P		1,457,220.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	45,477.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	45,477.00

Sistema de Gestion Clinica Ampliado	sistema	P		1.00	P		1,006,633.00
		P(a)		0.00	P(a)	0.00	201,837.97
		A	0.00	0.00	A	0.00	201,837.97
Evaluaciones		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Evaluación de Impacto: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social (EEPS) realizada	Evaluación	P		1.00	P		1,000,000.00
		P(a)		0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	45,279.35	45,279.35
Evaluación del sistema de gestión clínica realizada	Evaluación	P		1.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	30,902.78	41,430.86
		A	0.00	0.00	A	0.00	10,528.08
Evaluación del sistema georeferenciado del mapa de oferta de servicios de salud realizada	Evaluación	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)		0.00	P(a)	0.00	50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	50,000.00
Evaluación de la capacitación de niveles gerenciales de los Sistemas Regionales de Salud realizada	Evaluación	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	50,000.00	50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación de la implementación del diplomado a nivel nacional realizada	Evaluación	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	47,942.40	52,663.05
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación del Plan Piloto de intervención de la prevención del embarazo realizada	Evaluación	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2016	Cost
Auditoría Financiera y Gastos Administrativos	P		\$555,708.00
	P(a)	\$148,458.45	\$653,741.69
	A	\$72,029.02	\$577,312.26
Consultorías y adquisiciones varias	P		\$0.00
	P(a)	\$0.00	\$442,393.10
	A	\$0.00	\$442,393.10
Auditoría recurrente	P		\$200,000.00
	P(a)	\$0.00	\$209,865.21
	A	\$0.00	\$209,865.21
Total Cost		2016	Total Cost
	P		\$80,000,000.00
	P(a)	\$24,689,611.20	\$79,954,720.65
	A	\$2,555,452.59	\$52,846,454.62

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
