



Operation Number: **ES-L1027**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/15/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/28/2016**
Division Chief validation date: **04/01/2016**
Country Representative validation date: **04/05/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Integrated Health Program	Loan Number:	2347/OC-ES
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD		
Team Leader:	Sanchez,Maria Deni	Sector/Subsector:	SA
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1027	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$22,700,000.00	\$0.00	\$82,700,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1027	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

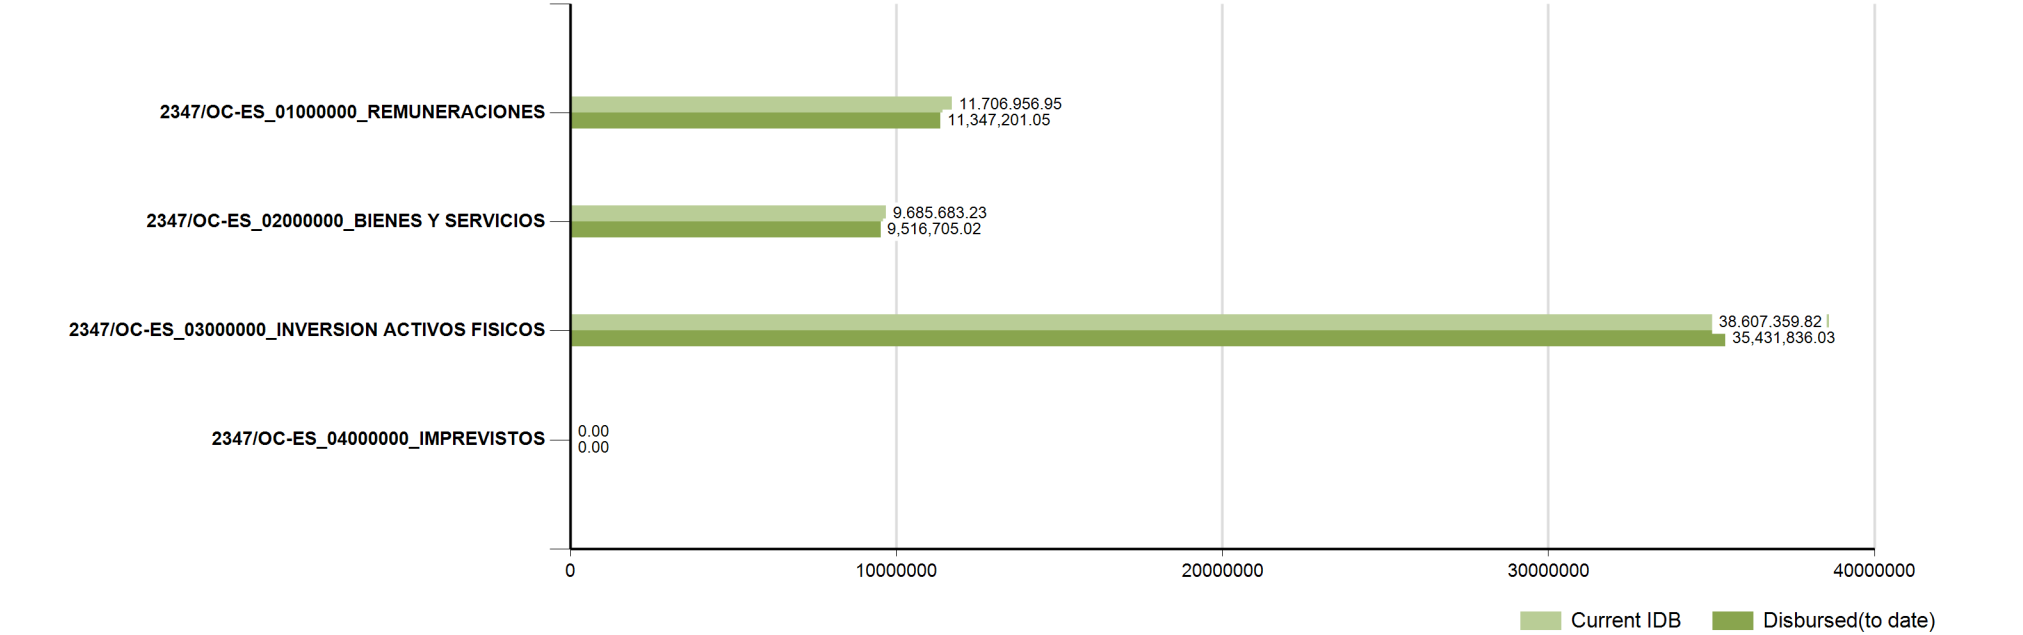

Results Matrix

Impacts


Impact:	1 Mejorar la situación de salud de la población de El Salvador							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Razón de mortalidad materna a nivel nacional		Razón	57.70	2009	Fuente: Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria).	Supuestos: - Se mantiene la política pública de fomento a los Equipos de Salud Familiares y Especializados s.	P	52.00
						- Personas y comunidades aceptan los servicios de salud.	P(a)	52.00
						- Población acepta el parto hospitalario.	A	
1.2 Tasa de mortalidad perinatal a nivel nacional		Tasa	19.00	2009	Fuente: Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria).	Supuestos: - Se mantiene la política pública de fomento a los Equipos de Salud Familiares y Especializados s.	P	15.00
						- Personas y comunidades aceptan los servicios de salud.	P(a)	15.00
						- Población acepta el parto hospitalario.	A	
1.3 Tasa de mortalidad infantil a nivel nacional		Tasa	16.00	2009	Fuente: Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria).	Supuestos: - Se mantiene la política pública de fomento a los Equipos de Salud Familiares y Especializados s.	P	13.00
						- Personas y comunidades aceptan los servicios de salud.	P(a)	13.00
						- Población acepta el parto hospitalario.	A	

Outcomes

Outcome:	1 Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
1.1 Porcentaje de familias adscritas por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F), en las áreas apoyadas por el Programa Integrado de Salud en los departamentos de intervención		%	0.00	2009	Lista de familias asignadas a Equipos de Salud Fam., donde se cuenta con esta información y Proyecciones (DIGESTYC) donde no se cuenta con la misma.	Supuestos: - Personas y comunidades aceptan los servicios de salud.	P	25.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00
						P(a)	25.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
						A	25.00	82.50	90.00	94.00	94.00		

1.2 Cobertura de niños y niñas de 1 año vacunados con Sarampion, Paperas y Rubeola (SPR) en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarois de Salud familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención		%	90.00	2009	Fuente: Informe de la unidad de informaci3n de la salud (Direcci3n de Vigilancia Sanitaria).	Supuest o: - 100% de la poblaci3n acepta la vacunaci3n. - Se utiliza poblaci3n seg3n levanta miento de ficha familiar.	P	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
							P(a)	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
							A	90.00	98.00	95.00	95.00	98.00	
1.3 Cobertura de niños y niñas menores de 1 año inscritos en control infantil, en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención		%	56.00	2009	Fuente: Informe de la unidad de informaci3n de la salud (Direcci3n de Vigilancia Sanitaria).	Supuest o: - 100% de la poblaci3n acepta los servicios . - Se utiliza poblaci3n seg3n levanta miento de ficha familiar.	P	56.00	65.00	75.00	85.00	95.00	95.00
							P(a)	56.00	65.00	75.00	85.00	95.00	95.00
							A	56.00	65.00	75.00	88.00	90.00	
1.4 Cobertura de embarazadas inscritas en atenci3n prenatal, en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervenci3n		%	56.00	2009	Fuente: Informe de la unidad de informaci3n de la salud (Direcci3n de Vigilancia Sanitaria).	Supuest o: Se mantiene la fecundidad y la tasa de planificaci3n familiar.	P	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	95.00
							P(a)	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	95.00
							A	60.00	90.00	80.00	82.00	86.00	

1.5 Proporción de atenciones preventivas en relación al total de atenciones		%	15.00	2009	Fuente: Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria).	Supuest	P	20.00	25.00	30.00	35.00	60.00	60.00
						o: - Increme	P(a)	20.00	25.00	30.00	35.00	60.00	60.00
						nto en las	A	20.00	33.00	30.00	41.50	47.20	
						atencion es preventi vas. - La població n aplica las recomen dacione s del personal de salud.							
1.6 Porcentaje de referencias del Primer Nivel atendidas en el Segundo Nivel de Atención		%	0.00	2000	Fuente: Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria).	Supuest	P	20.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00
						o: - Se impleme nta el Sistema de informac ión de Referen cia y Retorno. - Cumplim iento de la normativ a de referenci a, retorno e intercon sulta.	P(a)	20.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00
							A	20.00	0.00	50.00	57.00	72.00	
1.7 Personas que se benefician de un paquete básico de salud		Personas	0.00	2000	Informe de la Unidad de Informació n de la Salud.		P	103,949.00	379,806.00	379,806.00	379,806.00	379,806.00	379,806.00
							P(a)	103,949.00	379,806.00	379,806.00	379,806.00	379,806.00	379,806.00
							A	103,949.00	766,263.00	379,806.00	766,263.00	766,263.00	
1.8 Porcentaje de embarazadas con al menos 4 controles prenatales, en las áreas cubiertas por los Equipos Comunitarios de Salud familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención		%	58.90	2010	Fuente: Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria).	Supuest	P	60.70	62.00	65.00	70.00	75.00	75.00
						o: Se mantien e la fecundid ad y la tasa de planifica ción familiar.	P(a)	60.70	62.00	65.00	70.00	75.00	75.00
							A		61.00	65.00	70.20	72.50	

1.9 Concentración de controles de atención prenatal según normas nacionales en la población cubierta por los Ecos Familiares apoyados por el PRIDES en los departamentos de intervención		Concentra ción	5.70	2010	Fuente: Informe de la unidad de informaci n de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria)	Supuest o: Se mantien e la fecundid ad y la tasa de planifica ción familiar.	P	5.80	5.90	6.00	6.00	6.00	6.00
	P(a)						5.80	5.90	6.00	6.00	6.00	6.00	
	A						5.80	6.80	6.00	6.60	6.00		
Outco me:	2 Ministerio de Salud fortalecido, a través del desarrollo del Sistema de Información en Salud, Sistema de Emergencias Médicas y el fortalecimiento de la Red de Laboratorios												
Observ ation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
2.1 Porcentaje de variación de la producción de hematócrito año 2013 en relación con la producción de hematócrito año 2011		%	0.00	2011	Sistema Estadístico de Producción de Servicios.	En 2011, se realizaro n 234,292 examen es de hemato crito; el porcenta je de variació n anual se indica en las metas.	P			3.00	7.00	10.00	10.00
	P(a)								3.00	7.00	10.00	10.00	
	A								3.00	14.80	32.67		
2.2 Porcentaje de variación de la producción de pruebas de creatinina año 2013 en relación con el año 2011		%	0.00	2011	Sistema Estadístico de Producción de Servicios.	En 2011, se realizaro n 29,075 pruebas de creatinin a; el porcenta je de variació n anual se indica en las metas.	P			3.00	7.00	10.00	10.00
	P(a)								3.00	7.00	10.00	10.00	
	A								3.00	531.30	137.21		

2.3 Razón de mortalidad hospitalarias en las primeras 48 horas de atención en los Hospitales priorizados		Razón	46.00	2010	Sistema de Morbimortalidad.	Implementación del Servicio de Emergencias médicas en su primera etapa. Equipamiento e insumos completo para su funcionamiento. CONAS EM apoyando el funcionamiento del Sist. Emergencias Médicas . Población acepta y realiza buen uso del Servicio de Emergenci	P			44.00	42.00	40.00	40.00
	P(a)								44.00	42.00	40.00	40.00	
	A								44.00	42.20	44.67		

2.4 Mortalidad debida a lesiones de causa externa en los Hospitales priorizados		Tasa	8.00	2010	Sistema de Morbimortalidad.	Impleme	P			7.80	7.50	7.20	7.20
						ntación del	P(a)			7.80	7.50	7.20	7.20
						Servicio de	A			7.80	3.96	4.55	
						Emerge							
						ncias							
						médicas							
						en su							
						primera							
						etapa.							
						Equipam							
						iento e							
						insumos							
						complet							
						o para							
						su							
						funciona							
						miento.							
						CONAS							
						EM							
						apoyand							
						o el							
						funciona							
						miento							
						del Sist.							
						Emerge							
						ncias							
						Médicas							
						.							
						Població							
						n acepta							
						y realiza							
						buen							
						uso del							
						Servicio							
						de							
						Emerge							
						nci							

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas según la norma	Unidades de Salud	P	0.00	28.00	P	0.00	5,961,499.00
		P(a)	5.00	32.00	P(a)	1,266,910.91	7,499,344.90
		A	5.00	32.00	A	1,037,892.31	7,416,087.20
Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas según la norma	Unidades de Salud	P		9.00	P		3,967,609.00
		P(a)		9.00	P(a)	6,000.00	3,928,920.38
		A		10.00	A	2,940.27	3,925,860.65
Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión y de provision de servicios de las Redes Integradas de Servicios de Salud en Atención Primaria en Salud (RISS-APS)	Personas	P	400.00	1,910.00	P	265,838.00	981,955.00
		P(a)	1,450.00	3,608.00	P(a)	643,214.55	1,212,289.47
		A	1,450.00	3,608.00	A	622,296.50	1,191,371.42
Foros de participación social en salud realizados	Foros	P	14.00	47.00	P	0.00	100,000.00
		P(a)	13.00	42.00	P(a)	86,788.39	94,541.22
		A	22.00	51.00	A	75,426.36	88,637.97
Unidades Comunitarias de Salud Familiar rehabilitadas	Unidades de Salud	P		18.00	P		2,014,046.00
		P(a)		19.00	P(a)		2,151,588.90
		A		19.00	A		2,056,769.74
Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando según la norma	Equipos	P	45.00	45.00	P	4,109,062.50	20,655,000.00
		P(a)	45.00	45.00	P(a)	2,286,000.00	17,309,749.03
		A	45.00	45.00	A	2,286,000.00	15,223,349.03
Componente II: Fortalecimiento del MSPAS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Ambulancias (medicalizadas y básicas) operantes	Ambulancias	P	0.00	17.00	P	267,705.00	2,369,000.00
		P(a)	3.00	16.00	P(a)	160,000.00	546,693.95
		A	3.00	3.00	A	177,656.40	217,656.40
Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo A)	Hospitales	P		30.00	P		13,912,615.00
		P(a)		18.00	P(a)		7,147,172.38
		A		30.00	A		6,330,903.78
Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo B)	Hospitales	P		0.00	P		0.00
		P(a)	5.00	26.00	P(a)	2,408,901.61	6,744,534.91
		A	4.00	29.00	A	783,264.17	5,349,416.96
Establecimientos de Salud con sistema de información operando	Establecimientos	P	136.00	136.00	P	1,697,781.50	5,384,001.00
		P(a)		154.00	P(a)	584,892.99	1,922,463.79
		A	40.00	154.00	A	424,336.56	1,737,638.89
Recurso humano contratado y capacitado para el componente prehospitalario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)	Personas	P	243.00	243.00	P	2,473,700.00	7,394,800.00
		P(a)	44.00	44.00	P(a)	552,147.90	1,757,911.99
		A	44.00	44.00	A	547,999.00	1,208,955.99
Centro Coordinador Sistema de Emergencias Médicas (SEM), funcionando	Establecimiento	P		1.00	P		2,500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	121,978.88	2,869,666.59
		A		1.00	A	0.00	2,747,687.71
Recurso humano contratado para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Único de Información en Salud (SUIS)	Personas	P	42.00	42.00	P	539,000.00	2,008,378.58
		P(a)	42.00	42.00	P(a)	570,120.00	2,478,116.74
		A	42.00	42.00	A	570,120.00	1,907,996.74
Unidades comunitarias -cabezas de micro red- y Hospitales fortalecidos con equipo básico de laboratorio clínico	Unidades de Salud	P		19.00	P		247,000.00
		P(a)		112.00	P(a)	132,237.39	2,643,513.06
		A		112.00	A	117,537.33	2,423,392.09

Laboratorios de microbiología implementados en hospitales de segundo nivel de la red de servicios	Laboratorios	P		5.00	P		190,000.00
		P(a)		5.00	P(a)	33,372.60	174,998.55
		A		5.00	A	28,216.26	169,842.21
Laboratorios Clínicos Regionales fortalecidos y funcionando en red	Laboratorios	P	5.00	5.00	P	387,250.00	2,814,696.00
		P(a)		6.00	P(a)	100,502.19	949,394.73
		A	0.00	6.00	A	100,426.25	949,318.79
Recurso humano contratado y capacitado para las redes de Laboratorio Clínicos fortalecidos	Personas	P	36.00	36.00	P	314,343.68	1,414,546.02
		P(a)	34.00	34.00	P(a)	253,700.00	1,270,298.03
		A	34.00	34.00	A	253,700.00	1,016,598.03
Remodelación y amueblamiento de servicios hospitalización en 5 hospitales priorizados	Hospitales	P		1.00	P		6,100,000.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	2,406,096.19	3,853,001.74
		A	1.00	6.00	A	1,495,891.13	2,905,043.11
Recurso humano usuario del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) capacitado en el funcionamiento del sistema	Personas	P	210.00	570.00	P	0.00	626,021.42
		P(a)	500.00	2,193.00	P(a)	63,841.50	125,201.43
		A	1,233.00	2,926.00	A	0.00	69,740.98
Remodelacion y amueblamiento de instalaciones MINSAL: Edificio F, archivo UACI, edificio UACI	Edificio	P		0.00	P		0.00
		P(a)		3.00	P(a)		394,690.81
		A		3.00	A		389,385.48

Other Cost		2015	Cost
Políticas y Normas Emitidas y Cumplidas	P	\$50,000.00	\$300,000.00
	P(a)		\$81,602.15
	A	\$0.00	\$76,602.15
Gastos de ejecución	P	\$439,250.00	\$2,989,924.47
	P(a)	\$953,146.28	\$2,558,164.60
	A	\$316,373.77	\$2,239,569.61
Imprevistos	P	\$173,000.00	\$814,000.00
	P(a)		\$234,000.00
	A		\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$10,716,930.68	\$82,745,091.49
	P(a)	\$12,629,851.38	\$66,641,277.32
	A	\$8,840,076.31	\$59,641,824.93

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Recurso humano usuario del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) capacitado en el funcionamiento del sistema	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Remodelación y amueblamiento de servicios hospitalización en 5 hospitales priorizados	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Recurso humano contratado y capacitado para las redes de Laboratorio Clínicos fortalecidos	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Unidades comunitarias -cabezas de micro red- y Hospitales fortalecidos con equipo básico de laboratorio clínico	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016

Output	Recurso humano contratado para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Unico de Información en Salud (SUIS)	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Recurso humano contratado y capacitado para el componente prehospitario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Establecimientos de Salud con sistema de información operando	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo B)	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Ambulancias (medicalizadas y básicas) operantes	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando según la norma	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Foros de participación social en salud realizados	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas según la norma	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo B)	Modify Physical P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Ambulancias (medicalizadas y básicas) operantes	Modify Physical P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Remodelacion y amueblamiento de instalaciones MINSAL: Edificio F, archivo UACI, edificio UACI	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo A)	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Unidades Comunitarias de Salud Familiar rehabilitadas	Modify Financial P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo A)	Modify Physical P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016
Output	Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas según la norma	Modify Physical P(a) value	Se extendió la fecha de último desembolso a octubre de 2016. En este ejercicio de revisión del PMR, se replanifica la porción que se ejecutará con fondos BID durante 2016 y lo que se ejecutará con fondos de contrapartida.	3/4/2016	2/24/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
