
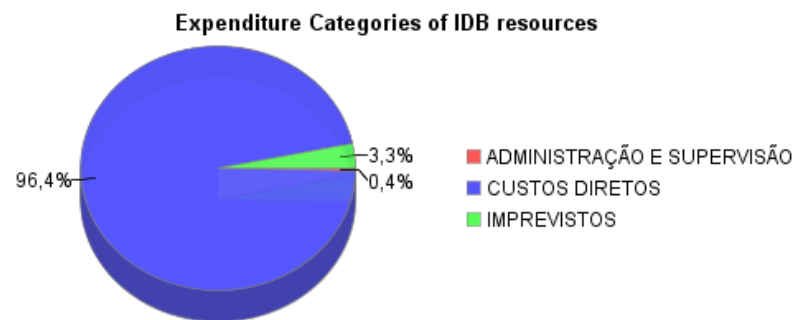



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):					
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Loan Number(s):	2308/OC-BR	Current Approved Amount:	16.951.000,00	Original IDB:	16.951.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	847.000,00	Current IDB:	16.951.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	5,00	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	BR-X1005, BR-L1174	Balance:	16.104.000,00	Co-Financing/Country:	1.787.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	18.738.000,00
				Amortization Period (months):	186

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 21, 2011 Validated by Country Representative: Apr 24, 2011

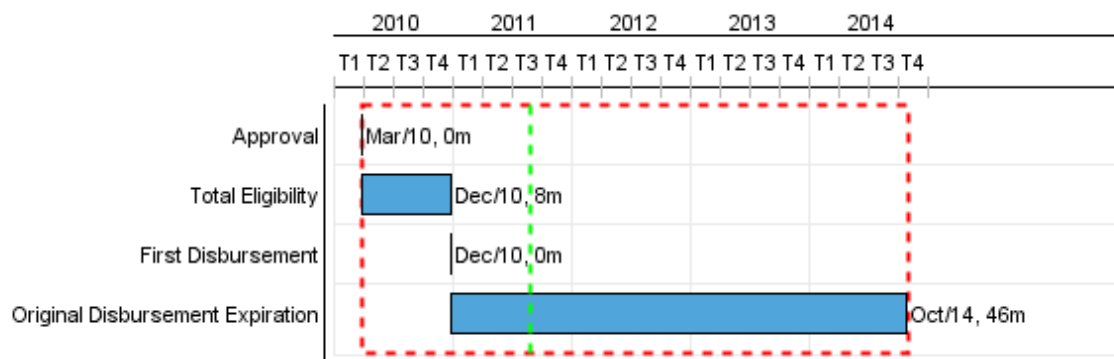


Accumulated Progress as of 2010



PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1238 - PROFISCO-State of Piauí Fiscal Management Development and Improvement Project
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Last Update: 16/03/2011

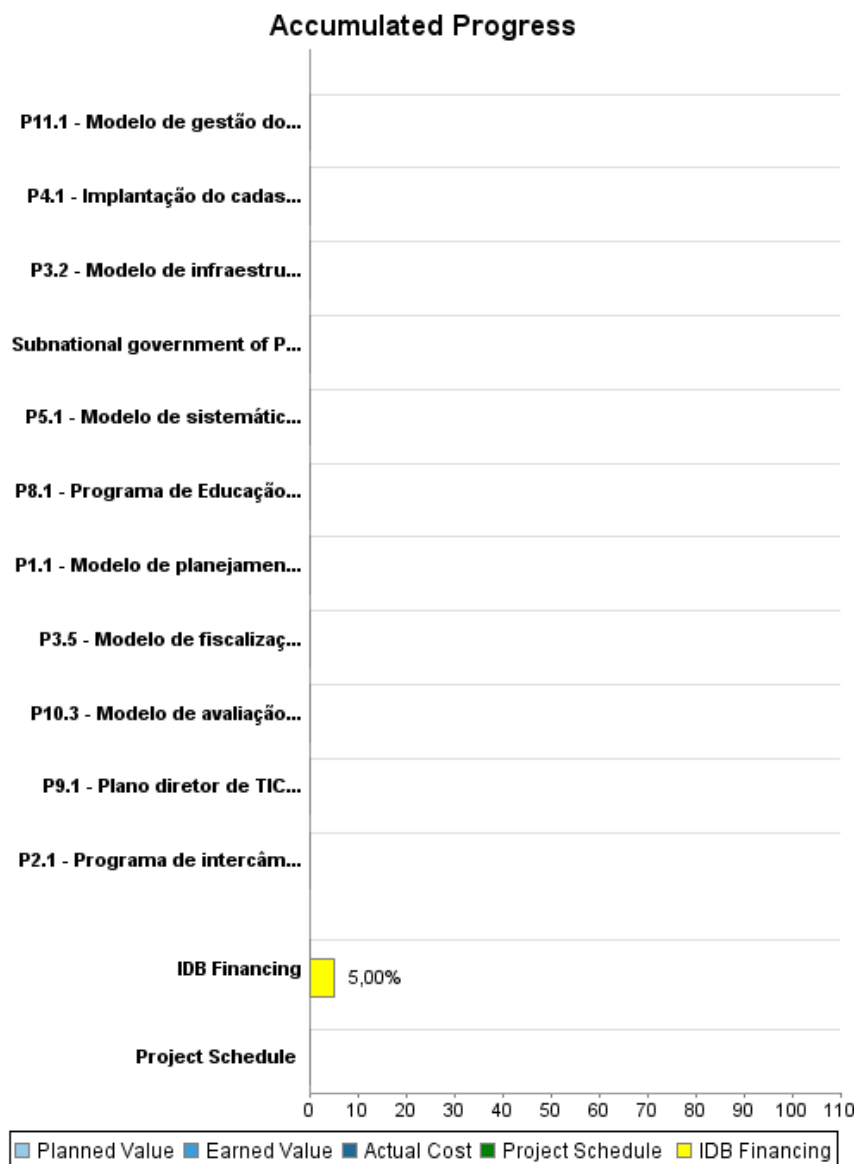

Outcomes

Outcome: 1 - Ampliar a visão do planejamento estratégico de curto para longo prazo

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Unidades Regionais monitoradas / total de unidades regionais	%		2008	P A		100,00			100,00

Outcome: 2 - Aumentar o número de ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais / total de ações de fiscalização	%		2008	P A				70,00	70,00

Outcome: 3 - Aumento da abrangência do Programa de Comunicação Interna

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Aumento na média de acessos por matéria publicada	Acessos	100,00	2008	P A	125,00 100,00	150,00	175,00	200,00	200,00

Outcome: 4 - Aumento do nível de arrecadação oriunda dos postos fiscais

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Incremento da arrecadação oriunda dos postos fiscais	R\$Milhões	116,90	2008	P A		3,51	7,02	11,69	11,69

Outcome: 5 - Aumento no nível de arrecadação oriunda do aumento de contribuintes monitorados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Incremento da arrecadação proveniente de ações de monitoramento	R\$Milhões	1,41	2008	P A		0,03	0,03	0,04	0,04

Outcome: 6 - Redução do tempo médio de abertura de firma

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Redução do tempo médio para abertura de firma	Dias	60,00	2008	P A		5,00	5,00	5,00	5,00

Outcome: 7 - Aumento do número de auditorias realizadas eletronicamente

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Aumento do número de empresas auditadas eletronicamente	Empresas		2008	P A				100,00	100,00

Outcome: 8 - Aumento da recuperação dos créditos tributários e não tributários

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Arrecadação proveniente da PGE correspondente do estoque da dívida ativa / total do estoque da Dívida Ativa	%	0,55	2008	P A			2,00	5,00	5,00

Outcome: 9 - Reduzir a discrepância entre o valor dos precatórios estimado do valor dos precatórios pago.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Precatórios pagos / total de precatórios estimados	%	105,33	2008	P A					0,00

Outcome: 10 - Redução das divergências entre o pagamento programado e o executado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Redução do número de pagamentos realizados em desconformidade com o programado.	pagamentos	516,00	2008	P A			258,00	120,00	120,00

Outcome: 11 - Redução do volume de recursos de convênios federais devolvidos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Redução do volume de recursos federais devolvidos	RMilhões	6,00	2008	P A		4,00	3,00	2,00	2,00

Outcome: 12 - Redução do tempo de expedição certidões negativas das agências pólo do interior

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Redução do tempo médio de expedição certidões negativas das agências pólo do interior	Dias	5,00	2008	P A				1,00	1,00

Outcome: 13 - Aumento do cumprimento das atividades previstas no plano de ação das unidades

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1238 - PROFISCO-State of Piauí Fiscal Management Development and Improvement Project
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 16/03/2011

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Aumento do percentual do cumprimento das atividades previstas no plano de ação	%	50,00	2008	P A			100,00		100,00

Outcome: 14 - Redução das paradas não programadas pelo sistema

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Redução de tempo de indisponibilidade do sistema	horas	72,00	2008	P A			12,00		12,00

Outcome: 15 - Aumentar o número de serviços disponibilizados aos contribuintes via Web

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Expansão do número de serviços disponibilizados via web	serviços	5,00	2008	P A			7,00	10,00	10,00

Outcome: 16 - Aumentar o nível de satisfação dos usuários da ESAFAZ

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Aumento do índice de satisfação dos usuários de serviços da ESAFAZ	%	62,00	2008	P A				85,00	85,00

Outcome: 17 - Servidores avaliados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Ampliação do número de servidores avaliados para o total de servidores	%		2008	P A				100,00	100,00

Outcome: 18 - Disseminação de conhecimentos e boas práticas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	End of project
Aumento no número de boas práticas incorporadas	práticas		2008	P A			1,00	1,00	1,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I - Gestão Estratégica Integrada									
P1.1 - Modelo de planejamento estratégico aperfeiçoado	Modelo				1,00				36.754,00
P1.2 - Modelo de gestão de estudos econômico-fiscais SEFAZ e SEPLAN implantado	Modelo				1,00				65.184,00
P1.3 - Modelo de sistemática de planejamento e elaboração orçamentária integrada ao sistema de execução orçamentária e financeira do Estado implantada	Modelo				1,00				563.821,00
P2.1 - Programa de intercâmbio e conhecimentos implementado (ENCAT; ENAT; GDFAZ; GEFIN; Educação Fiscal)	Programa				1,00				184.294,00
P2.2 - Modelo de gestão da comunicação interna implantado	Modelo				1,00				59.887,00
Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
P3.2 - Modelo de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequado ao novo modelo de fiscalização de trânsito implantado	Modelo				1,00				2.859.750,00
P3.3 - Módulo de acompanhamento do crédito acumulado implantado (SIAT)	Módulo				1,00				12.094,00
P3.4 - Modelo de inteligência fiscal implantado	Modelo				1,00				115.340,00
P3.5 - Modelo de fiscalização de estabelecimento aperfeiçoado	Modelo				1,00				737.343,00
P3.6- Modelo de planejamento da ação fiscal implantado (Data warehouse)	Modelo				1,00				162.932,00
P3.7 - Modelo de sistemática de cobrança do IPVA e do ICMS	Modelo				1,00				132.680,00
P4.1 - Implantação do cadastro sincronizado	Cadastro				1,00				7.225,00
P4.2 - Sistema público de escrituração digital - SPED implantado (áreas fiscal, contábil e de nota fiscal eletrônica)	Systems				1,00				2.144.633,00
P5.1 - Modelo de sistemática para uma Maior Efetividade no resgate do Crédito Tributário e otimização das rotinas administrativas implantada	Modelo				1,00				327.787,00
Subnational government of Piaui supported	Governments				1,00				
Componente III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno									

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1238 - PROFISCO-State of Piauí Fiscal Management Development and Improvement Project
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Last Update: 16/03/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
P6.1 - Modelo de controle da dívida pública implantado.	Modelo				1,00				177.226,00
P6.2 - Modelo de gestão de precatórios implantado	Modelo				1,00				165.496,00
P6.3 - Modelo de contabilidade de custos incluindo o novo Plano de Contas Nacional do Estado definido	Modelo				1,00				101.936,00
P6.4 - Modelo de funcionamento da execução orçamentária, financeira e contábil	Modelo				1,00				639.268,00
P6.5 - Modelo de gestão de contratos celebrados pela administração pública implantado	Modelo				1,00				244.896,00
P7.1 - Modelo de Gestão de Controle Interno implantado	Modelo				1,00				775.916,00
Componente IV - Gestão de Recursos Estratégicos									
P8.1 - Programa de Educação Fiscal ampliado	Programa				1,00				111.176,00
P8.2 - Modelo de agências pólo no interior implantado	Modelo				1,00				1.926.960,00
P9.1 - Plano diretor de TIC, contemplando gestão de risco de TI, implantado e institucionalizado	Plano diretor				1,00				548.430,00
P9.2 - Modelo de centro de segurança de informação e equipamentos implantado	Modelo				1,00				1.560.733,00
P9.3 - Modelo de infraestrutura de rede interna e de longa distância adequada às necessidades da SEFAZ	Modelo				1,00				1.960.732,00
P9.5 - Modelo de certificação digital implantado	Modelo				1,00				33.612,00
P10.1 - Programa de desenvolvimento dos servidores da área fiscal da sede e do interior implantado e institucionalizado	Programa				1,00				1.143.083,00
P10.2 - Modelo de gestão da ética dos servidores da SEFAZ implantado	Modelo				1,00				52.252,00
P10.3 - Modelo de avaliação de desempenho da SEFAZ implantada	Modelo				1,00				35.667,00
P11.1 - Modelo de gestão do conhecimento implantado	Modelo				1,00				12.568,00
Outros									
TOTAL									16.899.675,00
