
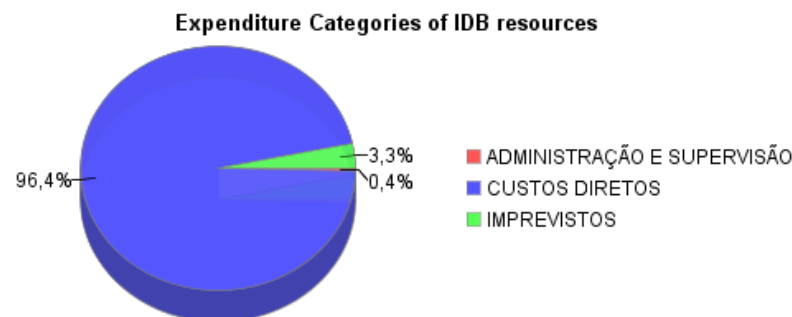
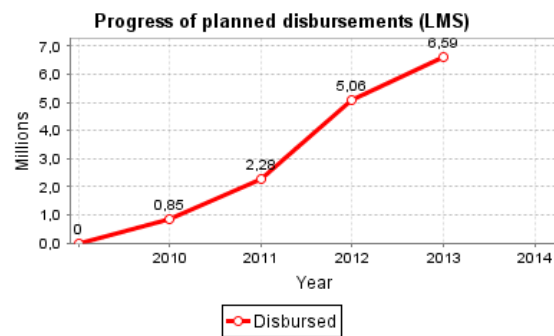



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):					
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH				
Loan Number(s):	2308/OC-BR	Current Approved Amount:	16.951.000,00	Original IDB:	16.951.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	6.585.394,45	Current IDB:	16.951.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	38,85	Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):	BR-X1005, BR-L1174	Balance:	10.365.605,55	Co-Financing/Country:	1.787.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	18.738.000,00
				Amortization Period (months):	186

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category:	None	() Was the objective(s) of this project reformulated?
		Validated by Division Chief: 26-sep-2013
		Validated by Country Representative: 27-sep-2013

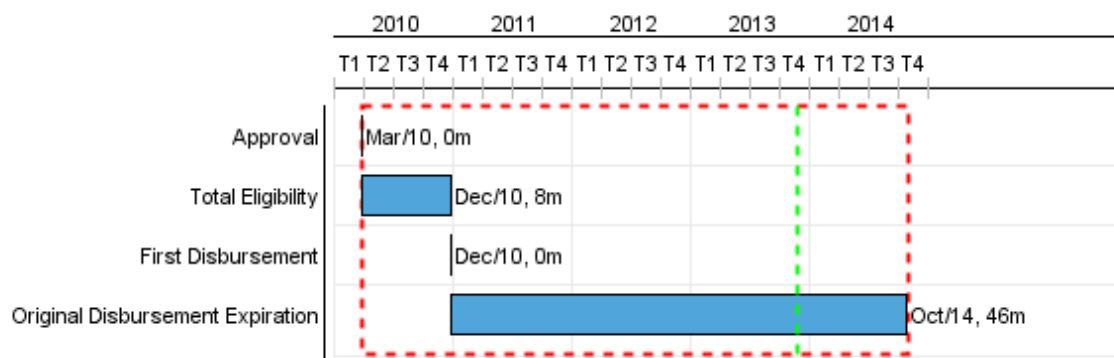

Accumulated Progress as of 2013

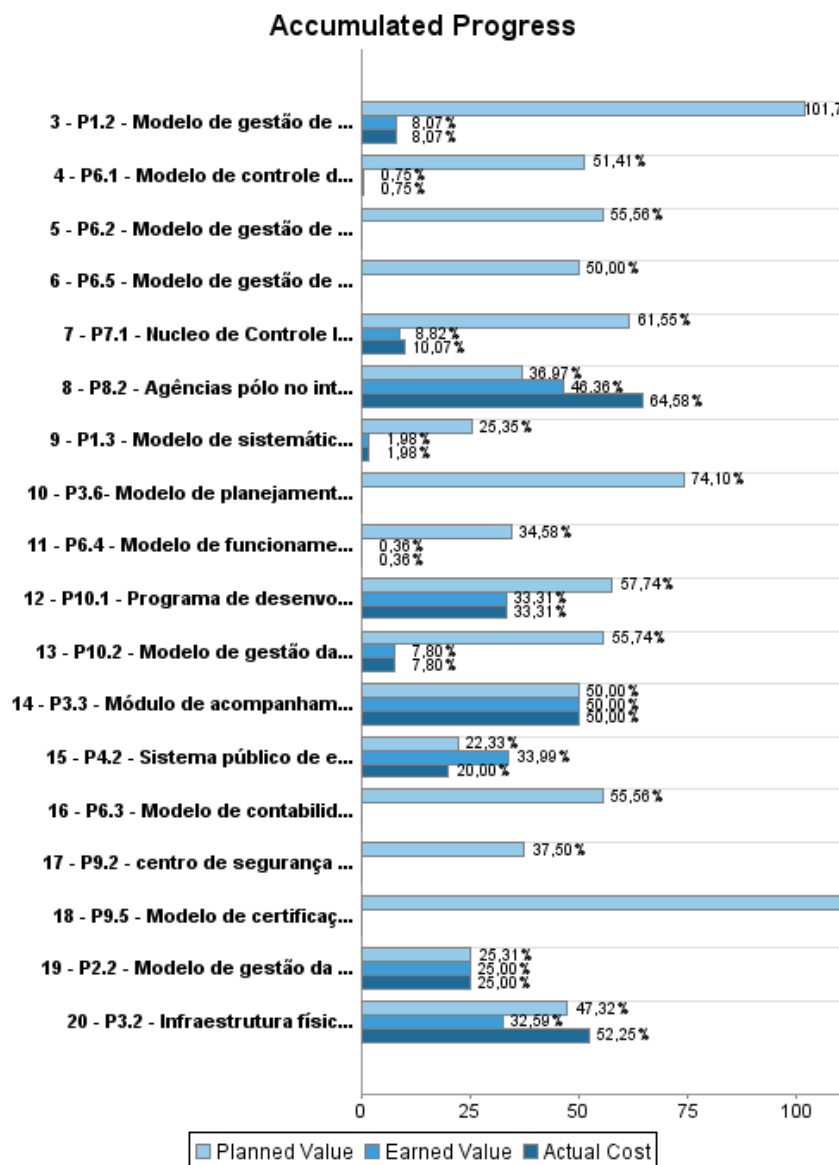


PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1238 - PROFISCO-State of Piauí Fiscal Management Development and Improvement Project
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Last Update: 24/09/2013

Accumulated Progress

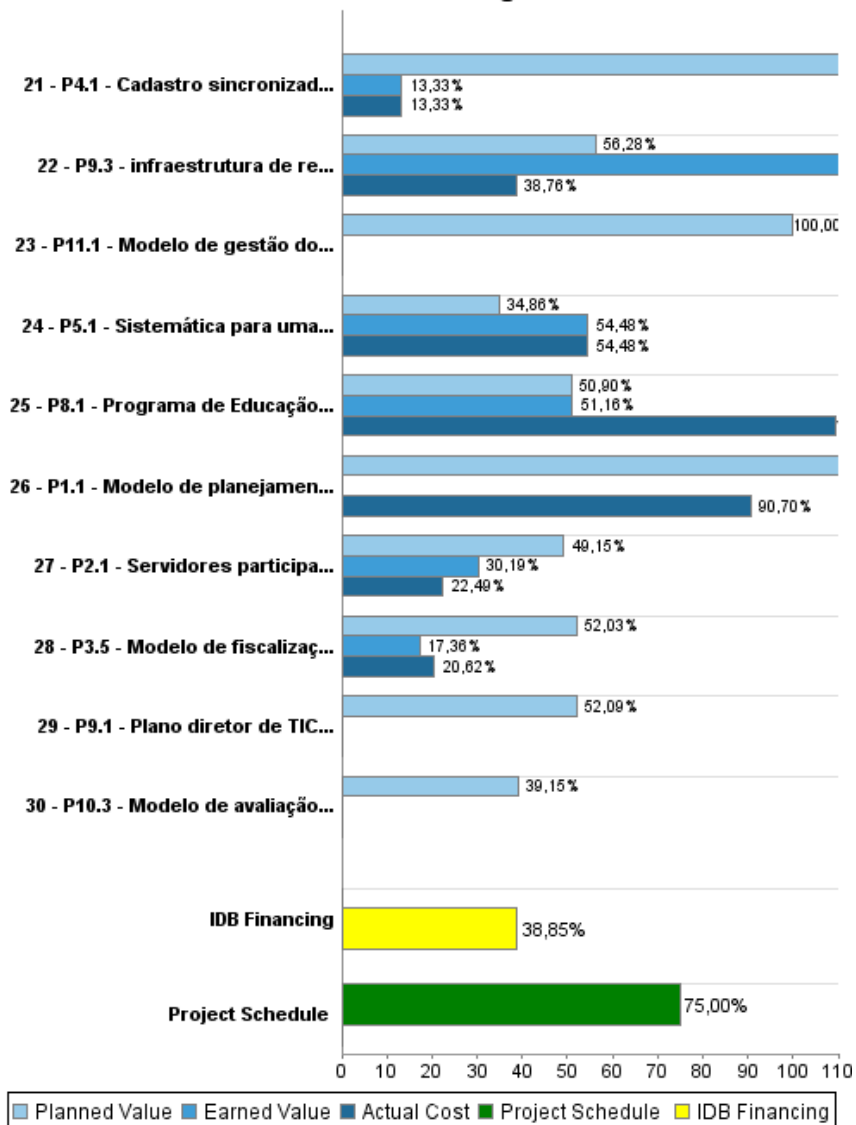

Outcomes

Outcome: 1 - Visão do planejamento estratégico de curto para longo prazo ampliada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Unidades Regionais monitoradas / total de unidades regionais	%		2008	P A		100,00				100,00

Outcome: 2 - Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais aumentadas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais / total de ações de fiscalização	%		2008	P A				70,00		70,00
Subnational government of Piaui supported	Governments		2008	P A					1,00	1,00

Outcome: 3 - Aumento da abrangência do Programa de Comunicação Interna

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Aumento na média de acessos por matéria publicada	Acessos	100,00	2008	P A	125,00 100,00	150,00 1.514,00	175,00	200,00		200,00

Outcome: 4 - nível de arrecadação oriunda dos postos fiscais incrementado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Incremento da arrecadação oriunda dos postos fiscais	R\$Milhões	116,90	2008	P A		3,51 0,39	7,02	11,69		11,69

Outcome: 5 - nível de arrecadação oriunda do aumento de contribuintes monitorados incrementado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Incremento da arrecadação proveniente de ações de monitoramento	R\$Milhões	1,41	2008	P A		0,03 1,00	0,03	0,04		0,04

Outcome: 6 - Tempo médio de abertura de firma reduzido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------------

Redução do tempo médio para abertura de firma	Dias	60,00	2008	P		5,00	5,00	5,00	5,00
				A		10,00			

Outcome:	7 - Auditorias realizadas eletronicamente incrementadas
-----------------	---------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Aumento do número de empresas auditadas eletronicamente	Empresas		2008	P				100,00		100,00
				A						

Outcome:	8 - Recuperação dos créditos tributários e não tributários incrementada
-----------------	-------------------------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Arrecadação proveniente da PGE correspondente do estoque da dívida ativa / total do estoque da Dívida Ativa	%	0,55	2008	P			2,00	5,00		5,00
				A	0,36	0,15				

Outcome:	9 - Discrepância entre o valor dos precatórios estimado do valor dos precatórios pago reduzida
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Precatórios pagos / total de precatórios estimados	%	105,33	2008	P						
				A		136,74				

Outcome:	10 - Divergências entre o pagamento programado e o executado reduzidas
-----------------	------------------------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Redução do número de pagamentos realizados em desconformidade com o programado.	pagamentos	516,00	2008	P			258,00	120,00		120,00
				A						

Outcome:	11 - Volume de recursos de convênios federais reduzido
-----------------	--------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Redução do volume de recursos federais	RMilhões	6,00	2008	P		4,00	3,00	2,00		2,00
				A		9,80				

Outcome:	12 - Tempo de expedição certidões negativas das agências pólo do interior reduzido
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Redução do tempo médio de expedição certidões negativas das agências pólo do interior	Dias	5,00	2008	P				1,00		1,00
				A						

Outcome: 13 - Cumprimento das atividades previstas no plano de ação das unidades incrementado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Aumento do percentual do cumprimento das atividades previstas no plano de ação	%	50,00	2008	P			100,00			100,00
				A	62,50	61,53				

Outcome: 14 - Paradas não programadas pelo sistema reduzidas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Redução de tempo de indisponibilidade do sistema	horas	72,00	2008	P			12,00			12,00
				A	48,00	51,00				

Outcome: 15 - Serviços disponibilizados aos contribuintes via Web incrementado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Expansão do número de serviços disponibilizados via web	serviços	5,00	2008	P			7,00	10,00		10,00
				A	11,00	21,00				

Outcome: 16 - Nível de satisfação dos usuários da ESAFAZ aumentado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Aumento do índice de satisfação dos usuários de serviços da ESAFAZ	%	62,00	2008	P				85,00		85,00
				A	83,02	89,89				

Outcome: 17 - Servidores avaliados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Ampliação do número de servidores avaliados para o total de servidores	%		2008	P				100,00		100,00
				A						

Outcome: 18 - Disseminação de conhecimentos e boas práticas incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	End of project
Aumento no número de boas práticas	práticas		2008	P			1,00	1,00		1,00
				A		2,00				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I - Gestão Estratégica Integrada									
P1.1 - Modelo de planejamento estratégico aperfeiçoado - Eventos de disseminação do Plano Estratégico realizado	eventos				2,00				36.754,00
P1.2 - Modelo de gestão de estudos econômico-fiscais SEFAZ e SEPLAN implantado - Relatório gerado pela ferramenta da metodologia de estudos econômico-fiscais informando o potencial arrecadatório do Estado	relatório	1,00			1,00				65.183,00
P1.3 - Modelo de sistemática de planejamento e elaboração orçamentária integrada ao sistema de execução orçamentária e financeira do Estado implantado - Sistema de planejamento e orçamento informatizado emitindo relatórios gerenciais on line	relatório	1,00			1,00				563.821,00
P2.1 - Servidores participando de Programa de intercâmbio e conhecimentos (ENCAT; ENAT; GDFAZ; GEFIN; Educação Fiscal)	participações	30,00			40,00	49.145,00			184.294,00
P2.2 - Modelo de gestão da comunicação interna implantado - Número de unidades regionais acessando a Rádio Ambiental	unidades regionais	10,00			10,00				59.887,00
Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
P3.2 - Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequado ao novo modelo de fiscalização de trânsito implantado - Número de Postos fiscais operando no novo modelo	postos fiscais	2,00			5,00				2.859.750,00
P3.3 - Módulo de acompanhamento do crédito acumulado implantado (SIAT) - Relatórios de acompanhamento de crédito acumulado disponibilizado no SIAT	relatório	1,00			1,00				12.094,00
P3.4 - Ações de inteligência fiscal realizada	Ações	2,00			6,00				115.340,00
P3.5 - Modelo de fiscalização de estabelecimento aperfeiçoado - (indicador: Total de lançamento de crédito tributários)	lançamentos	20,00			50,00	184.336,00			737.343,00
P3.6- Modelo de planejamento da ação fiscal implantado (Data warehouse) - Número de contribuintes monitorados	contribuintes	200,00			1.000,00				162.932,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
P3.7 - Modelo de sistemática de cobrança do IPVA e do ICMS implantado - (indicador: Total de cobrança administrativa do IPVA)	cobranças	10,00			20,00				132.680,00
P4.1 - Cadastro sincronizado implantado (indicador: Número de empresas no cadastro sincronizado)	Cadastro				100,00				7.225,00
P4.2 - Sistema público de escrituração digital - SPED implantado (áreas fiscal, contábil e de nota fiscal eletrônica) - Número de empresas utilizando o SPED	Systems	40,00			100,00				2.144.633,00
P5.1 - Sistemática para uma Maior Efetividade no resgate do Crédito Tributário e otimização das rotinas administrativas implantado (indicador: Relatório gerencial emitido pelo sistema em tempo real	Relatório	1,00			1,00	27.316,00			327.787,00
Componente III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno									
P6.1 - Modelo de controle da dívida pública implantado. (indicador: Tempo médio de consolidação das informações da Dívida Pública)	horas	1,00			1,00	66.460,00			177.226,00
P6.2 - Modelo de gestão de precatórios implantado (indicador: Relatório do módulo de gestão informatizado da gestão de precatório disponibiliza em tempo real)	relatório	1,00			1,00	73.554,00			165.496,00
P6.3 - Modelo de contabilidade de custos incluindo o novo Plano de Contas Nacional do Estado definido	modelo	1,00			1,00	45.305,00			101.936,00
P6.4 - Modelo de funcionamento da execução orçamentária, financeira e contábil implantado (indicador: Relatório do sistema de controle de contratos e convênios emitidos pelo sistema.)	relatório				1,00	106.545,00			639.268,00
P6.5 - Modelo de gestão de contratos celebrados pela administração pública implantado (indicador: Relatório do sistema de controle de contratos e convênios emitidos pelo sistema.)	relatório	1,00			1,00	91.836,00			244.896,00
P7.1 - Nucleo de Controle Interno de Gestão implantado	núcleo	20,00			112,00	232.775,00			775.916,00
Componente IV - Gestão de Recursos Estratégicos									

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1238 - PROFISCO-State of Piauí Fiscal Management Development and Improvement Project
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 24/09/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
P8.1 - Programa de Educação Fiscal ampliado (Número de regionais executando programa de educação fiscal)	regionais	1,00			10,00				111.176,00
P8.2 - Agências pólo no interior implantadas	agências	5,00			35,00	481.740,00			1.926.960,00
P9.1 - Plano diretor de TIC, contemplando gestão de risco de TI, implantado e institucionalizado	Plano				1,00				548.430,00
P9.2 - centro de segurança de informação e equipamentos implantado	centro de segurança	1,00			1,00				1.560.733,00
P9.3 - infraestrutura de rede interna e de longa distância adequada às necessidades da SEFAZ instalados (indicador: Número de links disponibilizados)	pontos	55,00			75,00	326.789,00			1.960.732,00
P9.5 - Modelo de certificação digital implantado (indicador: Número de Órgão Públicos trocando informações)	órgão publicos				10,00				33.612,00
P10.1 - Programa de desenvolvimento dos servidores da área fiscal da sede e do interior implantado (indicador: Número de servidores capacitados por meio do EAD)	capacitações				481,00	508.037,00			1.143.083,00
P10.2 - Modelo de gestão da ética dos servidores da SEFAZ implantado (indicador: Relatório do sistema de avaliação de desempenho com o total de avaliações realizadas implantado)	Relatório				1,00				52.252,00
P10.3 - Modelo de avaliação de desempenho da SEFAZ implantado	Modelo				1,00				35.667,00
P11.1 - Modelo de gestão do conhecimento implantado (indicador: Portal da SEFAZ com área específica para as informações relativas a gestão do conhecimento.)	Modelo				1,00	4.714,00			12.568,00
Outros									
Administração	N/A								1.286.636,00
Imprevistos	N/A					551.689,00			551.689,00
TOTAL						2.750.241,00			18.737.999,00
