



Operation Number: **BR-L1269**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**  
Last Update: **3/28/2016**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/31/2016**  
Division Chief validation date: **04/08/2016**  
Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Program for Modernization of Pension System Management II ¿ (PROPREV II	Loan Number:	2791/OC-BR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASISTENCIA SOCIAL		
Team Leader:	Costa Gazel,Ricardo	Sector/Subsector:	PENSIONS & SOCIAL SECURITY
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1269	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1269	\$10,000,000.00	\$3,700,000.00	37.00%	\$6,300,000.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

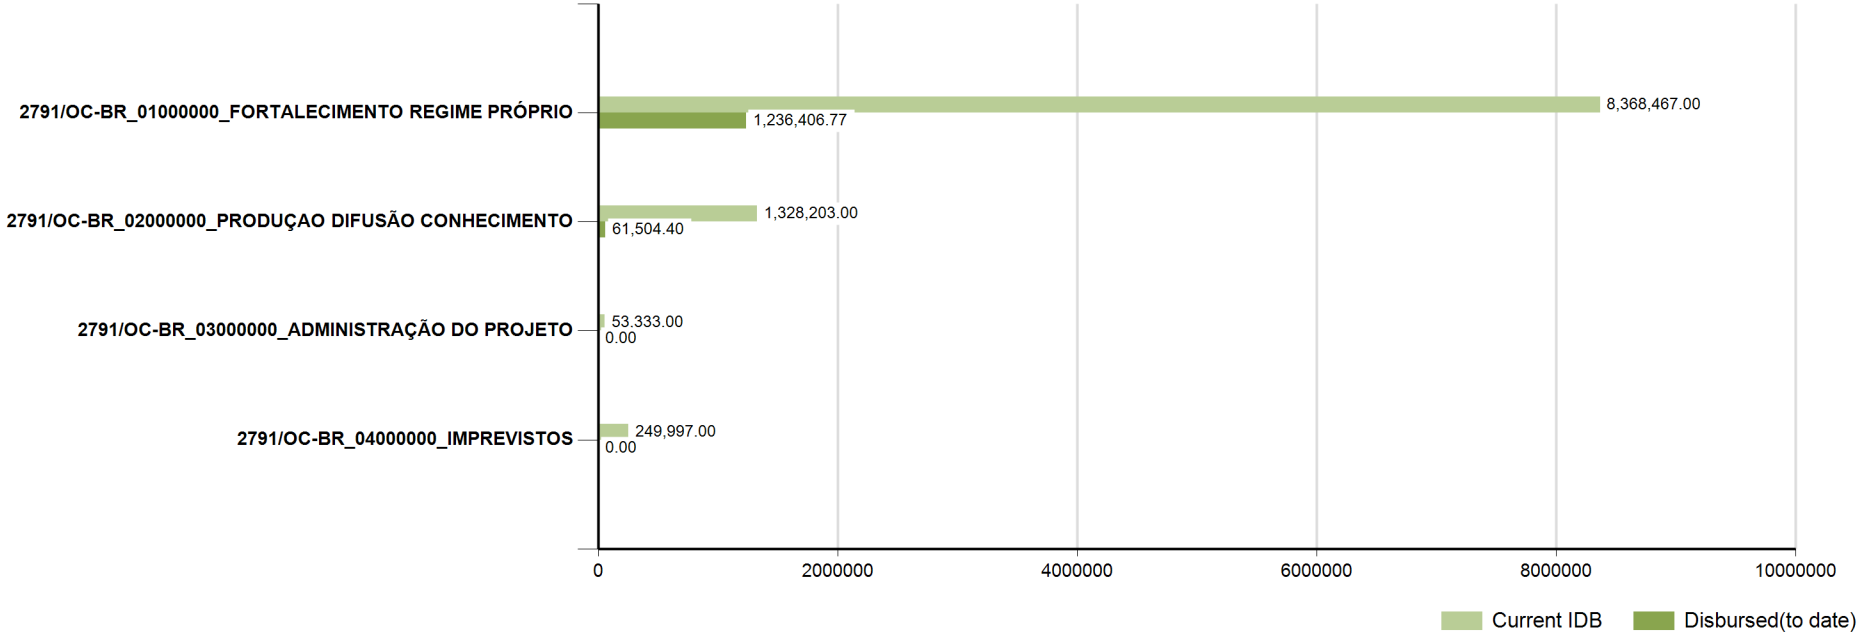

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Redução do déficit de no mínimo 50 entes federativos beneficiários do Programa									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP	
1.1 Déficit		R\$ milhões a preços constantes de 2010	102.90	2010	Avaliação final independente		P		86.90	
							P(a)		86.90	
							A			

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Redução da inconsistência dos dados dos segurados dos RPPS											
Observation:												
							2013		2015		EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
1.1 Taxa de inconsistência		%	90.00	2010			P		30.00	30.00		
							P(a)		30.00	30.00		
							A					
Outcome:	2 Propostas de políticas setoriais											
Observation:												
							2013		2015		EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
2.1 Proposta de política previdenciária apresentada a partir dos estudos realizados		unidade	3.00	2003	Avaliação intermediária e final		P			5.00		
							P(a)			5.00		
							A					
Outcome:	3 Municípios com compensação previdenciária entre entes federativos											
Observation:												
							2013		2015		EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
3.1 Compensação previdenciária		Município	0.00	2010			P		45.00	45.00		
							P(a)		45.00	45.00		
							A					

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimento dos Regimes Próprios de Previdência Social		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Entes federados com registros atualizados	Ente	P	50.00	50.00	P		12,755,000.00
		P(a)	45.00	52.00	P(a)	3,516,552.00	13,274,947.68
		A	0.00	0.00	A	814,930.07	814,930.07
Servidores dos RPPS capacitados	Servidores	P	380.00	1,040.00	P	146,000.00	228,000.00
		P(a)	0.00	1,040.00	P(a)	0.00	242,555.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestores capacitados	Gestor	P	240.00	240.00	P		138,000.00
		P(a)	0.00	240.00	P(a)	0.00	138,100.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Equipamentos de informática instalados	Equipamento	P	350.00	500.00	P		1,450,000.00
		P(a)	939.00	939.00	P(a)	1,095,052.00	916,597.32
		A	939.00	939.00	A	916,597.32	916,597.32
Produção, Internalização e Difusão do Conhecimento para Secretaria de Pol. Prev. Social (SPPS/MPS)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Municípios com assistência técnica prestada pelos servidores temporários contratados.	Governments	P	50.00	50.00	P		1,408,000.00
		P(a)	40.00	40.00	P(a)	500,000.00	3,055,605.00
		A	36.00	36.00	A	303,914.96	303,914.96
Estudos sobre a previdência social realizados	Estudo	P	6.00	6.00	P	245,000.00	3,299,000.00
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	800,000.00	1,651,063.00
		A	2.00	2.00	A	288,714.26	288,714.26
Publicações sobre temas previdenciários	Publicação	P	3.00	6.00	P	51,000.00	153,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	0.00	152,533.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Cursos a distância realizados	Curso	P	2.00	3.00	P	133,000.00	199,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	198,602.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Auditores capacitados	Auditor	P	100.00	100.00	P		67,000.00
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	0.00	66,667.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administração do Projeto							

Other Cost		2015	Cost
Imprevistos	P	\$150,000.00	\$250,000.00
	P(a)	\$0.00	\$249,997.00
	A	\$0.00	\$0.00
Avaliações Independentes	P	\$38,000.00	\$53,000.00
	P(a)	\$0.00	\$53,333.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$763,000.00	\$20,000,000.00
	P(a)	\$5,911,604.00	\$20,000,000.00
	A	\$2,324,156.61	\$2,324,156.61

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Entes federados com registros atualizados	Modify Output to measure progress using Milestones	Compatibilização entre as diferentes unidades de medidas dos milestones e do produto principal.	3/18/2016	3/28/2016
Output	Relatório Final - Resultados (Censo Cadastral)	Modify Milestone name	Foi retirada a numeração dos milestones para não criar confusão entre produto principal e milestones.	3/17/2016	3/28/2016
Output	Relatório de execução do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento – Backup Final (Censo Cadastral)	Modify Milestone name	Foi retirada a numeração dos milestones para não criar confusão entre produto principal e milestones.	3/17/2016	3/28/2016
Output	Relatório de execução de 60% do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Censo Cadastral)	Modify Milestone name	Foi retirada a numeração dos milestones para não criar confusão entre produto principal e milestones.	3/17/2016	3/28/2016
Output	Relatório de execução de 30% do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Censo Cadastral)	Modify Milestone name	Foi retirada a numeração dos milestones para não criar confusão entre produto principal e milestones.	3/17/2016	3/28/2016
Output	Relatório de planejamento do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Cento Cadastral)	Modify Milestone name	Foi retirada a numeração dos milestones para não criar confusão entre produto principal e milestones.	3/17/2016	3/28/2016
Output	Plano de Trabalho (Censo Cadastral)	Modify Milestone name	Foi retirada a numeração dos milestones para não criar confusão entre produto principal e milestones.	3/17/2016	3/28/2016
Output	Estudos sobre a previdência social realizados	Modify Financial P(a) value	Meta financeira alterada para readequação das ações do Programa em função do aumento do dólar.	3/11/2016	3/11/2016
Output	Municípios com assistência técnica prestada pelos servidores temporários contratados.	Modify Financial P(a) value	Meta financeira alterada para readequação das ações do Programa em função do aumento do dólar.	3/11/2016	3/11/2016
Output	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Financial P(a) value	Meta financeira alterada para readequação das ações do Programa em função do aumento do dólar.	3/11/2016	3/11/2016
Output	Municípios com assistência técnica prestada pelos servidores temporários contratados.	Modify Output name	Nome do produto alterado para identificar melhor a meta física planejada.	3/11/2016	3/11/2016
Output	Cursos a distância realizados	Modify Physical P(a) value	Meta financeira alterada para readequação das ações do Programa em função do aumento do dólar.	3/10/2016	3/11/2016
Outcome	Proposta de política previdenciária apresentada a partir dos estudos realizados	Modify Indicator name	Nome alterado em seguimento ao solicitado por SPD.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Unit of Measure	Corrigido o texto da unidade de medida. A Unidade de Medida não foi alterada.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 6 - Relatório Final - Resultados (Censo Cadastral)	Modify Unit of Measure	Unidade de Medida alterada de "Ente" para "Estudo", porque os produtos são estudos a serem realizados.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 5 - Relatório de execução do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento – Backup Final (Censo Cadastral)	Modify Unit of Measure	Unidade de Medida alterada de "Ente" para "Estudo", porque os produtos são estudos a serem realizados.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 4 – Relatório de execução de 60% do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Censo Cadastral)	Modify Unit of Measure	Unidade de Medida alterada de "Ente" para "Estudo", porque os produtos são estudos a serem realizados.	2/22/2016	3/11/2016

Output	Produto 3 – Relatório de execução de 30% do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Censo Cadastral)	Modify Unit of Measure	Unidade de Medida alterada de "Ente" para "Estudo", porque os produtos são estudos a serem realizados.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 2 - Relatório de planejamento do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Cento Cadastral)	Modify Unit of Measure	Unidade de Medida alterada de "Ente" para "Estudo", porque os produtos são estudos a serem realizados.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 1 - Plano de Trabalho (Censo Cadastral)	Modify Unit of Measure	Unidade de Medida alterada de "Ente" para "Estudo", porque os produtos são estudos a serem realizados.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 6 - Relatório Final - Resultados (Censo Cadastral)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 5 - Relatório de execução do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento – Backup Final (Censo Cadastral)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 4 – Relatório de execução de 60% do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Censo Cadastral)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 3 – Relatório de execução de 30% do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Censo Cadastral)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 2 - Relatório de planejamento do Censo Cadastral Previdenciário - recadastramento (Cento Cadastral)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 1 - Plano de Trabalho (Censo Cadastral)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Cursos a distância realizados	Modify Output name	Corrigido o texto da unidade de medida. A Unidade de Medida não foi alterada.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Estudos sobre a previdência social realizados	Modify Output name	Corrigido o nome do produto.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 10 - Relatório final referente ao produto 8 (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 9 - Relatório preliminar referente ao produto 8 (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 8 - Metodologia para analisar os determinantes da contribuição previdenciária dos trabalhadores autônomos elaborada (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 7 - Relatório final referente ao produto 5 (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 6 - Relatório preliminar referente ao produto 5 (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016

Output	Produto 5 - Metodologia para aprofundar os diagnósticos do MEI elaborada (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 4 - Relatório final referente ao produto 3 (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 3 - Relatório preliminar referente ao produto 2 (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 2 - Metodologia a ser utilizada no estudo da evolução do micro empreendimento no Brasil de 2005 a 2011 elaborada (Estudo 2)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 1 - Plano do Projeto e o Cronograma detalhado (Estudo 2 - "Inclusão Previdenciária")	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 1 - Plano do Projeto e o Cronograma detalhado (Estudo 1 - "Perfil Epidemiológico Previdenciário").	Modify Milestone name	Corrigido o nome do produto.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 7.3 Edição em meio eletrônico de boletim epidemiológico quadrimestral (Estudo 1 - Quadrimestre III)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 7.2 Edição em meio eletrônico de boletim epidemiológico quadrimestral (Estudo 1 - Quadrimestre II)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 7.1 Edição em meio eletrônico de boletim epidemiológico quadrimestral (Estudo 1 - Quadrimestre I)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 6 - Projeto de uma Sala de Situação com indicadores sobre acidentes do trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, concessão e custo de benefícios previdenciários (Estudo 1)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 5 - Estruturação do painel epidemiológico previdenciário (Estudo 1)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 4 - Impactos e custos dos acidentes de trânsito para a Previdência Social (Estudo 1)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 3 - Elaboração de modelo epidemiológico para o controle das variáveis críticas aos RPPS e RGPS (Estudo 1)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 2 - Diagnóstico acidentário dos RPPS e RGPS (Estudo 1)	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016
Output	Produto 1 - Plano do Projeto e o Cronograma detalhado (Estudo 1 - "Questão da Saúde e da Segurança do Trabalho e as Implicações par aos Regimes Próprios e o Regime Geral de Previdência Social - Construção do Perfil Epidemiológico Previdenciário").	Create Milestone	Foi criado este milestone para melhor mensuração dos produtos/estudos, e acompanhar o seu alcance relacionando-o com entrega do produto final.	2/22/2016	3/11/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
