



Operation Number: **BO-L1064**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/5/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/06/2015**
Division Chief validation date: **10/09/2015**
Country Representative validation date: **11/03/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Grow Well to Live Well Early Childhood Development Program	Loan Number:	2719/BL-BO,2719/BL-BO-1,2719/BL-BO-1-DE,2719/BL-BO-2,2719/BL-BO-2-DE,2719/BL-BO-DE
Executing Agency (EA):	MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES ,MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES ,MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES ,FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL ,FND NAC.DE INVER. PRODUCTIVA Y SOCIAL ,MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES		
Team Leader:	Johannsen,Julia	Sector/Subsector:	EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BOLIVIA
Borrower:	REPUBLICA DE BOLIVIA ,REPUBLICA DE BOLIVIA		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BO-L1064	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$22,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BO-L1064	\$20,000,000.00	\$3,359,500.00	16.80%	\$16,640,500.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information



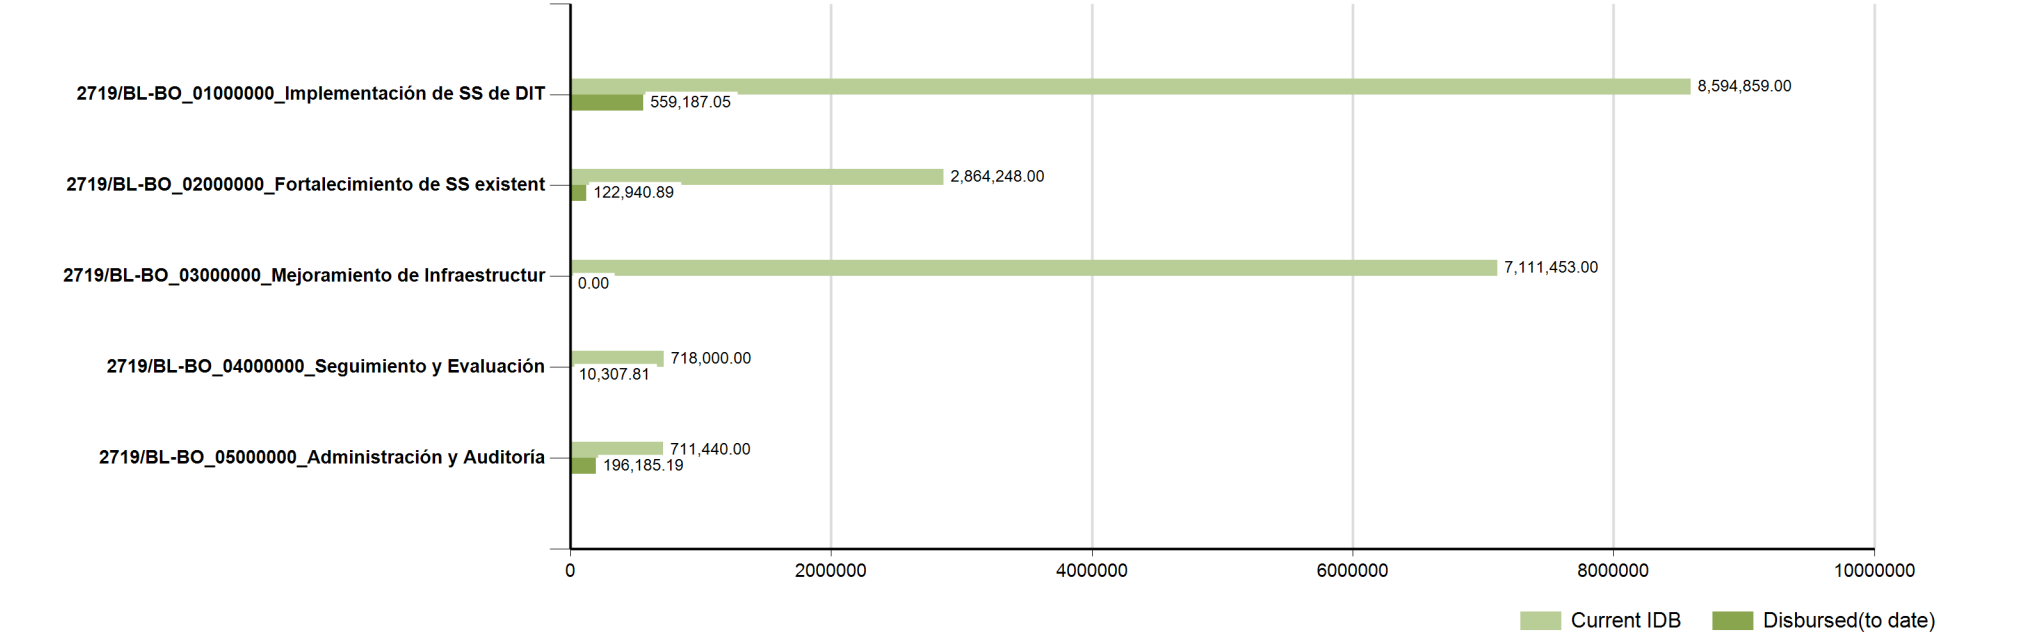

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)




Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Desarrollo cognitivo y fisico de niños/as bolivianos menores de 4 años.							
Observation:	Los indicadores son desagregados por sexo y culturalmente adecuados en cuanto a su instrumento de medición.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Niños menores de 4 años rezagados en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje segun modulo de comunicacion del ASQ) en municipios intervenidos.	 P-G	%		2014	Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamen te para las areas de intervencion.		P	
							P(a)	
							A	
0.1 Niñas menores de 4 años rezagadas en el desarrollo cognitivo (test cognitivo y de lenguaje segun modulo de comunicacion del ASQ) en municipios intervenidos.	 P-G	%		2014	Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamen te para las areas de intervencion.		P	
							P(a)	
							A	
0.2 Niños menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	 P-G	%	25.91	2014	Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamen te para las areas de intervencion.		P	
							P(a)	
							A	
0.3 Niñas menores de 4 años con desnutrición crónica en municipios intervenidos.	 P-G	%	25.88	2014	Valor baseline a ser definido después de conocer el indicador de la línea de base del Programa levantada en 2014 específicamen te para las areas de intervencion.		P	
							P(a)	
							A	

Outcomes

Outcome:	1 Acceso de menores de 4 años a servicios de DIT mejorado												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
1.1 Cobertura absoluta en DIT de niños/as de 0 a 4 años en municipios priorizados		Personas	0.00	2012	Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental	El indicador será desagregado por sexo. Salas de estimulación: 9000 (40 equipos* 225), diferentes niños/as atendidos cada año de ejecución. Visitas comunitarias: 5600 (140 educadores*40), mismos niños/as atendidos cada año de ejecución, solo cuentan una	P	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	23,600.00
							P(a)	0.00	0.00		14,600.00	14,600.00	23,600.00
							A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

1.2 Beneficiarios/as de 0 a 4 años incluidos en el registro nacional de DIT.		Beneficiarios	0.00	2012	Informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental	El indicador será desagregado por sexo. Todos los niños nacidos en instituciones de salud y al menos el 25% de los niños que van a participar en las modalidades DIT son registrados	P	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00
							A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Outcome:

2 Calidad de los servicios ofrecidos de DIT mejorada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2015	2016	EOP
2.1 Tasa de niños/as de 0 a 4 años por personal calificado DIT bajo AIEPI Nut Comunitario en municipios priorizados		Tasa		2012	informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental	Costeo y dimensionamiento de brigadas prevé 40 niños/educador y semana en brigada móvil	P			40.00	40.00		40.00
	P(a)								40.00	40.00		40.00	
	A							0.00	0.00		0.00		

2.2 Tasa de niños/as de 0 a 2 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados		Tasa		2012	informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental	Número de niños/as menores de 2 años por educador/a en centros infantiles s. Valor línea de base promedio a ser definido según línea de base de evaluación de impacto. Valor meta se basa en tasas excepcionales de los mejores centros infantiles s actuales en Bo	P			7.00	7.00	7.00	7.00
	P(a)									7.00	7.00	7.00	7.00
	A								0.00	0.00		0.00	
2.3 Tasa de niños/as de 2 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados		Tasa		2012	informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental	Número de niños/as de 2 a 4 años por educador/a en centros infantiles s. Valor línea de base promedio a ser definido según línea de base de evaluación de impacto. Valor meta se basa en tasas excepcionales de los mejores centros infantiles s actuales en Bolivi	P			11.00	11.00	11.00	11.00
	P(a)									11.00	11.00	11.00	11.00
	A								0.00	0.00		0.00	

2.4 Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado en los estándares de calidad y currículo vigente en los municipios priorizados		Porcentaje		2012	informe semestral de progreso del MSD con datos de cada SEDES departamental	El indicador será desagregado por sexo. Incluye personal existente actualmente (cuidadores comunitarios).	P	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00
							P(a)	0.00	0.00		25.00	50.00	75.00
							A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Implementación de servicios complementarios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
1.1.1 Cuidadores/as capacitados en currículo de centros infantiles.	Personas	P	250.00	520.00	P	204,000.00	368,000.00
		P(a)	263.00	520.00	P(a)	228,000.00	368,000.00
		A	4.00	261.00	A	0.00	140,000.00
1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando	Personas	P	250.00	250.00	P	2,520,760.00	5,395,140.00
		P(a)	250.00	250.00	P(a)	1,275,219.00	5,395,140.00
		A	0.00	0.00	A	3,679.00	20,466.00
1.2.1 Personal especializado capacitado y operando en intervenciones en rezago	Personas	P	60.00	60.00	P	537,000.00	1,620,000.00
		P(a)	65.00	80.00	P(a)	554,811.00	1,620,000.00
		A	63.00	0.00	A	261,803.00	456,136.00
1.3.1 Normas y protocolos elaborados y aprobados	Documentos	P	0.00	2.00	P	155,000.00	430,000.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	250,000.00	430,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	180,000.00
1.3.2 Convenios entre MSD, FPS, Gob. Aut. Dep. (SEDEGES, SEDES) y/o Gob. Aut. Mun. (GAM) firmados.	Convenios	P	0.00	1.00	P	0.00	30,000.00
		P(a)	8.00	36.00	P(a)	8,776.00	30,000.00
		A	5.00	33.00	A	1,814.00	23,038.00
1.3.3 Sistema de supervisión capacitante de SEDES y SEDEGES, implementado.	Sistema	P	0.00	1.00	P	120,000.00	292,286.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	110,000.00	292,286.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.4 Fondo municipal de desarrollo infantil operando.	Fondo	P	1.00	1.00	P	1,129,000.00	1,600,579.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	89,755.00	1,600,579.00
		A	0.00	0.00	A	8,878.00	17,164.00
Fortalecimiento de servicios existentes en el sector salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
2.1.1 Personal de salud capacitado para la aplicación de protocolos e instrumentos de DIT	Personas	P	300.00	500.00	P	54,000.00	60,000.00
		P(a)	200.00	500.00	P(a)	54,000.00	60,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT operando bajo AIEPI Nut Comunitario	Personas	P	140.00	140.00	P	1,279,516.00	2,956,461.00
		P(a)	140.00	140.00	P(a)	1,287,003.00	2,956,461.00
		A	0.00	0.00	A	237,329.00	360,270.00
2.3.1 Normas y protocolos revisados y/o complementados	Documentos	P	0.00	2.00	P		330,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	100,000.00	330,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y locales capacitado en el programa DIT	Personas	P	250.00	500.00	P	68,000.00	68,000.00
		P(a)	0.00	500.00	P(a)	0.00	68,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.3.3 Estrategia de información, educación y difusión del programa aprobada	Estrategia	P	1.00	1.00	P	120,000.00	150,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	70,000.00	150,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mejoramiento de infraestructura		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
3.1 Pre-inversión de centros infantiles realizada y aprobada	Diseños	P		90.00	P		303,837.18
		P(a)	27.00	90.00	P(a)	100,000.00	270,000.00
		A	0.00	3.00	A	0.00	6,000.00
3.2 Centros readecuados y equipados según estándares	Centros	P	40.00	90.00	P	2,046,849.80	4,760,115.82
		P(a)	0.00	90.00	P(a)	0.00	5,516,218.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

3.3 Pre-inversión de salas de rezago realizada y aprobada	Diseños	P		40.00	P		101,515.56
		P(a)	40.00	40.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.4 Salas de estimulación temprana instaladas y equipadas	Salas	P	20.00	40.00	P	636,164.18	1,590,410.44
		P(a)	15.00	40.00	P(a)	860,000.00	860,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Seguimiento y evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
4.1 Registro de beneficiarios o puntos de prestación, desarrollado e implementado	Sistema	P	1.00	1.00	P		218,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	218,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación cualitativa de procesos y resultados	Consultoría	P	0.00	1.00	P		50,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación de impacto	Consultoría	P		1.00	P		450,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	17,755.00	450,000.00
		A	0.00	0.00	A	8,828.00	19,136.00
Administración y Auditoría							

Other Cost		2015	Cost
Equipo de unidad ejecutora/coordinadora y personal departamental	P	\$347,466.00	\$770,081.00
	P(a)	\$264,678.00	\$770,081.00
	A	\$106,503.00	\$352,483.00
Auditoría	P	\$40,000.00	\$100,000.00
	P(a)	\$30,000.00	\$100,000.00
	A	\$15,011.00	\$25,524.00
Administración (7%) FPS	P	\$134,150.70	\$355,574.00
	P(a)	\$67,200.00	\$465,235.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$9,391,906.68	\$22,000,000.00
	P(a)	\$5,367,197.00	\$17,276,648.00
	A	\$643,845.00	\$1,600,217.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Diseño del curriculum y de la capacitación elaborado.	Modify Milestone name	Se corrigió la palabra "elaborado"	9/23/2015	9/23/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
