



Operation Number: **PR-L1051**  
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**  
Last Update: **10/24/2014**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **11/03/2014**  
Division Chief validation date: **11/04/2014**  
Country Representative validation date: **11/11/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Support to Early Childhood Development	Loan Number:	2667/OC-PR,2667/OC-PR-DE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL,MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
Team Leader:	Alvarado,Nohora Rocio	Sector/Subsector:	EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PARAGUAY
Borrower:	REPUBLICA DE PARAGUAY ,REPUBLICA DE PARAGUAY		Convergence related Operation(s):

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PR-L1051	\$27,000,000.00	\$27,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PR-L1051	\$27,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$27,000,000.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

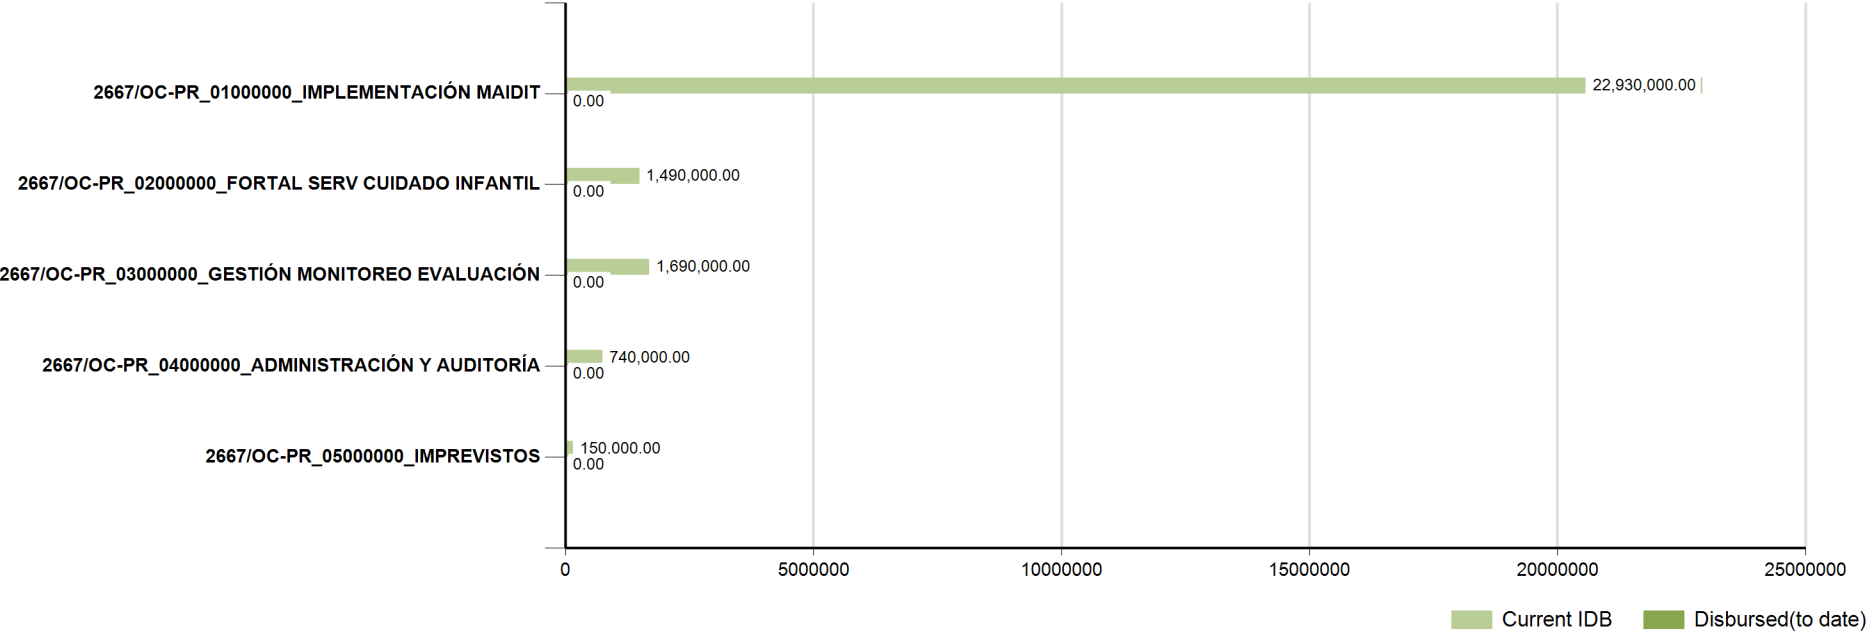



Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	EOP
2.1 Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.			% niños/ñas	0.00	2011	Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.	El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.	P	5.00			10.00
								P(a)	5.00			10.00
								A		0.00		0.00
Outcome:	3 1.3. 50% de niños/as menores de 5 años con tratamiento en SIT.											
Observation:	El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	EOP
3.1 Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.			% niños/ñas	0.00	2011	Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.	El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.	P	20.00	30.00	40.00	50.00
								P(a)	20.00	30.00	40.00	50.00
								A		0.00		0.00
Outcome:	4 1.4. 70% de los recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.											
Observation:	Las mediciones se iniciarán al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos											

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	EOP
4.1 Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.		% recién nacidos	0.00	2011	Información administrativa hospitales.	Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos	P		30.00	40.00	70.00
	P(a)							30.00	40.00	70.00	
	A							0.00		0.00	
Outcome:	5 1.5. 70% de los recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia.										
Observation:	Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos										

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	EOP	
5.1 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia		% recién nacidos	0.00	2011	Información administrativa hospitales.	Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas	P		30.00	40.00	70.00
						P(a)		30.00	40.00	70.00	
						A		0.00		0.00	
						Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos					
Outcome:	6 1.6. 70% de los recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.										
Observation:	Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programasPorcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos										

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	EOP	
6.1 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.			% recién nacidos	0.00	2011	Información administrativa hospitales.	Las mediciones se iniciarán al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas	P		30.00	40.00	70.00
							P(a)		30.00	40.00	70.00	
							A		0.00		0.00	
Outcome:		7 2.1. 30% de los centros aplicando protocolos con estándares de calidad										
Observation:												

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	EOP
7.1 Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.			% centros	10.00	2011	Encuesta específica al final de ejecución.	La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numerados: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.	P	15.00	20.00	25.00	30.00
								P(a)	15.00	20.00	25.00	30.00
								A		0.00		
Outcome:	8 2.2. 30% del personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.											
Observation:												



Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	<div>201320142015EOP</div>				
8.1 Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.		% personal	10.00	2011	Encuesta específica al final de ejecución.	Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada a por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimientos	P	15.00	20.00	25.00	30.00
							P(a)	15.00	20.00	25.00	30.00
							A		0.00		0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
1.1.1. Comunidades visitadas trimestralmente por personal de USF bajo AIEPI fortalecido.	comunidades	P	0.00	167.00	P	738,609.00	5,766,232.00
		P(a)	0.00	167.00	P(a)	738,609.00	5,766,232.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.1.2 USF fortalecidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF	P		167.00	P	108,740.00	3,678,615.00
		P(a)		167.00	P(a)	108,740.00	3,678,615.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2.1. Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el programa (de acuerdo con mapeo).	unidades	P		10.00	P	583,600.00	8,475,235.00
		P(a)		10.00	P(a)	583,600.00	8,475,235.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.1. Hospitales de referencia fortalecidos.	hospitales	P		1.00	P	141,991.00	2,255,221.00
		P(a)		1.00	P(a)	141,991.00	2,255,221.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	establecimientos	P		12.00	P	63,800.00	3,226,174.00
		P(a)		12.00	P(a)	63,800.00	3,226,174.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales.	establecimientos	P		11.00	P	0.00	2,639,848.00
		P(a)		11.00	P(a)	0.00	2,639,848.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	normas aprobadas	P		1.00	P	47,500.00	388,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	47,500.00	388,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.2. Centros de cuidado infantil Cebinfa del MSPyBS, fortalecidos.	establecimientos	P		31.00	P	15,000.00	1,188,519.00
		P(a)		31.00	P(a)	15,000.00	1,188,519.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	municipios	P		20.00	P	0.00	61,000.00
		P(a)		20.00	P(a)	0.00	61,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.2. Implementación de un sistema de videoconferencia para la capacitación y actualización de la Red DIT.	sistema	P		1.00	P	130,600.00	168,998.00
		P(a)		1.00	P(a)	130,600.00	168,998.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.3 Sistema de información de DIT implementado en el MSPyBS.	sistema	P		1.00	P	130,000.00	130,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	130,000.00	130,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.4 Evaluaciones del programa realizado	evaluaciones	P		2.00	P	110,000.00	640,000.00
		P(a)		2.00	P(a)	110,000.00	640,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
4. Administración y Auditoría							
Imprevistos							

Other Cost		2014	Cost
Administracion y Auditoría	P	\$267,315.00	\$1,318,258.00
	P(a)	\$267,315.00	\$1,318,258.00
	A	\$0.00	\$0.00
Imprevistos	P	\$0.00	\$63,900.00
	P(a)	\$0.00	\$63,900.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$2,337,155.00	\$30,000,000.00
	P(a)	\$2,337,155.00	\$16,044,302.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
