



Operation Number: **BR-L1237**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**
Last Update: **10/22/2014**
PMR Validation Stage: **Borrador**

Chief of Operations validation date: **10/24/2014**
Division Chief validation date: **10/28/2014**
Country Representative validation date: **11/02/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROFISCO - Parana	Loan Number:	3065/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Team Leader:	Mac Dowell Dourado de Azevedo,Maria Cristina	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO PARANA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1237	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00	\$2,125,000.00	\$0.00	\$10,625,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1237	\$8,500,000.00	\$0.00	0.00%	\$8,500,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

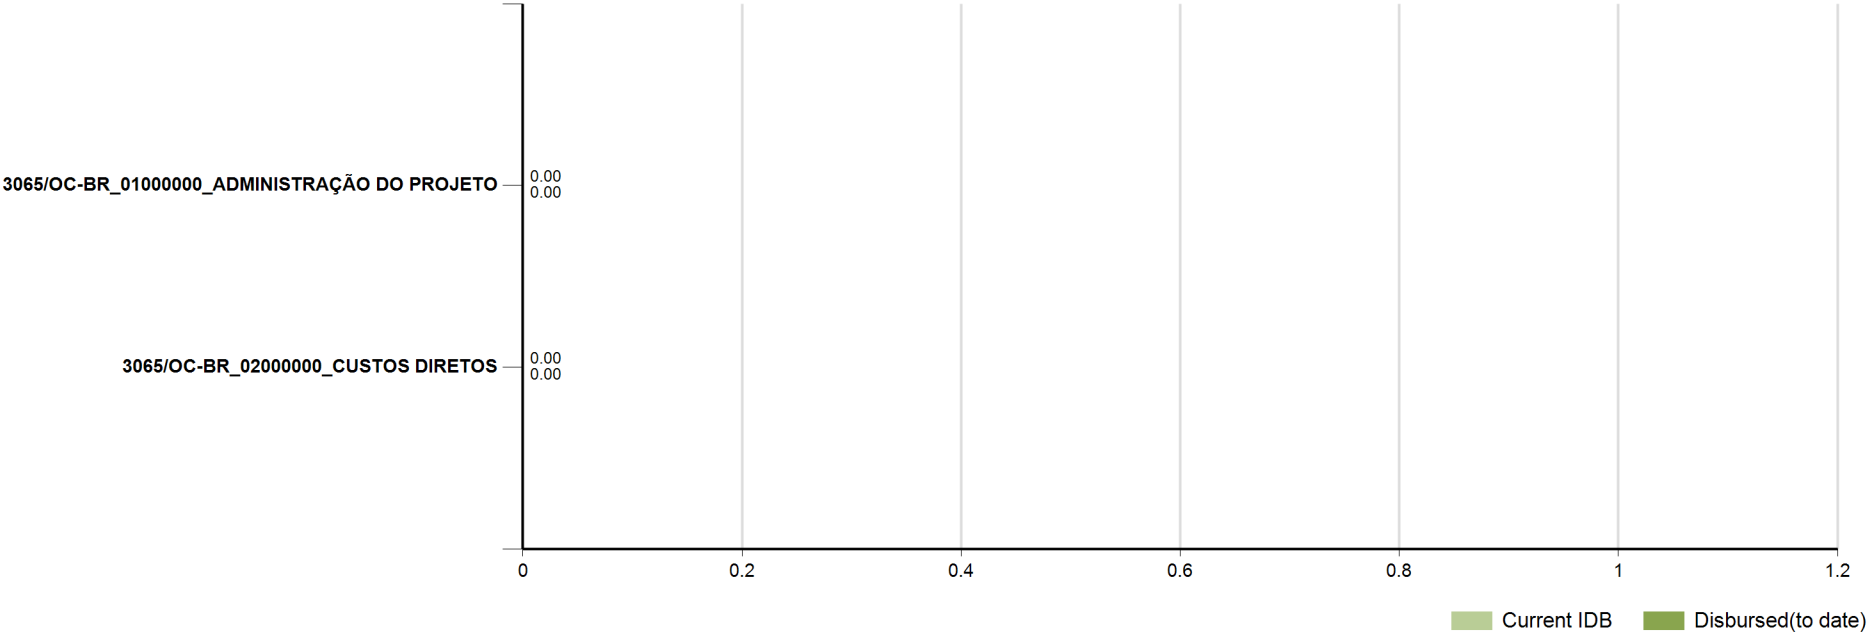

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Mantener una trayectoria fiscal sostenible													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
0.0 Resultado primario.		R\$	257.39	2013	Balance Anual del estado emitido por la Secretaria de Hacienda (SEFA).		P		263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00
	P(a)													
	A													

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Resultado Esperado 1: Incremento de la recaudación del ICMS														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations									
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
							P			20.90	21.70	22.90	24.20	25.50	25.50
0.0 Recaudación del ICMS.		Millones de R\$	20.70	2013	Balance Anual del estado emitido por la SEFA.		P(a)								
							A								
Outcome:	0 Resultado Esperado 2: Economía referente a los gastos de procesamiento con autos de infracción y procesos administrativos (AI-PAF)														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations									
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
							P						132.00		132.00
0.0 Gastos referentes al PAF-e.		Millones de R\$	335.60	2013	Informe financiero de la compañía de correos estatales.		P(a)								
							A								
Outcome:	0 Resultado Esperado 3: Disminución del tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations									
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
							P					8.00			8.00
0.0 Tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor.		Días	30.00	2013	Portal de la Junta Comercial del Estado de Paraná.		P(a)				8.00			8.00	
							A								
Outcome:	0 Resultado Esperado 4: Incremento del número de órganos del Estado con programación financiera generado por el SIAF														

Outco	0 Resultado Esperado 4: Incremento del número de órganos del Estado con programación financiera generado por el SIAF
--------------	--

me: o Resultados Esperados: Incremento del número de órganos del Estado con programación financiera generada por el SIN.

Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
0.0 Gasto comprometido bajo la programación financiera estandarizada y automatizada.		%	0.00	2013	Informe del sistema SIAF emitido por la SEFA.	26 secretarías, procuraduría, Casa Civil, Casa Militar, vicegovernador y gobernador.	P					10.00		10.00
							P(a)							10.00
							A							
Outcome:	0 Resultado Esperado 5: Reducción del Coste Promedio Anual del uso de la Tecnología por estación de trabajo													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
0.0 Coste Promedio Anual del uso de la tecnología por estación de trabajo		R\$	900.00	2013	Informe de gestión de la Coordinación de TI.	Memoria de Cálculo del Índice.	P			770.00				770.00
							P(a)							
							A							

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

I. Integración hacendaria y fortalecimiento de la gestión por resultados de la SEFA/PR		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
1.1 Sistema de gestión estratégica basado en resultados implantados.	Procedimiento	P	0.00	1.00	P	0.00	484,309.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	484,309.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2 Programa permanente de participación del personal de SEFA-PR en los foros nacionales e internacionales de capacitación tributaria.	Programa	P	0.00	4.00	P	27,739.00	416,081.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	27,739.00	416,081.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
II. Administración tributaria y de lo contencioso fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
2.1 Metodología de cruce de informaciones tipo Business Intelligence-BI implantada.	Áreas	P	0.00	5.00	P	0.00	178,964.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	0.00	178,964.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.2 Proceso de apertura de empresas, cierre y actualización de la información del registro integrado.	Procesos	P	0.00	3.00	P	0.00	193,469.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	193,469.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.3 Proceso Administrativo Fiscal electrónico automatizado - áreas utilizando el PAF-e.	Áreas	P	0.00	5.00	P	0.00	7,639,238.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	0.00	7,639,238.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
III. Administración financiera, patrimonial y control interno de la gestión fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
3.1 Nuevas funcionalidades del sistema SIAF implantadas.	Funcionalidades	P	0.00	3.00	P	0.00	1,010,752.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	1,010,752.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.2 Modelo de contabilidad de convergencia contable internacional implantado (IPSAS). Demonstrativos fiscales anuales.	Demonstrativos Fiscales	P	0.00	3.00	P	0.00	102,342.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	102,342.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
IV. Gestión de recursos corporativos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
4.1 Plan estratégico de TI desarrollado y aprobado.	Plan	P	0.00	1.00	P	0.00	45,045.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	45,045.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
4.2 Número de desktops virtualizados.	Máquinas	P	0.00	350.00	P	0.00	255,131.00
		P(a)	0.00	350.00	P(a)	0.00	255,131.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Other Cost					2014		Cost
Gestión del Proyecto.				P	\$12,500.00		\$200,000.00
				P(a)	\$12,500.00		\$200,000.00
				A	\$0.00		\$0.00
Monitoreo, auditoría y evaluación.				P	\$6,250.00		\$100,000.00
				P(a)	\$6,250.00		\$100,000.00
				A			\$0.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$46,489.00	\$10,625,331.00
	P(a)	\$46,489.00	\$5,902,979.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
