



Operation Number: **HA-L1057**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **5/12/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **05/13/2015**
Division Chief validation date: **05/15/2015**
Country Representative validation date: **05/18/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Business Development and Training Services Program for Investment	Loan Number:	2555/GR-HA
Executing Agency (EA):	Fond de Développement Industriel		
Team Leader:	Filippo,Agustin Ignacio	Sector/Subsector:	ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HAITI
Borrower:	REPUBLIQUE D' HAITI	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HA-L1057	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HA-L1057	\$11,000,000.00	\$692,253.86	6.29%	\$10,307,746.14


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	


Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

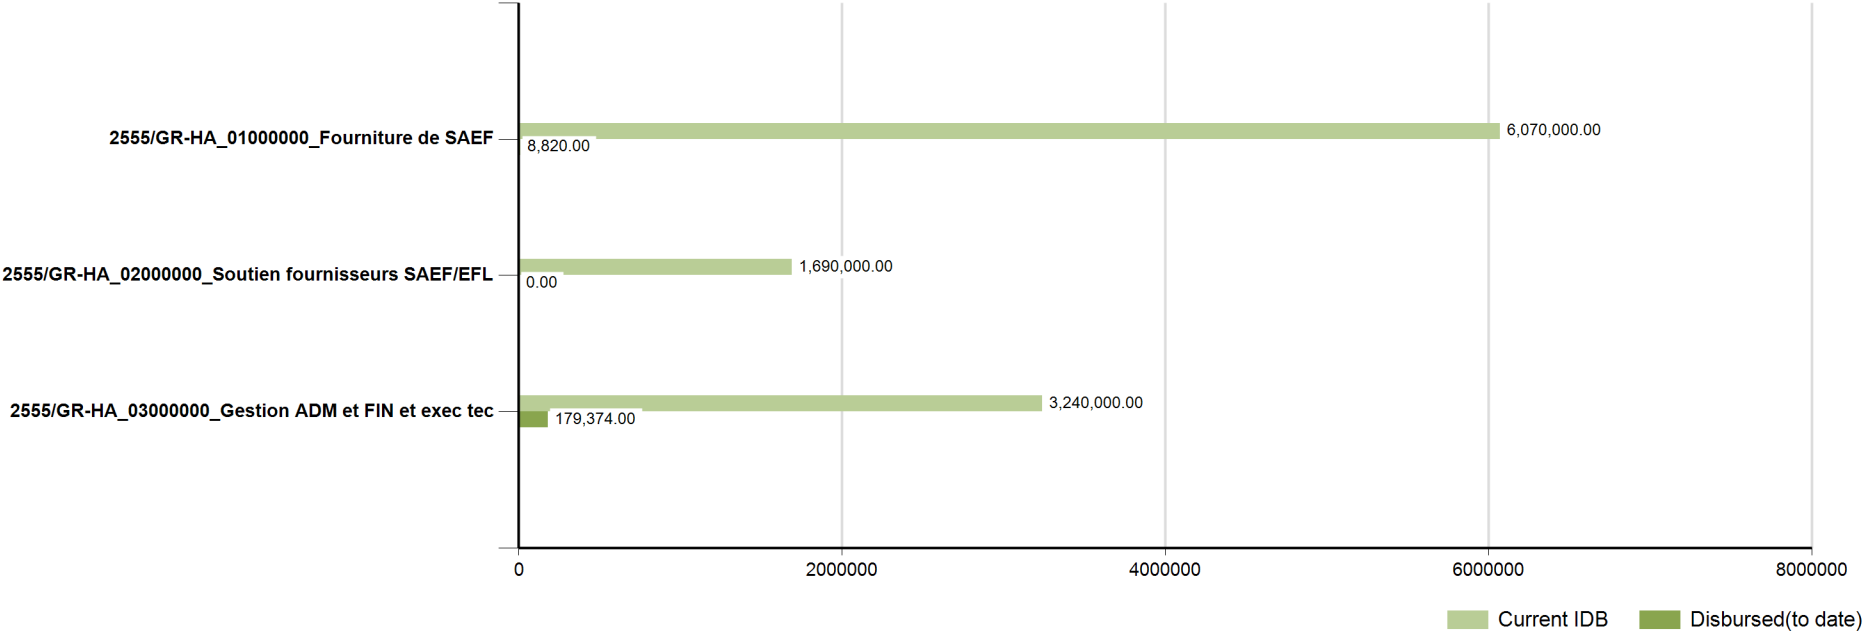

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mejorar la Productividad de las PyMEs													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
1.1 Margen de ganancias de las empresas participantes (como señas de productividad) mejorado		Relación	1.00	2014	Informes de Progreso del Programa / Informe de evaluación de Impacto (Sobre la base de las encuestas de base y seguimiento).	El indicador es igual al margen de ganancias promedio, como porcentaje de las ventas de las empresas participantes en relación con el de otras empresas comparables.	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20		1.20
							P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20
							A			0.00				

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Acceso al crédito de PyMEs beneficiarias aumentado												
Observation:	Indica la relación (coeficiente) entre: i) el número total de PyMEs beneficiarias que obtienen acceso al crédito en relación con todas las PyMEs beneficiarias del Programa y; ii) el número total de empresas comparables no beneficiarias del programa que ob												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
							P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
							P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
							A			0.00			
1.1 Coeficiente PyMEs beneficiarias con acceso a crédito (sobre total PyMEs beneficiarias) / PyMEs no beneficiarias con acceso a crédito (sobre total PyMEs no beneficiarias)		Coeficiente	1.00	2013	Resultado de las encuestas de base y seguimiento / XPMR	El cálculo del coeficiente se realizará en el marco del informe final de evaluación y del informe de evaluación de impacto.							
Outcome:	2 Acceso al crédito de las microempresas beneficiarias del programa aumentado												
Observation:	Indica la relación (coeficiente) entre: i) el número total de microempresas beneficiarias que obtienen acceso al crédito en relación con todas las microempresas beneficiarias del Programa y; ii) el número total de microempresas comparables no beneficiaria												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
2.1 Coeficiente microempresas beneficiarias con acceso a crédito (sobre total microempresas beneficiarias) / microempresas no beneficiarias con acceso a crédito (sobre total microempresas no beneficiarias)		Coeficiente	1.00	2013	Resultado de las encuestas de base y seguimiento / XPMR	El cálculo del coeficiente se realizará en el marco del informe final de evaluación y del informe de evaluación de impacto.	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
							P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50
							A			0.00			
Outcome:	3 Comportamiento cartera de crédito PyMEs beneficiarias igualado o mejorado con respecto al promedio del sistema												
Observation:	Calcula la relación entre la tasa de mora de las PyMEs beneficiarias que acceden al crédito del sistema financiero que acusan atrasos en los pagos previstos (calculada como préstamos a PyMEs beneficiarias con acceso a créditos (con atrasos) / PyMEs beneficiarias)												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
3.1 Coeficiente tasa de mora PyMEs beneficiarias / tasa de mora PyMEs (promedio sistema financiero)		Coeficiente	1.00	2013	Resultado de las encuestas de base y seguimiento / XPMR	El cálculo del coeficiente se realizará en el marco del informe final de evaluación y del informe de evaluación de impacto.	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
							P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
							A			0.00			
Outcome:	4 Comportamiento cartera de crédito microempresas beneficiarias igualado o mejorado con respecto al promedio del sistema												
Observation:	Calcula la relación entre la tasa de mora de las microempresas beneficiarias que acceden al crédito del sistema financiero que acusan atrasos en los pagos previstos (calculada como préstamos a microempresas beneficiarias con acceso a créditos (con atrasos) / microempresas beneficiarias)												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
4.1 Coeficiente tasa de mora microempresas beneficiarias / tasa de mora microempresas (promedio sistema financiero)		Coeficiente	1.00	2013	Resultado de las encuestas de base y seguimiento / XPMR	El cálculo del coeficiente se realizará en el marco del informe final de evaluación y del informe de evaluación de impacto.	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
							P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
							A			0.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Suministro de servicios de desarrollo empresarial y capacitación (SDEC) a las MiPyMEs elegibles		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
PyMEs asistidas en SDEC	Pymes	P	126.00	358.00	P	1,459,000.00	4,324,000.00
		P(a)	25.00	205.00	P(a)	405,440.00	3,650,628.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Microempresas asistidas en SDEC	Microempresas	P	40.00	112.00	P	587,000.00	1,775,000.00
		P(a)	35.00	290.00	P(a)	173,740.00	2,850,628.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Apoyo para el suministro de SDEC y servicios de apoyo a instituciones de intermediación financiera		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Beneficiarios identificados	Beneficiarios	P	166.00	470.00	P	255,335.00	628,086.00
		P(a)	70.00	540.00	P(a)	57,600.00	213,920.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Registro de Proveedores SDEC diseñado y funcionando	Registro	P	1.00	1.00	P	161,500.00	390,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	160,000.00	360,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Normalización (entrenamiento) proveedores BDS realizado	Talleres	P	2.00	4.00	P	91,000.00	181,390.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	84,860.00	144,092.57
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
IFIs participantes apoyadas (Desarrollo y ajuste productos y procesos para gestión crédito MiPyMEs)	Institución Financiera Intermediación	P	2.00	4.00	P	170,000.00	299,000.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	87,168.00	1,162,596.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimiento capacidad oficiales de crédito del sistema de intermediación financiera	Talleres	P	5.00	9.00	P	106,000.00	189,859.00
		P(a)	1.00	8.00	P(a)	62,638.00	242,261.13
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Apoyo para la ejecución estratégica, técnica y administrativa del Programa							
Gestión y Supervisión							
Imprevistos							

Other Cost		2014	Cost
Gestión del Programa. Auditoría y Evaluaciones	P	\$373,000.00	\$1,389,493.00
	P(a)	\$412,093.00	\$1,053,450.30
	A	\$51,791.24	\$51,791.24
Imprevistos	P	\$196,000.00	\$489,327.00
	P(a)	\$0.00	\$54,334.00
	A	\$0.00	\$0.00
Firma Especializada Internacional	P	\$384,000.00	\$1,333,625.00
	P(a)	\$494,678.00	\$1,268,090.00
	A	\$172,514.00	\$172,514.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$3,782,835.00	\$10,999,780.00
	P(a)	\$1,938,217.00	\$8,746,941.94
	A	\$224,305.24	\$224,305.24

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
