

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1055	Chief of Operations Validation Date	10/12/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/12/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Puerto Cortés Customs Modernization	Loan Number	2467/BL-HO
Executing Agency	SECRETARIA DE FINANZAS	Sector/Subsector	TD - TRADE
Team Leader	LIBBY HERNANDEZ,MARGARITA	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1055	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	0
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

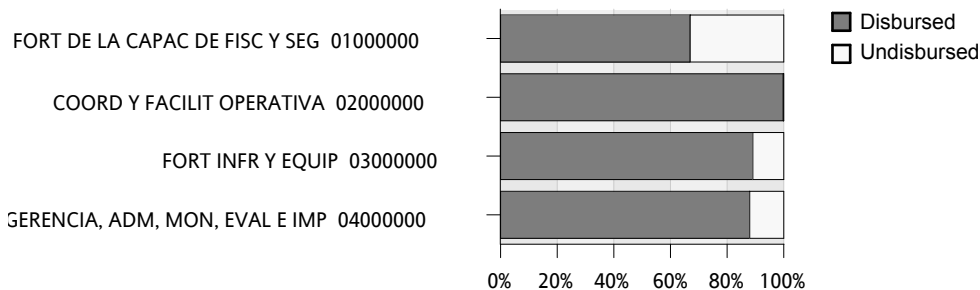

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.1	Declaraciones de importación, exportación y tránsito revisadas con base en análisis de riesgo, bajo reglas probabilísticas y aleatorias	Porcentaje	41.0	2010	P						85.00
					P(a)						85.00
					A						77.00

Details

Means of verification: Información proveniente del Sistema Informático SARAH de la Aduana

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.2	Eficacia en la selección medida por el porcentaje de liquidaciones complementarias efectuadas en el despacho (canal rojo y naranja).	Porcentaje	8.6	2010	P		30.00				60.00
					P(a)		30.00				60.00
					A		13.74				5.00

Details

Means of verification: Información proveniente del Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.3	Recaudación proveniente de pago electrónico.	Porcentaje	12.0	2010	P	25.00	50.00	65.00	90.00		90.00
					P(a)	25.00	50.00	65.00	90.00		90.00
					A	12.00	51.00		91.93		32.08

Details

Means of verification: Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.4	Declaraciones de importación que aplican uso de reglas varias y probabilísticas en la selección mediante el análisis de riesgo	Porcentaje	4.0	2010	P			50.00			95.00
					P(a)			50.00			95.00
					A						100.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Módulo de Análisis de Riesgo_ Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.5	Declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	Porcentaje	89.44	2010	P		75.00					55.00
					P(a)		75.00					55.00
					A		72.00					71.00

Details

Means of verification: Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.6	Cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de una fiscalización	Porcentaje	21.0	2011	P							32.00
					P(a)							32.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Observations: La línea de base se revisará antes del inicio del proyecto

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.7	Incautaciones por ilícitos y contrabando	Incautaciones	70.0	2010	P							140.00
					P(a)							140.00
					A							77.00

Details

Means of verification: Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Observations: La línea de base se revisará antes del inicio del proyecto

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
-------------------	--	----	--	----------------------	--	----	--

Outcome Nbr. 2: Facilitación operativa mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	Declaraciones de importación y exportación tramitadas con certificación electrónica	Porcentaje	0.0	2011	P			60.00				95.00
					P(a)			60.00				95.00
					A							100.00

Details

Means of verification: Sistema informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.2	Tránsitos internacionales tramitados por sistema TIM en Puerto Cortés	Porcentaje	0.0	2011	P		50.00					100.00
					P(a)		50.00					100.00
					A		0.00					100.00

Details

Means of verification: Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.3	Tiempos de despacho de tránsitos internacionales de mercancías en Puerto Cortés mediante el sistema del TIM	Hours (#)	96.0	2011	P		48.00					28.00
					P(a)		48.00					28.00
					A		0.00					26.74

Details

Means of verification: Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.4	Tiempo promedio de despacho de la declaración de importación	Hours (#)	18.8	2010	P			10.00				6.00
					P(a)			10.00				6.00
					A							76.80

Details

Means of verification: Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Nueva infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes en operación

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.1	Adjudicación de las obras del edificio de la Aduana de Puerto Cortés	Adjudicación	0.0	2010	P		1.00					1.00
					P(a)		1.00					1.00
					A		0.00			1.00		1.00

Details

Means of verification: Informe de Adjudicación aceptado por la DEI y el BAnco

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.2	Usuarios externos e internos satisfechos con los servicios de la Aduana de Puerto Cortés	Porcentaje	0.0	2011	P							70.00
					P(a)							70.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Encuesta de satisfacción

Observations: La línea de base se realizará al principio del proyecto cuando se realice la encuesta inicial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.3	Incremento en la disponibilidad de servicios informáticos y telecomunicaciones	Porcentaje	94.16	2010	P							99.50
					P(a)							99.50
					A							100.00

Details

Means of verification: Sistema Informático de la Aduana (SARAH)_ Bitácora de disponibilidad del servicio propia de los sistemas de Data Center

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.4	Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial	Ranking	93.0	2010	P							90.00
					P(a)							90.00
					A					82.00		88.00

Details

Means of verification: Informe The Global Enabling Report publicado anualmente por el Foro Económico Mundial

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización y Seguridad en Puerto Cortes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
1.1	Sistema de información y despacho anticipado implementado	# sistemas implementados	P		1		471,000
			P(a)		1	60,545.87	357,738.87
			A		1	24,514.37	321,707.37
1.2	Oficina de Análisis de Riesgo operativa	# oficinas en funcionamiento	P		1		421,000
			P(a)		1		214,456.17
			A		1		214,456.17
1.3	Estudio de Seguridad en recintos y costas elaborado	# estudios elaborados	P		1		200,000
			P(a)		1		196,391
			A		1		196,390.96
1.4	Equipos no intrusivos de control adquiridos	# equipos en funcionamiento	P		1		1,160,000
			P(a)	1	1	544,932.64	593,459.64
			A	1	1	163,828.78	212,355.78
1.5	Laboratorio de Aduanas en funcionamiento	# laboratorios en funcionamiento	P		1		300,000
			P(a)		1	72,481	743,442.73
			A		1	48,772.67	719,734.4
1.6	Oficina de Fiscalización Operativa	#oficinas en funcionamiento	P		20		90,000
			P(a)		1		592,214
			A		1		580,061

Component Nbr. 2 Coordinación y Facilitación Operativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
2.1	Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en las 17 aduanas a nivel nacional	# sistemas implementados	P		1		200,000
			P(a)		1		222,858.2
			A		17		222,858.2
2.2	Diagnóstico de requerimientos para la implantación del TIM transoceánico elaborado	# Diagnósticos elaborados	P		1		20,000
			P(a)		1		20,000
			A		1		71,300

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
3.1	Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado	# edificaciones remodeladas	P		1		1,887,200
			P(a)		1		2,218,673.37
			A		1		2,898,498.72
3.2	Data Center Instalado	# sistemas data center implementados	P		1		2,246,000
			P(a)	0	1	71,406.8	1,885,757.67
			A	0	1	71,293.64	1,885,644.51
3.3	Aduana de Paso "El Amatillo" Construida en su primera fase	# edificaciones construidas	P		0		0
			P(a)		1	15,690	1,570,787.74
			A		1	15,712.64	1,570,810.38
3.4	Edificios de las Oficinas Tributarias Readequados	# edificaciones construidas	P		0		0
			P(a)	1	1	283,825	283,825
			A	1	1	128,389.85	128,389.85

Other Cost

	Auditorías	P				
		P(a)			30,400	96,684.77
		A			0	66,284.77
	Contingencias e intereses	P				700,000
		P(a)				0
		A				0
	Evaluación	P				80,000
		P(a)			35,000	35,000
		A			0	0
	Gestión del Programa	P				485,000
		P(a)			29,567.28	748,940.91
		A			0	719,373.63

Total Cost

	Total Cost	P				8,628,200
		P(a)			1,143,848.59	9,780,230.07
		A			452,511.95	9,807,865.74

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
