

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1047	Chief of Operations Validation Date	10/05/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support to the Social Protection Program - Third Fase	Loan Number	2623/OC-DR
Executing Agency	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	Sector/Subsector	IS - SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	GONZALEZ ACERO,CAROLINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1047	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	76,823,382.44	96.03%	3,176,617.56
Aggregated	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	76,823,382.44	96.03%	3,176,617.56

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

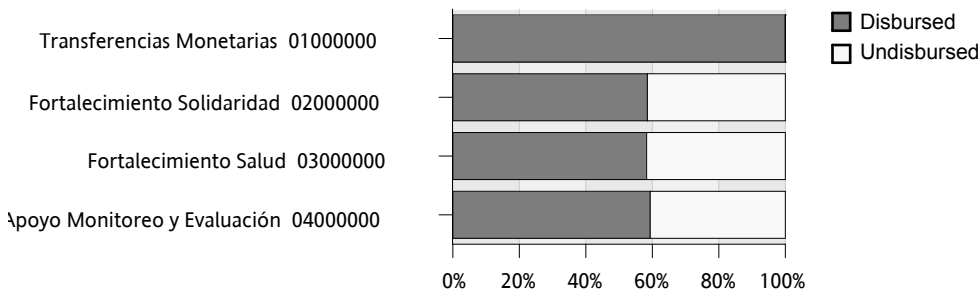

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Niños y niñas beneficiarios de Solidaridad tienen menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Prevalencia de desnutrición crónica de niños(as) de 0-2 años en hogares beneficiarios de Solidaridad	Porcentaje	10.1	2011	P		9.80
					P(a)		9.80
					A		

Details

Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad	Centímetros	101.1	2011	P		102.00
					P(a)		102.00
					A		

Details

Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Niños(as) de entre 18 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunación completa	Porcentaje	28.5	2011	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

Details

Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Niños(as) de entre 14 y 16 años en hogares Solidaridad que terminaron al menos seis grados de educación básica	Porcentaje	73.93	2011	P		76.00
					P(a)		76.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details			
Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Los hogares beneficiarios del programa Solidaridad incrementan su demanda por los servicios de nutrición, salud y educación

Observation: El seguimiento a las condicionalidades ha sido una de las debilidades del programa desde su inicio. El banco ha incluido acciones destinadas a superar esta debilidad en el componente 2 de la segunda fase de este préstamo multifase (desarrollo del sistema

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Porcentaje de mujeres que llevaron al niño al menos a un control en el centro de salud	Porcentaje	56.8	2011	P		69.00
					P(a)		69.00
					A		

Details

Means of verification: EEPS 2012, EEPS2013

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Porcentaje de mujeres que se les recetó y tomaron vitaminas o micronutrientes en las seis semanas siguientes al parto	Porcentaje	44.0	2011	P		55.00
					P(a)		55.00
					A		

Details

Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Porcentaje de mujeres con un hijo de 0 a 5 años que acudieron a un control en las seis semanas siguientes al parto	Porcentaje	44.6	2011	P		55.00
					P(a)		55.00
					A		

Details

Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Porcentaje de mujeres que durante su último embarazo tomaron pastillas de ácido fólico, hierro y vitaminas o suplementos y no pagaron por ellas	Porcentaje	10.8	2011	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: Mejora el seguimiento que hace Solidaridad a los hogares beneficiarios para propiciar el cumplimiento de las condicionalidades

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.1	Proporción de hogares que conocen las corresponsabilidades de Solidaridad	Porcentaje	0.0	2011	P	90.00
					P(a)	90.00
					A	

Details			
Means of verification: EEPS 2012, EEPS 2013			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 3: Mejora la calidad de los servicios de salud a los que acceden los beneficiarios de Solidaridad

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.1	Porcentaje de beneficiarios de Solidaridad que asiste a UNAPs habilitadas	Porcentaje	21.8	2011	P	55.00
					P(a)	55.00
					A	

Details			
Means of verification: Informes Semestrales			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.2	Porcentaje de médicos que proveen servicios de salud siguiendo las guías y protocolos de atención materno-infantil	Porcentaje	8.0	2011	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

Details			
Means of verification: Informes Semestrales			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.3	Porcentaje del personal de salud del primer nivel que conoce al menos un 80% de los contenidos de las guías y protocolos de atención materno-infantil	Porcentaje	13.2	2011	P		60.00
					P(a)		60.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe Semestral							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Transferencias condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Número de personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación.	Beneficiaries (#)	P		755,998.2		47,501,000
			P(a)	0	915,714.6		54,772,515.36
			A		915,714.6		54,772,515.16

Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional de Solidaridad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Estrategia de comunicación dirigida a mejorar el conocimiento de las corresponsabilidades implementada	Estrategia	P		1		30,000
			P(a)	1	1	489,243.34	862,751.83
			A	1	1	136,325.28	509,833.77
2.2	Sistema automatizado de planificación, seguimiento y supervisión efectiva de los enlaces comunitarios implementado	Sistema	P		1		520,000
			P(a)	1	1	74,546.11	184,262.73
			A	0	0		85,207.36

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Personal del nivel gerencial y de coordinación de los Sistemas Regionales de Salud (SRS) capacitado en Sistemas de Gestión	personas	P		240		1,000,000
			P(a)	0	230	0	575,768.99
			A		230		575,768.99
3.2	Personal del primer nivel de atención capacitados en protocolos	personas	P		1,545		473,000
			P(a)	0	1,056	0	392,956.72
			A		1,056		392,956.72
3.3	Centros de atención primaria con déficits en equipamientos médicos cubiertos	centros de atención primaria	P		100		4,000,000
			P(a)	105	105	2,185,624.09	2,885,000
			A		0	328,310	1,027,685.91
3.4	Centros de atención primaria con infraestructura rehabilitada	Centros	P		100		8,791,680
			P(a)	11	100	1,841,967.04	8,523,676.04
			A	11	100	796,131	7,477,840
3.5	Modelo de atención primaria diseñado	Implementacion	P		1		3,438,878
			P(a)	1	1	790,639.03	2,874,876
			A		0	351,901	2,436,137.97
3.6	Banco Nacional de Sangre fortalecido	Banco de sangre	P		1		3,722,125
			P(a)	1	1	4,987,865.73	6,581,004.1
			A		0	193,156	1,786,294.37
3.7	Intervención de prevención del embarazo adolescente implementado	Intervención	P		1		250,000
			P(a)	1	1	226,109.46	504,500
			A		0	3,831	282,221.54
3.8	Personal de atención (Enfermeras) del nivel primario capacitado en sistemas de gestión en salud	Personas	P		1		1,457,220
			P(a)	0	1	0	45,477
			A		1		45,477
3.9	Sistema de Gestion Clinica Ampliado	sistema	P		1		1,006,633
			P(a)	0	0	0	201,837.97
			A	0	0		201,837.97

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Evaluaciones

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
4.1	Evaluación del sistema de gestión clínica realizada	Evaluación	P		1		0
			P(a)	0	1		41,430.86
			A	0	1		41,430.86
4.2	Evaluación del sistema georeferenciado del mapa de oferta de servicios de salud realizada	Evaluación	P		1		50,000
			P(a)	0	0	0	50,000
			A	0	0		50,000
4.3	Evaluación de la capacitación de niveles gerenciales de los Sistemas Regionales de Salud realizada	Evaluación	P		1		30,000
			P(a)	1	1	50,000	100,000
			A		0	4,177.34	54,177.34
4.4	Evaluación de la implementación del diplomado a nivel nacional realizada	Evaluación	P		1		0
			P(a)	1	1	36,135.64	62,318.97
			A		0		26,183.33
4.5	Evaluación del Plan Piloto de intervención de la prevención del embarazo realizada	Evaluación	P		1		0
			P(a)	1	1	35,623.43	35,623.43
			A	0	0		0

Other Cost

	Auditoría Financiera y Gastos Administrativos	P				555,708
		P(a)			31,390.23	653,741.69
		A			22,929.58	645,281.04
	Auditoría recurrente	P				200,000
		P(a)				209,865.21
		A				209,865.21
	Consultorías y adquisiciones varias	P				0
		P(a)				442,393.1
		A				442,393.1

Total Cost

	Total Cost	P				80,000,000
		P(a)			10,749,144.1	80,000,000
		A			1,836,761.2	71,063,107.64

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
