

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1113	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Land Regularization and Titling Program	Loan Number	3722/BL-BO
Executing Agency	Instituto Nacional de Reforma Agraria	Sector/Subsector	AG-ADM - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
Team Leader	LIMA,EIRIVELTHON SANTOS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	6,086,145	10.14%	53,913,855
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	6,086,145	10.14%	53,913,855

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

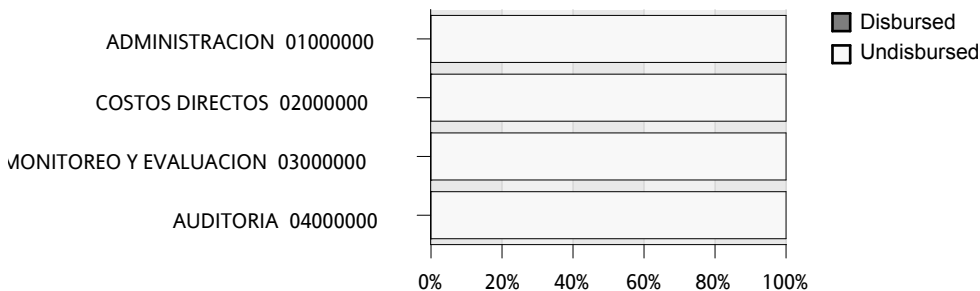

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	US\$/año	801.0	2008	P	974.00	974.00
					P(a)	974.00	974.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 1: 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870.0	2008	P	1,075.00	1,075.00
					P(a)	1,075.00	1,075.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Aumento de la inversión Productiva

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215.0	2008	P	241.00	241.00
					P(a)	241.00	241.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

Observation: Medio de Verificación: Sistema de Monitoreo y Seguimiento del INRA

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P	7.00	7.00
					P(a)	7.00	7.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

Observation: Medio de Verificación: Sistema monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.7	2016	P	25.00	25.00
					P(a)	25.00	25.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

Observation: Medio de verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.0	2016	P	3.00	3.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.0	2016	P(a)	3.00	3.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 4: 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DDRR

Observation: Medio de Verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
4.0	Oficinas del INRA y DDRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	0.0	2016	P	100.00	100.00
					P(a)	100.00	100.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	70,000	1,300,000	10,000,000	74,938,787
			P(a)	70,000	1,300,000	10,000,000	74,938,787
			A	0	0	0	0
1.2	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P	90	900	10,000	70,000
			P(a)	90	900	10,000	70,000
			A	0	0	0	0
1.3	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P		1		150,000
			P(a)		1		150,000
			A		0		0
1.4	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P		160		150,000
			P(a)		160		150,000
			A		0		0
1.5	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P		1		50,000
			P(a)		1		50,000
			A		0		0
1.6	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P		1		21,600
			P(a)		1		21,600
			A		0		0
1.7	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P		900		86,400
			P(a)		900		86,400
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P		1	50,000	693,054
			P(a)		1	50,000	693,054
			A		0	0	0
2.2	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P		9		131,748
			P(a)		9		131,748
			A		0		0
2.3	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P		1		800,000
			P(a)		1		800,000
			A		0		0
2.4	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P		1		3,852,604
			P(a)		1		3,852,604
			A		0		0
2.5	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P		1		15,826
			P(a)		1		15,826
			A		0		0
2.6	Campañas de mantenimiento catastral.	Campañas	P	1	5	80,000	600,000
			P(a)	1	5	80,000	600,000
			A	0	0	0	0
2.7	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P		5,000		1,900,000
			P(a)		5,000		1,900,000
			A		0		0
2.8	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P		3		6,044,172
			P(a)		3		6,044,172
			A		0		0
2.9	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P		1		2,376,514
			P(a)		1		2,376,514
			A		0		0

Other Cost

Administración	P			2,000,000	7,239,295
	P(a)			2,000,000	7,239,295
	A			0	0
Auditoría	P				300,000
	P(a)				300,000
	A				0
Monitoreo y evaluación	P				580,000
	P(a)				580,000
	A				0

Total Cost

Total Cost	P			12,140,000	100,000,000
	P(a)			12,140,000	100,000,000
	A			0	0

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Nodo geobolivia implementado.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Nodo geobolivia implementado.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Plan de gestión ambiental y social implementado	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial	07/14/2017	10/09/2017
Output	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Campañas de mantenimiento catastral.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Outcome	Oficinas del INRA y DRRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	Modify Outcome Indicator	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de derechos reales	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Outcome	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Modify Outcome Indicator	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de derechos reales	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Manual de transparencia actualizado.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/14/2017	10/09/2017
Output	Plan de gestión ambiental y social implementado	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Campañas de mantenimiento catastral.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Titulos de propiedad rural registrados en las oficinas de derechos reales	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Outcome	Oficinas del INRA y DRRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	Modify Outcome Indicator	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Outcome	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	Modify Outcome Indicator	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Plan de gestión ambiental y social implementado	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Outcome	Oficinas del INRA y DRRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	Modify Outcome Indicator	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Plan de gestión ambiental y social implementado	Create Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/14/2017	10/09/2017
Output	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/14/2017	10/09/2017
Output	Digitalización e indexación de carpetas.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Titulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/13/2017	10/09/2017
Output	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Digitalización e indexación de carpetas.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/14/2017	10/09/2017
Output	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Manual de transparencia actualizado.	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
Output	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Modify Output	Se actualizo la matriz de resultados, en base a la planificación inicial.	07/12/2017	10/09/2017
