

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1135	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/09/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/06/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Agricultural Public Management II	<b>Loan Number</b>	3800/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA	<b>Sector/Subsector</b>	AG-SAN - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
<b>Team Leader</b>	HINTZE,LUIS HERNANDO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	URUGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1135	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	719,003.11	9.46%	6,880,996.89
Aggregated	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	719,003.11	9.46%	6,880,996.89

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

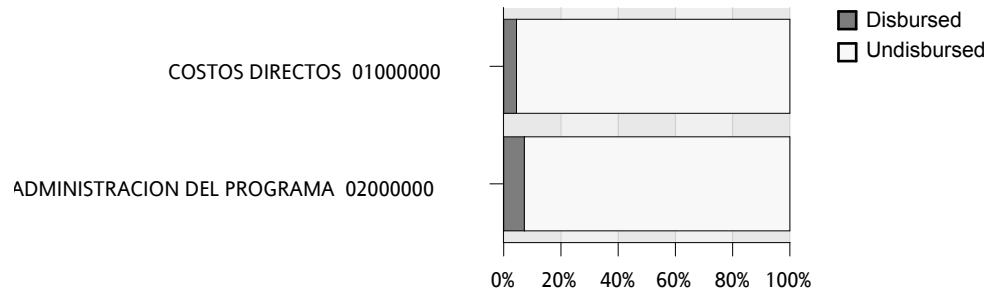

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay

**Observation:** Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Valor de las exportaciones	Miles de U\$S	4060.0	2015	P		4,400.00
					P(a)		4,400.00
					A		
Details							
Means of verification: Uruguay XXI							
Observations: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Impact Nbr. 1:** Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias

**Observation:** Suma de mercados de carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de Uruguay	Número de Mercados	302.0	2015	P		312.00
					P(a)		312.00
					A		
Details							
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI							
Observations: Suma de mercados de carne, lácteos y granos							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos

**Observation:** Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.0	Costo de trámites por tonelada - Carne	U\$S	5.55	2015	P	2.78
					P(a)	2.78
					A	

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.1	Costo de trámites por tonelada - Lácteos	U\$S	2.15	2015	P	1.07
					P(a)	1.07
					A	

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

**Observation:** El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
1.0	Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)	Rubros	1.0	2015	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI

**Observations:** El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
2.0	Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)	Número de notificaciones	6.0	2013	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	
Details						
Means of verification: Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)						
Observations: Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Mejora en la eficiencia del laboratorio

Observation: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.0	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos	Días	7.0	2015	P	3.00
					P(a)	3.00
					A	
Details						
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)						
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.1	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas	Días	10.0	2015	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	
Details						
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)						
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de los servicios provistos por el MGAP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
1.1	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Cantidad de Notificaciones electrónicas realizadas por año	P	0	32,400	59,813	236,327
			P(a)	0	32,400	59,813	236,327
			A	0	0	27,132.27	27,132.27
1.2	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Domicilios electrónicos constituidos en la BDDE	P	0	10,000	49,075	178,305
			P(a)	0	10,000	49,075	178,305
			A	0	0	19,076.31	19,076.31
1.3	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	% de expedientes gestionados por medios electrónicos	P	0	100	136,191	538,379
			P(a)	0	100	136,191	538,379
			A	0	0	85,014.93	85,014.93
1.4	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Oficinas clave	P	0	9	32,778	359,168
			P(a)	0	9	32,778	359,168
			A	0	0	9,663.36	9,663.36
1.5	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	% de trámites con gestión total vía web incorporados durante el Programa	P	23	83	142,420	935,309
			P(a)	23	83	142,420	935,309
			A	0	0	81,181.98	81,181.98
1.6	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Oficina construida y operando	P	0	1	57,522	710,471
			P(a)	0	1	57,522	710,471
			A	0	0	31,280.39	31,280.39
1.7	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Centros Administrativos	P	0	4	122,822	348,033
			P(a)	0	4	122,822	348,033
			A	0	0	75,247.92	75,247.92
1.8	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Funcionarios Capacitados por el Programa	P	5	25	41,771	320,535
			P(a)	5	25	41,771	320,535
			A	0	0	6,406.9	6,406.9

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
2.1	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	% de avance en desarrollo e implementación	P	20	100	202,281	925,743
			P(a)	20	100	202,281	925,743
			A	0	0	50,565.57	50,565.57
2.2	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Laboratorios integrados al SIGLA	P	0	10	196,005	899,030
			P(a)	0	10	196,005	899,030
			A	0	0	46,067.49	46,067.49
2.3	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Grado de avance de obra y equipamiento	P	0	100	108,005	724,030
			P(a)	0	100	108,005	724,030
			A	0	0	46,067.49	46,067.49
2.4	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	No. de sustancias	P	3	23	61,005	119,030
			P(a)	3	23	61,005	119,030
			A	3	3	46,067.49	46,067.49
2.5	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Protocolos aprobados	P	2	8	6,277	76,713
			P(a)	2	8	6,277	76,713
			A	0	0	4,498.08	4,498.08
2.6	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Reportes del observatorio	P	50	1,200	8,677	273,713
			P(a)	50	1,200	8,677	273,713
			A	0	0	4,498.08	4,498.08
2.7	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Reportes del observatorio	P	3	24	16,277	226,713
			P(a)	3	24	16,277	226,713
			A	0	0	4,498.08	4,498.08
2.8	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Barreras Sanitarias con sistema inteligente	P	0	3	6,277	598,758
			P(a)	0	3	6,277	598,758
			A	0	0	4,498.08	4,498.08

## Other Cost

	Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías)	P			101,187	529,743
		P(a)			101,187	529,743
		A			55,637	55,637

## Total Cost

	Total Cost	P			1,348,383	8,000,000
		P(a)			1,348,383	8,000,000
		A			597,401.42	597,401.42

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
